

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.1 (KD1) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 26.5. 2017 (pátek) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Karel Bozděch, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.  
Jakub Rudolský, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.  
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo:2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

## I. Kontrola úkolů z předání staveniště:

1. Vytýčení současných stávajících inženýrských sítí a rozvodů: zajištěno zhotovitelem
2. Převzetí objektu garáže od pronajímatele: zajištěno zhotovitelem
3. Předání prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby – zasláno objednateli dne 10.4. 2017, následně 11.4. 2017 doložil objednatel stavebnímu úřadu.
4. Aktualizovaný harmonogram prací byl poskytnut ke dni 13.4. 2017.
5. Informace o zahájení prací: vyvěšeno v okolí stavby zhotovitelem. Objednatel informoval sousední vlastníky (společnost Ing. Truong Dinh Hung, "LS", spol. s r.o., PRIMA DELIKA s.r.o.) a Společenství pro dům Krušnohorská 866.

## II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Práce byly zahájeny ke dni 22.5. 2017.
2. K dnešnímu dni bylo zařízeno staveniště, lávka pro pěší, uzavření pracovní plochy včetně násypu a provádělo se odstranění asfaltového povrchu na lávce A viz fotodokumentace.
3. V úterý 23.5. 2017 proběhl kontrolní den ze strany BOZP p. Štěpánka, z jehož byla vytvořena zpráva viz příloha.

## III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Na vrchní nátěr zábradlí a nosníků bude použita zn. Sika, výběr barvy určí objednatel po dohodě se správcem Odborem technickým.
2. Změna DIO oproti PD, které uvažovalo se zavěšeným lešením, čímž mělo dojít ke snížení podjezdů výšky v ulici Sedlecká. Z důvodu bezpečnosti nové DIO předpokládá uzavření vždy jednoho jízdního pruhu z důvodu postavení lešení (po jednotlivých jízdních pružích). Zahájení dopravního omezení předpoklad od 29.5. 2017. DIO bude poskytnuto objednateli. Objednatel upozorňuje, že musí být zachován vjezd a příjezd k provozovně u lávky z ulice Sedlecká (vlastníci PRIMA DELIKA S.R.O. "LS", spol. s r.o. Ing. Truong Dinh Hung).
3. Zhotovitel požaduje po projektantovi zpracování detailu mostního závěru (lávka A u obchodního centra). Objednatel upozorňuje, že je nutné nezasahovat do sousedního pozemku.
4. Objednatel projedná se SLP p.o. kácení křovin podél objektu garáže v šířce 1 m.
5. Zhotovitel upozorňuje, že je potřeba po odkrytí konstrukcí vyhodnotit AD technický stav nosníků. V případě, že by došlo k rozhodnutí o výměně některého nosníku bude potřeba lávku uzavřít i pro pěší. Před jakoukoliv změnou oproti projektu je toto nutné nejprve projednat s AD a TDI a případné změny nejprve ocenit (změnový list) a projednat s objednatel.

IV. Příští kontrolní den se bude konat ve středu 7.6. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby s tím, že je možnost v případě potřeby svolat zhotovitelem po telefonické dohodě i dříve. Dále bylo dohodnuto, že KD by se měly konat pravidelně každou středu od 14,00 hodin na místě stavby (od 7.6. 2017).

Zapsala dne 30.5. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary



Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace z 26.5.2017
- Zpráva BOZP

**Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi**  
**„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“**

KD č. 1

**Projekt:** „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

**Datum:** 23. 5. 2016



**Místo konání:** Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

**Přítomní:** GD - ing. Bozděch,  
koordinátor BOZP – Štěpánek  
Nikdo nebyl předem informován.

**Termín dalšího KD:** Předpokládaný termín středa 31. 5. 2017 ve 14:00 hod.

*Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.*

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
<b>Realizace</b>			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrty / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: <b>Základní předměty prováděných kontrol</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad.</li><li>2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad.</li><li>3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad.</li><li>4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad.</li><li>5. Kontrola prací – bez závad.</li><li>6. Kontrola používání el. strojů a nářadí – bez závad.</li><li>7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad.</li><li>8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad.</li><li>9. Osvětlení na pracovišti – bez závad.</li></ol>	VŠICHNI	Trvá


1-2	<p>10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad.</p> <p>11. Kontrola strojů a náradí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad.</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
1-3	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.		
Obr.1	 <p>Zahájení montáže koridoru pro pěší a oplocení staveniště.</p>		
Obr.2	 <p>Připravená opatření – výstrahy, zábory a oplocení.</p>		

Obr.3



Zařízení staveniště a úprava schodiště – nájezd na stavbu.

Obr.4

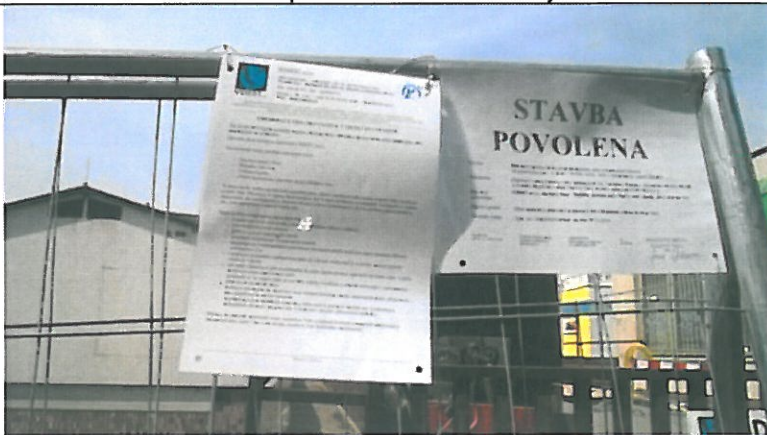

Vyvěšení „Stavba povolena“ a „Informace o stavbě obyvatelům“

Obr.5



Tabule připravená k osazení na staveništi.

**Nové body**

**Přílohy:** Nejsou  
**Zapsal:** Martin Štěpánek, koordinátor BOZP



