

ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (KD6) ve věci stavby označené jako: „**Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech**“, který se konal dne 12.07. 2017 (středa) od 14:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: Michal Štourač, zástupce zhotovitele VIDEST spol. s r.o.
Ing. Jakub Rudolský, zástupce projektanta PONTIKA s.r.o.
M. Drobilová, odbor rozvoje a investic MMKV

Smlouva o dílo: 2017-00010/ORI ze dne 6.4.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., sídlo Karlovy Vary, IČO: 27995771

I. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů:

1. Zhotovitel předložil změnové listy týkající se:

ZL1 – Úprava lávky B (Měněpráce - Po provedených sondách bude odstraněn pouze asfaltový povrch a provedena nová izolace, dojde k vyspárování betonu, izolaci a pokládce betonu a asfaltu).

ZL2 – Dočišťování konstrukcí (Vícepráce – s ohledem na silnou korozi potřeba mechanického odstranění rzi před vlastním pískováním).

ZL3 – Změna zábradlí (Měněpráce – zjednodušení tvaru zábradlí, s ohledem na barevnost změna madla z nerezového na ocelové).

ZL4 – Změna lešení (Vícepráce – Změna lešení ze zavěšeného na stojící)

ZL5 – Změna typu asfaltů (Měněpráce – změna typu asfaltů z litého na ABS a neprovedení části povrchu před lávkou B, již provedena nová zámková betonová dlažba oproti PD)

ZL6 – Výměna příčných nosníků (Výměna příčných nosníků s ohledem na havarijní technický stav)

2. Projektant zpracoval detail úpravy závěsné zídky a mostního závěru lávky B včetně výkazu výměr. (T: 10.7.2017) SPLNĚNO

3. Projektant zpracoval detail úpravy závěsné zídky a mostního závěru lávky A včetně výkazu výměr. (T: 10.7.2017) SPLNĚNO

4. Předána nabídka na nátěr zábradlí kolem DPS (T: 28.6. 2017) SPLNĚNO

5. Oproti projektu projektant prověří provedení nových výztuh hlavního nosníku, s ohledem na to, že po odhalení jsou zde stávající. (T: 19.7. 2017) TRVÁ

II. Informace o stávajícím postupu stavby:

1. Odstranění stávajících svrchních vrstev na lávce A1.

2. Pískování na lávce A1.

3. Pískování hlavního nosníku na lávce B.

4. Uzavření lávky pro pěší.

5. Výměna příčných nosníků (6 ks).

6. Nátěry na lávce A1 (hlavní a příčné nosníky).

7. Osazení trapézových plechů na lávce A1.

III. Z průběhu kontroly a jednání:

1. Byly schváleny změnové listy 1, 2, 3, 5 a 6.

2. Změnový list č. 4 bude dále řešen. Objednatel požádal projektanta o vyjádření ke změně typu lešení oproti projektové dokumentaci.

Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech

Zápis z kontrolního dne č.6

3. Zhotovitel předá objednateli vyčíslení změny mostních závěrů na základě zpracované dokumentace a výkazu výměr viz výše čl.I bod 2 a 3.
4. Oproti projektové dokumentace byly na základě požadavku OZ Teplárny změněny objímky pro teplovodní vedení (zápis ve SD).
5. Oproti projektu projektant prověří provedení nových výztuh hlavního nosníku, s ohledem na to, že po odhalení jsou zde stávající.
6. Dne 29.6. 2017 byl proveden kontrolní den ze strany koordinátora BOZP. Zápis z provedené kontroly je přílohou tohoto zápisu.
7. Byl zkontrolován stavební deník. Práce pokračují dle plánu. Na staveništi se pracuje pravidelně. Práce s ohledem na dešť byly přerušeny dne 29.6. po 12 hodině a dne 11.7. byly přerušeny od 9. do 11,00 hodin.

IV. Příští kontrolní den

se bude konat ve středu 19.7. 2017 od 14,00 hodin na místě stavby.

Zapsala dne 14.7. 2017:

Monika Drobilová

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Přílohy:

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP dne 29.6. 2017.

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. D. Riedl (vedoucí ORI), Č. Bruštík (náměstek SMKV)
- Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
- vlastní

Použité zkratky:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)


PD projektová dokumentace

Přílohy:

- fotodokumentace z 12.07. 2017





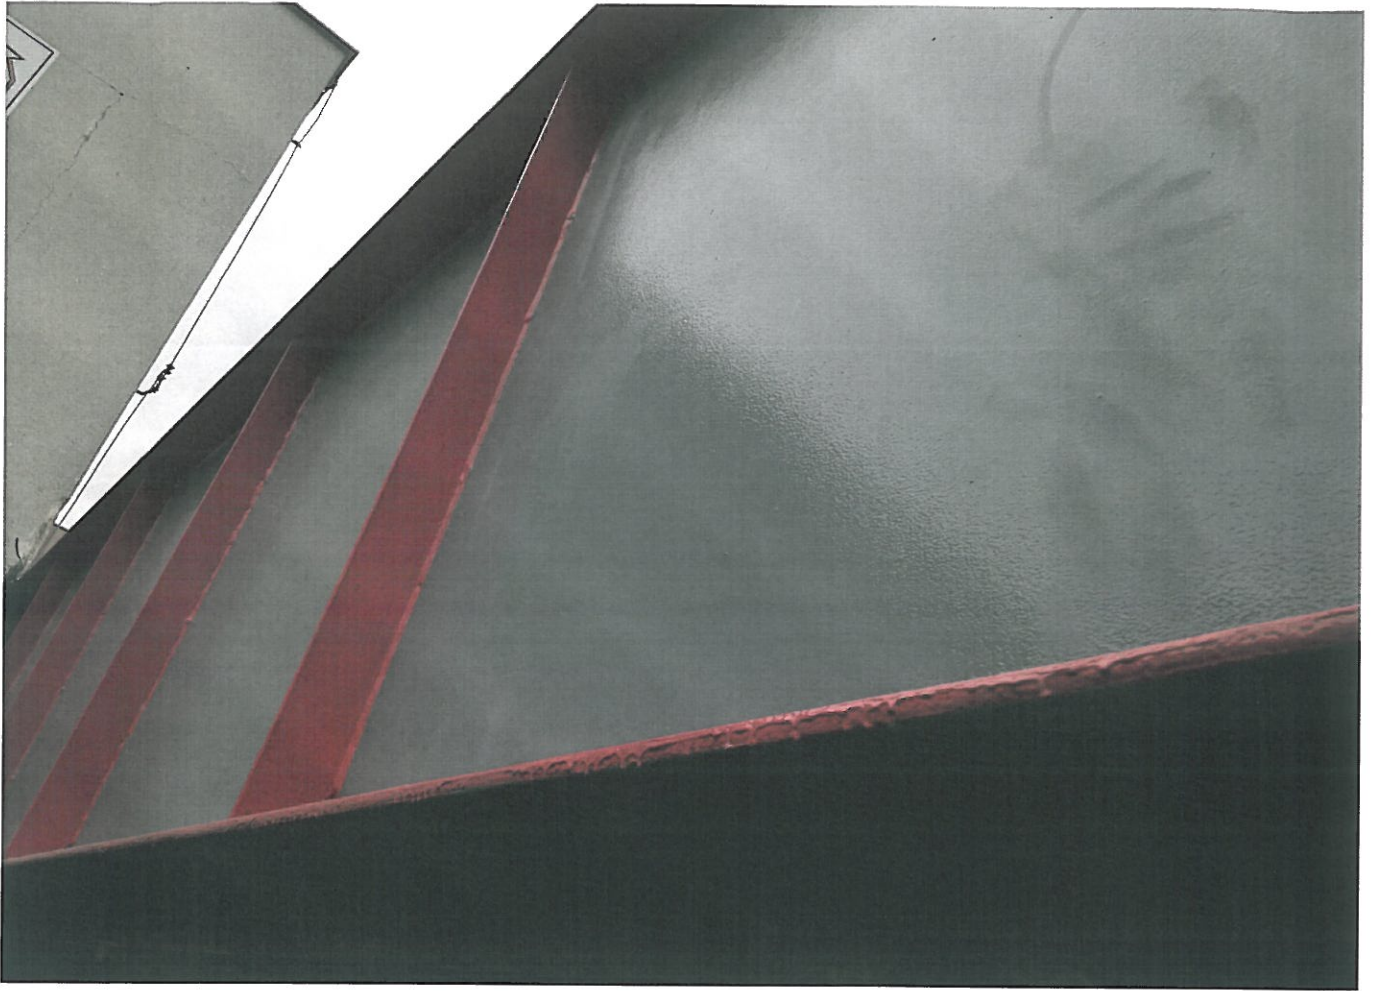

Zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP na staveništi
„Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

KD č. 5

Projekt: „Stavební úpravy lávky přes Sedleckou ulici v Karlových Varech“

Datum: 29.6. 2016


Místo konání: Staveniště – lávka přes Sedleckou ulici v Karlových Varech.

Přítomní:

Termín dalšího KD BOZP: 12.7.2017 ve 14:00 hod

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-1	Zhotovitel předložil seznam subdodavatelů: výměna vodovodní přípojky - VAK Karlovy Vary vrty / injektáž - ABA STAKO V případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi je povinen zhotovitel zajistit proškolení z BOZP a seznámit s riziky všechny zúčastněné před zahájením prací a to písemnou formou.	zhotovitel	Trvá
1-2	Koordinátor BOZP předkládá: Základní předměty prováděných kontrol <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola zajištění provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou – bez závad. 2. Vybavenost prvky ochrany zdraví zaměstnanců, kontrola používání OOPP – bez závad. 3. Stav komunikací (schody, chodníky) označení a osvětlení přístupových cest – bez závad. 4. Průchodnost přístupových a únikových cest – bez závad. 5. Kontrola prací – bez závad. 6. Kontrola používání el. strojů a náradí – bez závad. 7. Zabezpečení obvodu staveniště – kontrola stavu oplocení, vstupu osob a návštěv – bez závad. 8. Kontrola stavu zábradlí – bez závad. 9. Osvětlení na pracovišti – bez závad. 10. Kontrola stavu prostředků první pomoci – bez závad. 	VŠICHNI	Trvá


1-2	<p>11. Kontrola strojů a nářadí – bez závad.</p> <p>12. Kontrola stavu úklidu na staveništi – bez závad.</p> <p>13. Kontrola dodržování plánu BOZP – bez závad.</p> <p>14. Systém bezpečné práce jeřábu, vázaní břemen – bez závad.</p> <p>15. Kontrola likvidace odpadu – bez závad.</p> <p>16. Kontrola evidence osob na staveništi – bez závad.</p> <p>17. Kontrola zvláštní odborné způsobilosti lešenáři, vazači a ostatní... – bez závad.</p> <p>18. Kontrola lešení – bez závad</p> <p>19. Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů – bez závad.</p> <p>20. Kontrola dokumentace BOZP a školení pracovníků – zhotovitel na výzvu předloží.</p> <p>21. Kontrola odstranění závad z minulých kontrol – nejsou.</p> <p>22. Zajištění koordinace a součinnosti s koordinátorem BOZP – bez závad.</p>	VŠICHNI	Trvá
Nové body			
5-1	K dnešnímu dni nebyl zhotovitelem hlášen žádný pracovní úraz.		
Obr.5-1a 2	 <p>Opatření DIO bez závad.</p>		

Obr.5-3, 4
a 5



Zajištění staveniště bez závad.

Obr.5-6



Návrh náhradní trasy pro pěší po dobu uzavření lávky.

Zapsal: Martin Štěpánek, koordinátor BOZP
