

Zápis z kontrolního dne stavby Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli
č.10

Projekt: " _Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli "


Datum: 8. 10. 2015



Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli.

Přítomní viz prezenční listina.


Termín příštího KD: 15. 10. 2015 v 8:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námitky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod č.	Text	Zodpovídá	Termín
1	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.	Koordinátor BOZP	Průběžně
2	BOZP – zhotovitel zajišťuje vzájemnou informovanost se subdodavateli o rizicích na staveništi.	Videst	Průběžně
3	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.	TDI	Průběžně
4-3	Zhotovitel informuje občany o následujících dopravních omezeních.	Videst	Průběžně
6-1	<p>Je dřívější požadavek občanů z bloku domů 767 – 772 v ul. Fibichova, zachovat pěšinu – tj. vybudovat chodník od severního konce tlumící stěny v ul. Frimlova k domu čp. 772 v ul. Fibichova a tam se napojit na sávající chodník. Vzhledem ke stavebním aktivitám v této lokalitě: „Zrušení příkopu, vyrovnání terénu“ a „Obnovení pěšiny“ se přítomní dohodli tímto zabývat a projektantka navrhne řešení. Přítomní si znovu prošli a upřesnili trasu a napojení na stávající chodník.</p> 	TDI, projektant a Videst	Trvá

6-2	„Zrušení dlažby a sušáků“ za blokem domů 767 – 772 v ul. FibichovaTDI navrhuje zvažít ponechání sušáků (konzultace s občany).	TDI, projektant a Videst	Trvá
6-3	<p>TDI upozorňuje, že část jižního chodníku v křižovatce Fibichova X Závodu Míru je proveden sousední stavbou.</p> 	TDI, projektant a Videst	Trvá
7-3	 <p>Byl dohodnutý způsob ošetření dilatačních spár betonového podloží tak, aby se spáry neprokreslily do nové živičné vrstvy (to představuje drahé vícepráce). Dodavatel živice navrhnul spáry nebandážovat a v případě že se projeví na novém povrchu, tak ten proříznout a ošetřit pružnou zálivkou.</p>	Videst, projektant, TDI	Trvá
9-1, 7-3	<p>Zhotovitel svolá koordináční schůzku s dodavatelem živičných povrchů, na které se dohodnou podmínky stavební připravenosti pro pokládku živice a postupové termíny. Dne 6. 10. 2015 se konala pochůzka na stavbě, při které byly dohodnuty detaily stavební připravenosti pro pokládku živice a postup prací po jednotlivých etapách stavby.</p>	Videst	
Nové body:			
10-1	Do dnešního KD vstoupila paní z domu č. p. 770 ul. Fibichova s připomínkou – nesouhlasem s novým umístěním kontejnerového stání před č. p. 770.		

10-1

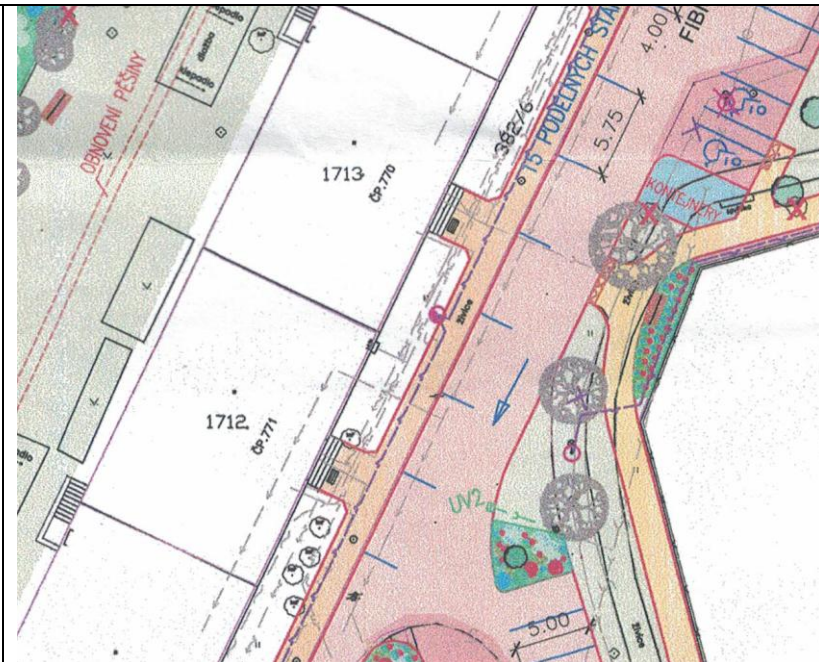

Příloha: Prezenční listina.
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI a BOZP



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

Prezenční listina z kontrolního dne stavby
Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul.
Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli

č.10

Datum: 8. 10. 2015

Místo konání: Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova

Přítomní:

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Bozděch Karel	VIDEST s.r.o.	603 158 887	bozdech@videst.cz	
Golkovský Tomáš	VIDEST s.r.o.	731 650 022	tomas.golkovsky@videst.cz	
Havlíková Olga	Projektant	777 282 002	havlikova.o@seznam.cz	
Sakařová Jitka	MM-ORI	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Štěpánek Martin	MM-ORI	737 058 047	stepmar@seznam.cz	
Urbášek Jiří	VIDEST s.r.o.	731 441 893	Jiurbek2@seznam.cz	
