

ZÁPIS

z jednání na stavbě, které se konalo dne 22. listopadu 2016

Stavba: „Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“

Smlouva o dílo: 2016 – 00053/ORI ze dne 14. října 2016

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, se sídlem: Moskevská 21, 360 20 Karlovy Vary

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., se sídlem: Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 294 14 075

Přítomni: Ing. Jiří Sára, za zhotovitele
Petr Kugler, za hotovitele
Ing. Jan Procházka, za projektanta
Ing. František Kocourek, za objednatele

Z průběhu jednání:

1. Přítomní projednali způsob provádění pokládky hydroizolace na mostovce lávky v návaznosti na e-mailovou korespondenci ze dne 21.11.2016.
2. Zhotovitel opraví zjištěné vady hydroizolace a jejího podkladu před prováděním dalších vrstev (napojení na římsy, ve spojích jednotlivých pásů, hrubé nerovnosti v ploše, izolaci detailů).
3. Projektant předal zhotoviteli a objednateli výkres označený jako: DETAIL UKONČENÍ IZOLACE – VAR.B; velikost výkresu 1A4.

Přílohy:


e-mailová korespondence z 20. 11.2016 a 21.11.2016
výkres: DETAIL UKONČENÍ IZOLACE – VAR.B

Zapsal: Ing. František Kocourek

Se zápisem souhlasí:



Za zhotovitele



Za projektanta



Za objednatele

Kocourek František

Od: Ing. Jiří Sára, BAUING KV s.r.o. [sara@bauing.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2016 15:20
Komu: Kocourek František
Kopie: 'Jan Procházka'; navratilova@pontika.cz; 'Martin Štěpánek'; Riedl Daniel
Předmět: RE: hydroizolace mostovky - poznámky

Dobrý den, děkuji za vaše poznatky. Na stavbě jsem byl také i včera i dnes a kvalita provádění je dle mého názoru výborná. Samozřejmě se mohou vyskytnout nějaké chyby, které bychom opravili před zásypem. Dokončená hydroizolace by měla být zítra. Navrhuji tedy sejít se na lávce ve středu (termín nechám na Vás). Doprava pískového lože na mostovku bude probíhat ve čtvrtek (cca 10m³).
Děkuji

Ing. Jiří Sára
jednatel společnosti



BAUING KV s.r.o.

se sídlem:

Plaská 622/3, 150 00 Praha

kontaktní adresa:

Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary

tel: 353 22 96 36

cell: 602 340 235

www.bauing.cz

From: Kocourek František [<mailto:f.kocourek@mmkv.cz>]
Sent: Monday, November 21, 2016 3:12 PM
To: 'Ing. Jiří Sára, BAUING KV s.r.o.'
Cc: 'Jan Procházka'; navratilova@pontika.cz; 'Martin Štěpánek'; Riedl Daniel
Subject: FW: hydroizolace mostovky - poznámky

Dobrý den,

pane inženýre, děkuji za zprávu a za aktivitu vaší společnosti na lávce. Dnes odpoledne jsem prohlédl probíhající pokládku živičných pásů na povrchu mostovky, uvádím následující poznámky:

- svislé části izolační „vany“ nebyly důkladně připraveny na přitavení asfaltových pásů, zjistil jsem následující vady:
 - ❖ ze svislých částí nebyly zcela odstraněny měkké vrstvy, podklad se místně drolí, na tento podklad přiléhají asfaltové pásy - hydroizolační těsnost není zaručena
 - ❖ penetrační nátěr je na svislých stěnách zakončen nízko, okraje asfaltových pásů byly taveny k podkladu, který není penetrován - hydroizolační těsnost není zaručena
- některé části spojů asfaltových pásů nemají vyteklý asfalt - hydroizolační těsnost není zaručena
- řešení hydroizolace u chrličů je problematické
- z velikosti prohlubní na nově položených pásech lze usuzovat, že podklad pro natavení pásů nebyl dostatečně vyrovnán.

Dovoluji si požádat o odstranění zjištěných vad a svolání kontroly stavby za účasti Vaší, AD a TDS po dokončení pokládky asfaltových pásů, tzn. před prováděním dalších konstrukčních vrstev.

Zpráva pro projektanta:

Dovoluji si požádat o zpracování detailu bezpečného ukončení hydroizolace na svislých částech izolační vany a jeho oficiální předání zhotoviteli, případně o společné projednání (zhotovitel, AD, TDS) technického řešení na stavbě s následným zápisem.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

Ing. František Kocourek

odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

tel.: 35 3118 238, mobil: 72 55 333 25, email: f.kocourek@mmkv.cz

From: Ing. Jiří Sára, BAUING KV s.r.o. [<mailto:sara@bauing.cz>]

Sent: Sunday, November 20, 2016 3:10 PM

To: Kocourek František; navratilova@pontika.cz; 'Jan Procházka'; 'Martin Štěpánek'

Subject: zahájení prací na sanaci mostovky 21.11.2016

Dobrý den, využíváme plně hezkého počasí a v tomto týdnu jsme provedli penetraci podkladu. Dnes jsme zahájili provádění izolací na mostě, zítra by měla být izolace dokončena.

Díky relativně příznivé předpovědi jsem se rozhodl o zahájení sanací mostovky zítra (pondělí 21.11.).

V 7:00 budou uzavřeny pomalejší pruhy, navezen sypký materiál (16m³ jako zábrana) a začne stavba lešení. Uzavírka je nahlášena na KÚKK stejně tak i na centrálním registru dopravy.

Práce na samotné sanaci začnou zítra kolem 9:00. V rámci první etapy bychom rádi provedli i práce na úseku mimo komunikaci (nad schodištěm do Bohatic).

Děkuji a přeji pěkný den

Ing. Jiří Sára

jednatel společnosti



BAUING KV s.r.o.

se sídlem:

Plaská 622/3, 150 00 Praha

kontaktní adresa:


Jáchymovská 349/80, 360 04 Karlovy Vary


tel: 353 22 96 36

cell: 602 340 235

www.bauing.cz

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:2

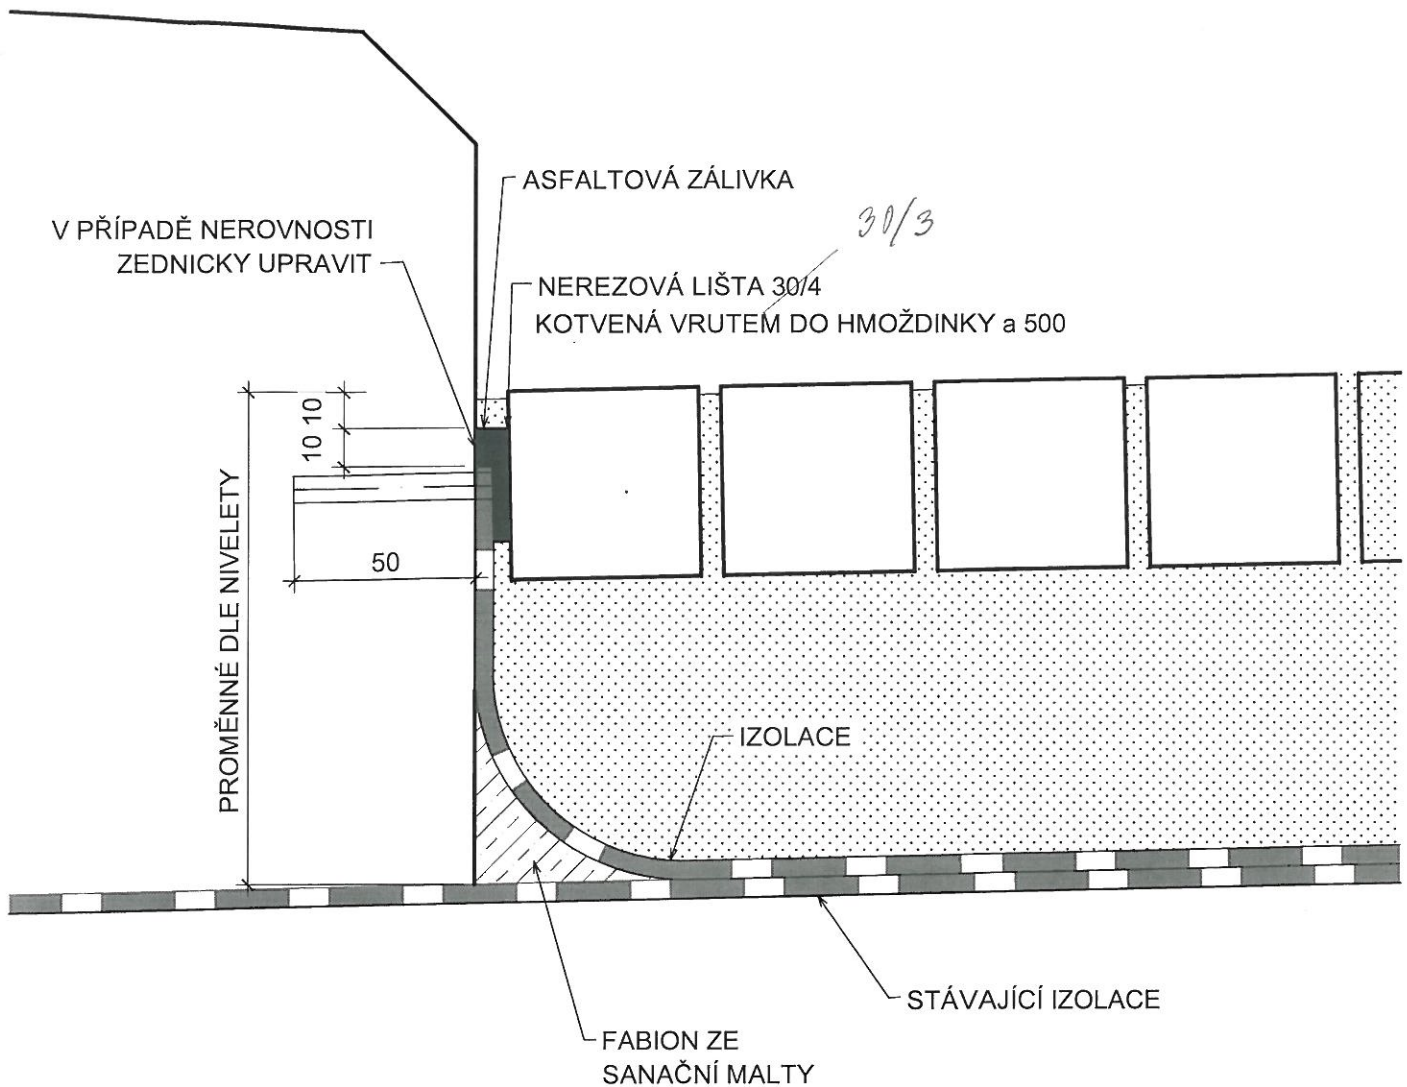

Vypracoval: ING.MILENA NAVRÁTILOVÁ podpis:	Zdp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	HIP: podpis:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
Obec: KARLOVY VARY	Kraj: KARLOVARSKÝ			Č. zakázky: 2016-65
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				Datum: 11/2016
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY				Formát: A4
Zakázka: LÁVKA U DRAHOVICKÉHO MOSTU ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU				Měřítko:
Název přílohy: DETAIL UKONČENÍ IZOLACE-VAR.B				Stupeň PD: RDS
				Číslo přílohy: Souprava:
				1
