

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV.III/22129, Bor-chodník podél průtahu silnice

- pohyblivé pracovní místo v III/22129
- překopy III/22129 po polovinách

Realizace: VIDEŠT s.r.o.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že

1. pohyblivé pracovní místo na III/22129 bude prováděno s tím, že pro průjezd vozidel zbyde minimálně 2,75 metru a po celé délce bude zabezpečeno pomocí směrových desek Z4 a zábranami Z2 (vjezdy do objektů) a SDZ A15, B20a(30). Vždy budou o úseku informováni rezidenti minimálně 7 dní před zahájením st. prací.
2. překop III/22129 bude prováděn a s tím, že zbyde pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celé délce bude zabezpečeno pomocí směrových desek Z4 a zábranou Z2. Přes překopanou polovinu III/22129 bude položen pojezdový plech, nebo bude komunikace zhutněna do pojezdového stavu
3. pokud bude překop přes chodník bude osazena přechodová lávka.
4. v případě potřeby zajistí dodavatel řízení dopravy náležitě vybavenými a poučenými pracovníky - průjezd vozidel IZS !!!!!
5. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:


Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 8.10.2024

13. 11. 2024
Příloha k č.j. 19286/0D/24
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
1/3

Uace

Celková sit

Zájmové území

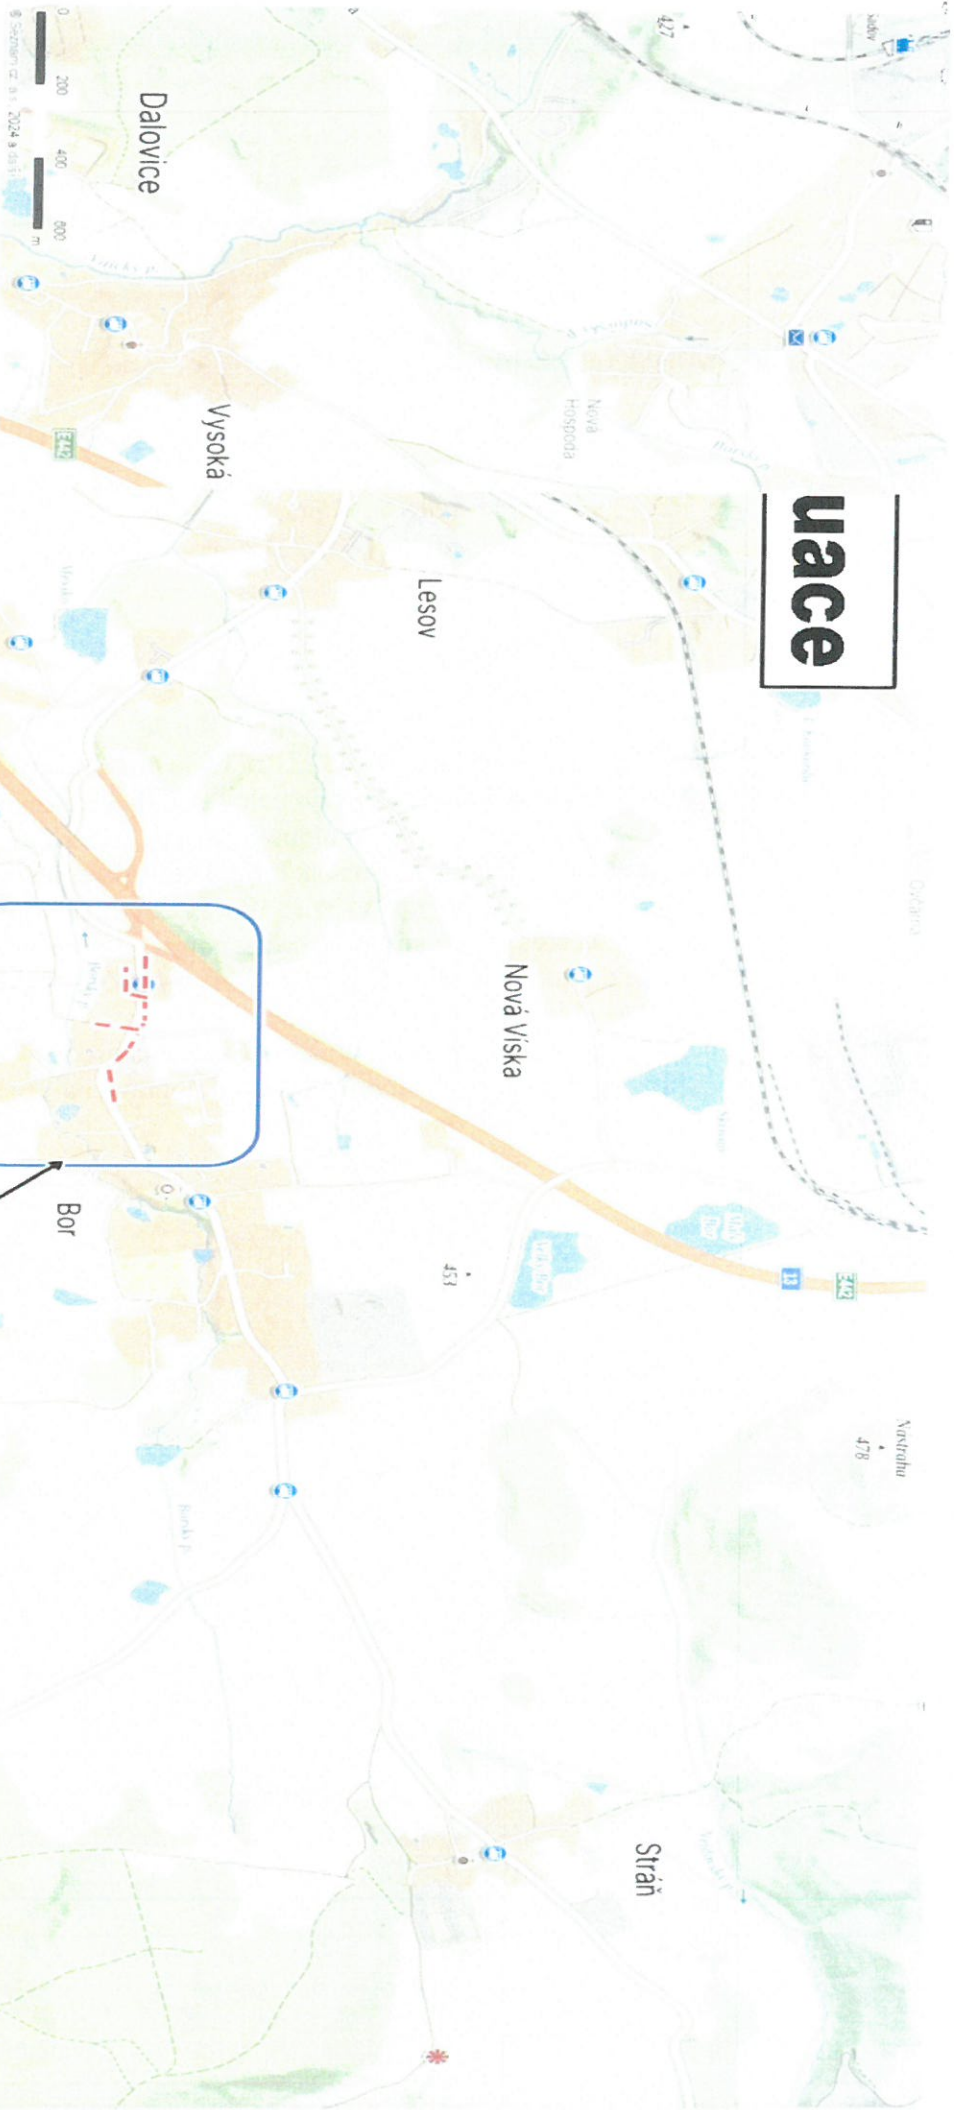

Príloha k čj. 179/2010/224

13. 11. 2024

[Handwritten signature]

MAPPY.CZ

