

23. 04. 2025

Průběh k.s.j. 4215/00/25
MAGISTROVÝ ÚŘED
KARLOVY VARY
112

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118, 360 18 Karlovy Vary-Sedlec
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: K.V. Božičany poz. č. 1765 - nové podzemní vedení kabelu NN
IV-12-0022817

- podélný výkop v kraji komunikace
- překop po polovinách

Realizace: E-Plus s.r.o.
Karlovy Vary

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. podélný výkop v krajnici komunikace bude prováděn s tím, že zbytek pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a bude po celé délce zabezpečen pomocí směrových desek Z4 a SDZ A15 v kombinaci s B20a(30).
2. překop MK po polovinách bude prováděn s tím, že zbytek pro průjezd vozidel minimálně 2,75 metru a po celé délce bude zabezpečen pomocí směrových desek Z4 a SDZ A15 v kombinaci s A6b a popř. E7b dle situace. Překopaná polovina MK bude zabezpečena pojezdovým plechem, nebo bude zhutněna do pojezdového stavu
3. v případě potřeby zajistí dodavatel volný průjezd složkám IZS!!!! - náležitě poučení a vybavení pracovníci zhotovitele.
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání
6. světla typ 1.

Vyjádření Policie DI Sokolov:

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 6.1.2025



23. 04. 2025

Frída k úp. 22.15/00/25
VYKONATELSTVÍ
KARL OPAŘ
2/2

KV, Božičany poz.č. 1765-nové podzemní vedení kabelu NN

překop MK po polovinách

výkop v krajnici

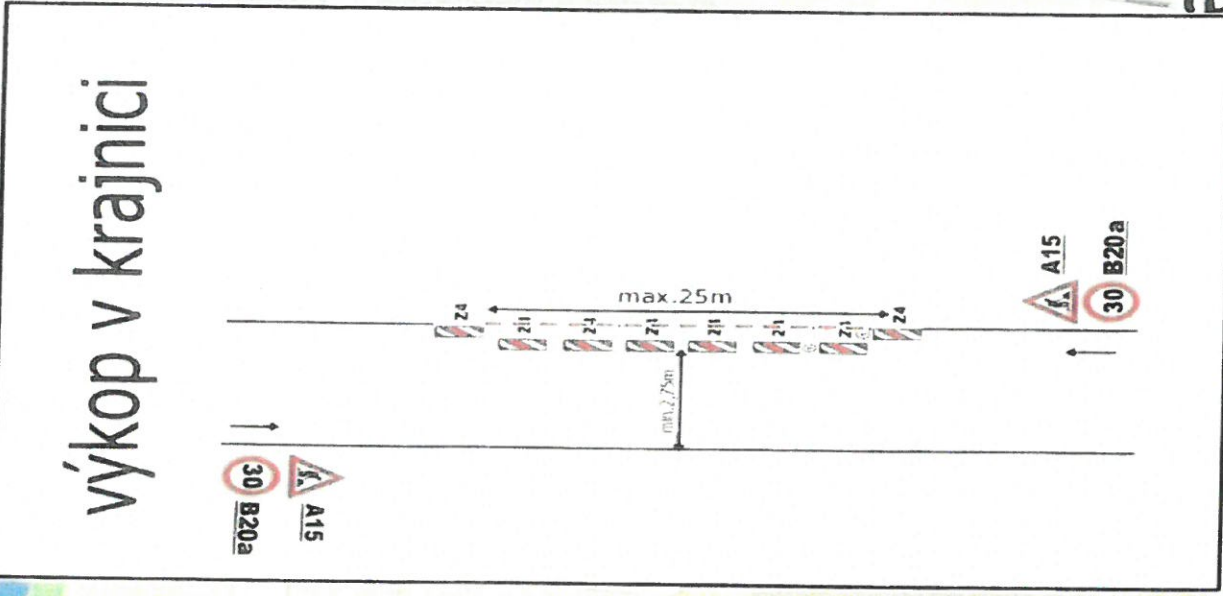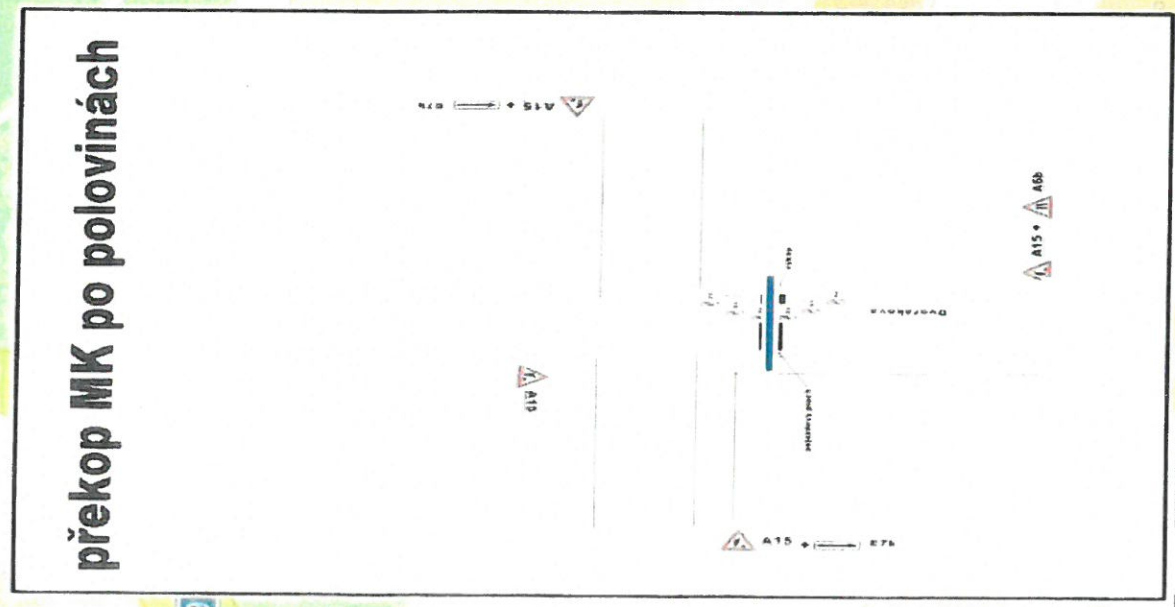

AV.C2
