

24. 06. 2026

Příloha k čj.

1118/001/26

MAGISTROVÝ ÚŘED

KARLOVY VARY

001

112

FLEX dopravně inženýrské služby s.r.o., Rosnická 118., 360 10 Karlovy Vary
Tel./fax: 353569231, 353569632 OR Plzeň, oddíl C, vložka 7402
E-mail: info@flexkv.cz WWW: flexkv.cz

Návrh dopravního opatření

Stavba: KV.III/2201, Na Vlečce-výstavba sjezdu na III/2201, výjezd vozidel stavby

-napojení sjezdu na III/2201
-výjezd vozidel stavby

Realizace: VIDEST s.r.o.
Karlovy Vary

Termín: cca.

Investor:

Dopravní značení se navrhuje dle příloh s tím, že:

1. při napojení sjezdu na III/2201 bude zachován minimální průjezd 5,5 metru a po celé délce budou osazeny směrové desky Z4 a SDZ A15 v kombinaci s A6b v případě potřeby P7-P8
2. Nový sjezd na III/2201 bude používána po dobu stavby montážní technikou zhotovitele a na III/2201 budou osazeny SDZ IP22 (výjezd vozidel stavby) a na sjezd SDZ P6. Po dobu stavby budou doplněny SDZ A15 v kombinaci s B20a(30)
3. v případě potřeby zajistí dodavatel práci krátkodobé ruční řízení provozu pomocí náležitě poučených a vybavených pracovníků-průjezd vozidel IZS!!! stavby atd.
4. dopravní značky reflexní, základní velikost
5. vzdálenosti dle TP 66 – II. vydání
6. světla typ I.

Vyjádření Policie ČR-DI Karlovy Vary:

Zbyněk Morávek
Karlovy Vary 21.5.2026

24. 06. 2026

Příloha k č. j. 1118/001/26

FAKTOUR 112


Bc. Pavel Písařík
POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 17.06.2026 9:43:14

IP22



IP22

KV, Otovice, Na Vlečce - výstavba napojení na III/2201, výjezd vozidel stavby

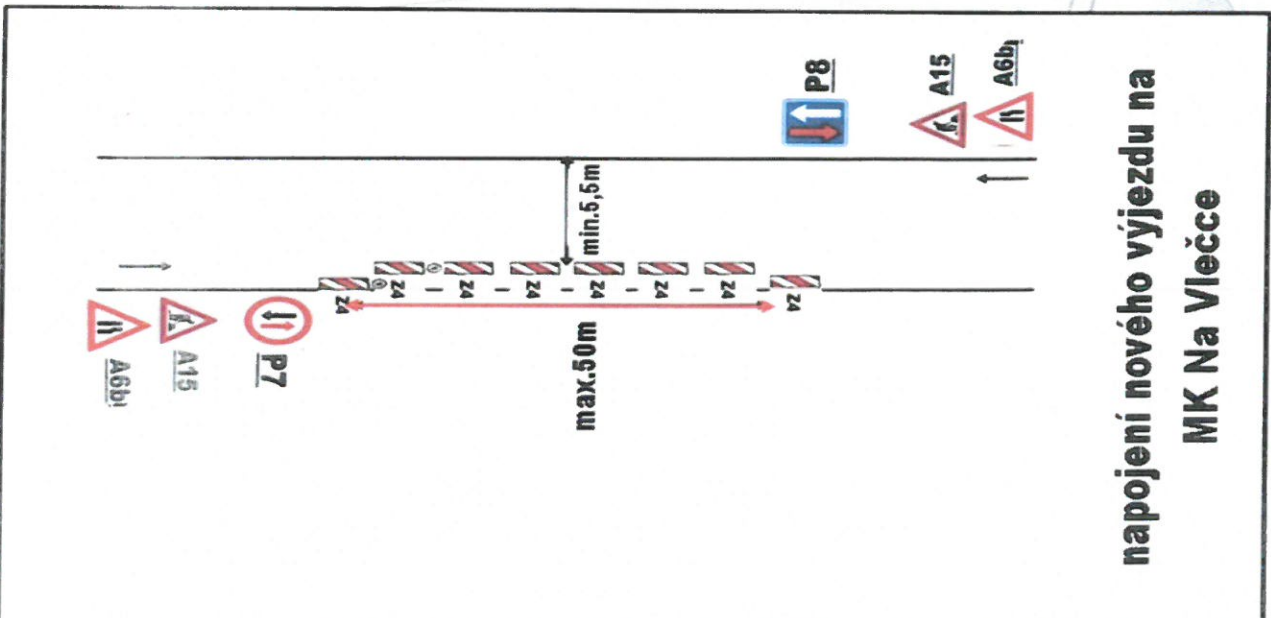

Hroznětinská

Hroznětinská

Hroznětinská

Hroznětinská

Na Vlečce

Na Vlečce

Na Vlečce

Na Vlečce
