



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00058/ORI

KARLOVY VARY 2015

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014258/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 28042395, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČO: 45274924

DIČ:CZ45274924

Bankovní spojení: č.ú.:0141360165/0100 vedený u Komerční banky,a.s.Praha

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary

Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

jednající ve věcech stavby: Petr Bláha, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 337

František Köhler, stavbyvedoucí, tel.: 602 360 022

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“, „**Výkon zeměměřičských činností**“, „**Projektová činnost ve výstavbě**“, „**Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ vyhlášené dne 20.2.2014 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 6.5.2014; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 13.5.2014 pod bodem č. ZM/160/5/14 jednání; a



- (E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 9.6.2015 pod bodem č. RM/1020/6/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č.1, č.18, č.22, č.23, č.29, č.32, které jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

V. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **42.033.379,38 Kč bez DPH**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.8.2014, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.



IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č.1, č.18, č.22, č.23, č.29, č.32

V Karlových Varech, dne 15.6.2015


Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 - Nové Město





Usnesení č. RM/1020/6/15
z 18. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.06.2015

Věc: Veřejná zakázka „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnové listy č.18, č.22, č.23, č.29, č.32, na základě kterých se snižuje cena díla o částku 110.003,46 Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 184.651,62 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 42.033.379,38 Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic



Usnesení č. RM/395/3/15
z 7. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.03.2015

Věc: Veřejná zakázka „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Rada města Karlovy Vary **schválila** Změnový list č.1, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 74.648,16 Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změnu č. 001

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 8. září 2014

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 06 Splašková kanalizace****SO 07 Dešťová kanalizace****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - v projektové dokumentaci splaškové kanalizace jsou vyprojektovány mj. revizní šachty (RŠ) č.8 a č.9, viz příložená situace, projektovaná trasa je zakreslena čárkovaně s obloučky (červeně).

DEŠŤOVÁ KANALIZACE – v projektové dokumentaci dešťové kanalizace jsou vyprojektovány mj. revizní šachty dešťové kanalizace (DŠ) č.5, č.6, č. 14 a č. 16, viz příložená situace, projektovaná trasa je zakreslena čárkovaně se dvěma obloučky (červeně).

Nové řešení:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - nebudou realizovány RŠ č.8, RŠ č.9, dojde k částečnému napřimění trasy splaškové kanalizace, viz příložená situace, nová trasa je zakreslena plnou čarou červeně.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - nebudou realizovány DŠ č.5 a DŠ č.6 a DŠ č. 14 a DŠ č. 16, dojde k částečnému napřimění trasy dešťové kanalizace, viz příložená situace, nová trasa je zakreslena plnou čarou zeleně.

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel navrhl úpravu trasy splaškové kanalizace a dešťové kanalizace s cílem snížení investičních nákladů (částečné napřimění trasy kanalizace se snížením počtu revizních šachet; revizní šachty se umísťují v každém lomu kanalizačního potrubí). Projednáno na kontrolním dnu (KD) č.4, promítnuto do zápisů z KD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS).

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín ani kvalitu díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 74 648,16 Kč bez DPH.

Poznámka: ve změně č.002 je řešeno doplnění potrubí v trasách dešťové i splaškové kanalizace jako náhrada za zrušené šachty.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 001

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení díla.

Datum: 8.září 20014

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

8.9.2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum: 2. prosince 2014

Podpis:



Ocenění ke změně č. 001

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 07 Dešťová kanalizace**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 08.09.2014

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
12.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-3,584	175,00	-627,20
13.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-1,792	12,00	-21,50
14.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-3,584	185,00	-663,04
15.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,792	12,00	-21,50
19.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-7,168	20,00	-143,36
57.	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-4,000	42,00	-168,00
80.	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-4,000	1 680,00	-6 720,00
87.	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	-4,000	85,00	-340,00
101.	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	-4,000	2 315,00	-9 260,00
102.	592243500	dno betonové šachty TBZ-Q.1 100/475 KOM Vmax	kus	-4,000	4 988,00	-19 952,00
105.	592243480	lěsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-12,000	142,00	-1 704,00
106.	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	-4,000	552,00	-2 208,00
107.	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	-4,000	715,00	-2 860,00
109.	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-4,000	1 299,00	-5 196,00
Celkem						-49 884,61
Celkem včetně DPH 21 %						-60 360,38

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1Projektant: Ing.arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, TašoviceObjednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy VaryTDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - RybářeEUROVIA CS, a.s.
od úřední zavadí oblast Čechy západ
za voz. Karlovy Vary
Sezlečká 72, 360 02 Karlovy Vary

[Handwritten signatures and stamps]

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Žapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.4

Zápis z kontrolního dne 28.8.2014

Přítomni:

František Kohler – zhotovitel
 Karel Bozděch - podzhotovitel
 Lukáš Hutta - AZK
 Miloslav Bokota – projektant
 František Kocourek - objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č.3 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPINĚNO** termín jednání 1.9.2014 10,00 hod na Stavebním úřadě p. Lukesle

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. Částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

1/6 Vyvést oznámení stavby na OIP Plzeň a označení STAVBA POVOLENA při vjezdu na stavbu. zaj. zhotovitel. **TRVÁ**

2/1 Při skrývce ornice vytěžena suť. Bude uložena na řízené skládce. Zhotovitel doloží likvidaci suti „vážními listky“. Zhotovitel předloží finanční ocenění likvidace suti **TRVÁ**

2/3 Projektant si vymíňuje k odsouhlasení vybrané materiály. Seznam projektant předloží. **TRVÁ**

3/2 Kanalizace splašková:

Zhotovitel předloží návrh termínů pro částečné/úplné uzavírky komunikace v místě nově budované kanalizace. Prosím objednatele o spolupráci při vyřízení potřebných povolení na odboru dopravy magistrátu. termín: 25.8.2014 **SPINĚNO** Rozhodnutí odboru dopravy magistrátu předložit TDS a objednavateli

3/3 Kanalizace splašková RŠ 6. Zhotovitel provede šachtu s přípravou na připojení haly na míčové sporty DN 150 **TRVÁ**

3/4 Kanalizace dešťová: Napojit kanalizaci do šachty ŠO 01 (dodávka zhotovitele vedlejší stavby dle PD haly) Není nutno zasahovat do konstrukce vozovky. Dodatek PD projektant předal zhotoviteli. Prosím o zaslání PD v elektronické podobě objednateli a TDS. **SPINĚNO**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

4/1 Připojení areálu CZB na rozvody NN

Pozván projektant na jednání příštího KD. Pozor na termín realizace v závislosti na dokončení stavby CZB.


4/2 Proveden archeologický průzkum, zápis ve stavebním deníku – bez nálezu

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové. Předloží ke schválení objednateli.

4/4 Projektant vyřeší ve spolupráci s projektantem Haly pro míčové sporty napojení povrchových svodů dešťové vody (2x) do zatrubnění toku na hranici obou staveb.


Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 4. září 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 224F9

CZB SO 07 DEŠŤOVÁ KANAL ZMĚNA č. 001

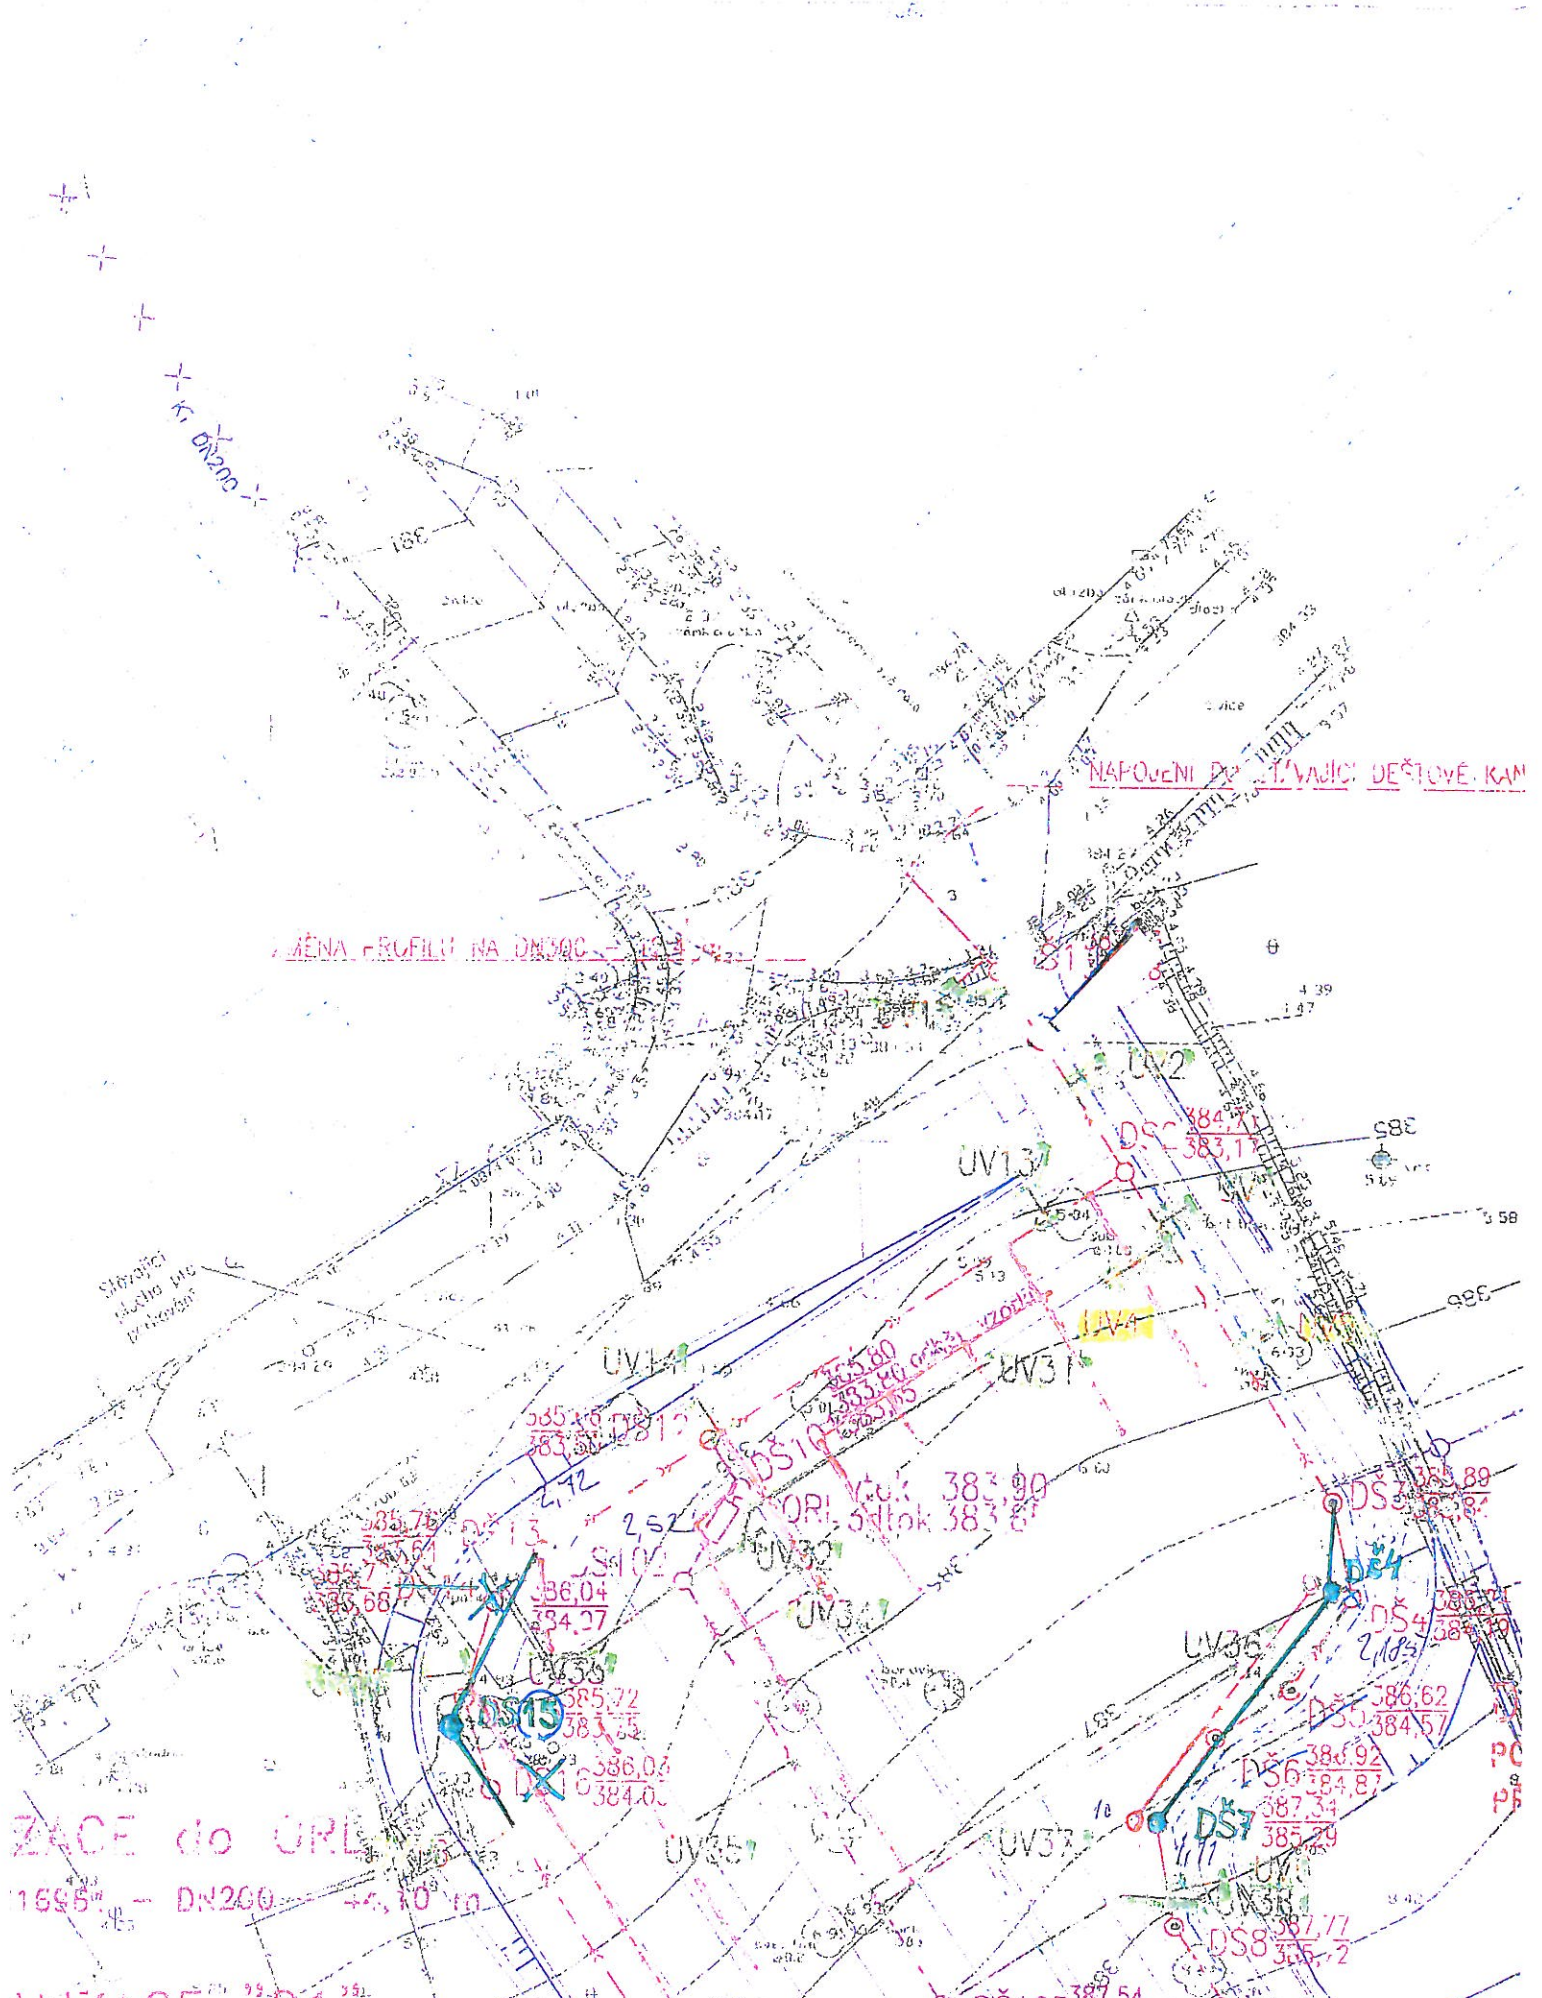

ZACE do URL

1695" - DN200 - 4,10 m

ANIZACE R1

DŠ17 387.54

Požadavek zhotovitele na změnu č. 018


Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 7. duben 2015

Podpis:

VZ 



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

Podpis:

3.6.2015 


Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

3.6.2015 

Ocenění ke změně č. 018

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko -
ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 07.04.2015 se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
79.		telefonní ústředna, Bonnel Tina 206	ks	-1	5 200,00	-5 200,00
Celkem						-5 200,00
Celkem včetně DPH 21 %						-6 292,00




V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

EUROVIA CS a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
základna Karlovy Vary
Sokolovská 72, 360 02 Karlovy Vary

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Slepý rozpočet - výkaz výměr

Zakázka

Číslo zakázky	E-13055-02/01-1E
Zakázka	Karlovy Vary - CZB - SO 02 CVIČNÉ BUDOVIY / CB 01 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.Etapa
Klasifikace	Budovy občanské výstavby
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Změna : Březen 2014

Verze

Popis	CB 01 - HLAVNÍ BUDOVA-1.E
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zpracovatel	00 - Stanislav Volek, Nová 14, 360 07 Karlovy Vary-Doubí
Investor	404 / 4 - Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 20 Karlovy Vary
Projektant	124 / P - BOKOTA ARCHITEKTI - ing arch Miloslav Bokota, Česká 6. 360 18 Karlovy Vary-Tašovice

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDU A SLABOPROUDU
včetně dodávek speciálních-AV Media,vstupní kartový systém
úprava Z2

vypracoval Ing.M.Kraus
datum 8.10.2013

Areál CZB-Hlavní budova cb01

základní cena 0

k ceně bude účtováno DPH dle směrnice

cb01-hlavní budova								
materiál		ks/m	množství	materiál	montáž	celkem materiál	celkem montáž	součet celkem
kabel CYKY	3Ax1,5	m	20			0	0	0
dtto	3Cx1,5	m	950			0	0	0
dtto	3Cx2,5	m	1200			0	0	0
dtto	5Cx1,5	m	30			0	0	0
dtto	5Cx2,5	m	60			0	0	0
dtto	5Cx4	m	5			0	0	0
dtto	5Cx6	m	15			0	0	0
dtto	5Cx10	m	50			0	0	0
vodič	CY 4	m	35			0	0	0
dtto	CY 16	m	35			0	0	0
ukončení vodičů	do 2,5mm2	ks	220			0	0	0
součet								0,0
pomocný materiál		3%	kpl					0,0
prořez		5%	kpl					0,0
celkem za oddíl								0,0
Přístroje ABB Tango								
			Základní provedení spínačů-typ si upřesní investor					
přístroj spínače č.1		ks	20			0	0	0
přístroj spínače ř.5 sériového		ks	7			0	0	0
přístroj spínače ř.6 střídavého		ks	4			0	0	0
přístroj spínače 1/0tlač.vent.		ks	12			0	0	0
čidlo pohybu		ks	2			0	0	0
zásuvka jednonásobná		ks	56			0	0	0
zásuvka s přep.ochranou		ks	10			0	0	0
zásuvka IP44		ks	4			0	0	0
zásuvková skříň XS-2x230/16A,1x400/16A		ks	1			0	0	0
rámeček jednonásobný		ks	38			0	0	0
dvounásobný		ks	8			0	0	0
trojnásobný		ks	6			0	0	0
pětinásobný		ks	8			0	0	0
osušovač rukou		ks	5			0	0	0
termostat	dod.UT	ks	1			0	0	0
celkem za oddíl								0
Instalační materiál								
krabice univerzální	KU 68/1	ks	80			0	0	0
dtto	KO 97	ks	6			0	0	0
krabice rozvodná	KT 250	ks	3			0	0	0
trubka PVC		2316 m	450			0	0	0
dtto		2323 m	350			0	0	0
přípojnice HOP		ks	1			0	0	0
autonomní hlásič požáru		ks	6			0	0	0
svítidlová svorkovnice		ks	45			0	0	0
svorka	WAGO	ks	35			0	0	0
svorka	BERNARD	ks	6			0	0	0
součet						0	0	0,00
pomocný materiál		5%	kpl			0	0	0,0
celkem za oddíl								0,00
Svítidla-přisazená								
			Pozor -svítidla upřesní investor a architekt					
svítidlo 4x18W,opt.mřížka	A	ks	24			0	0	0
svítidlo 2x36.prisma	B	ks	8			0	0	0
svítidlo 1x22W,IP54	C	ks	34			0	0	0
svítidlo 1x18kuch.linka	D	ks	1			0	0	0
nouzové,vlastní zdroj	N	ks	8			0	0	0
žárovka úsporná	18W	ks	24			0	0	0
trubice zářivková	36W	m	16			0	0	0
startér	36-60W	m	16			0	0	0
recyklace zdrojů		ks	16			0	0	0
recyklace svítidel		ks	32			0	0	0,00
součet								
Rozvaděče a dodávky								
rozvaděč skříňový	RH	ks	1			0	0	0
dle schema						0	0	0
relé k ventilátoru		ks	2			0	0	0
doplnění rozvaděčů	pro MaR a slab.	kl	1			0	0	0
součet								
Ostatní								
jednání,koordinace		hod	25		0	0	0	0

práce mimo položky		hod	25	0	0	0	0
skutečně provedení		hod	15	0	0	0	0
celkem za oddíl							0
Pomocné práce							
zednické přímomoce		kpl	1		0	0	0
průrazy, průchodky		ks	60		0	0	0
celkem za oddíl					0	0	0
Bleskosvod							
pomocný jímač	JP 0,5	ks	9		0	0	0
podpěra vedení	PV	ks	45		0	0	0
svorka k jímací tyči	SJ	ks	9		0	0	0
svorka spojovací	SS	ks	30		0	0	0
svorka universální	SU	ks	5		0	0	0
svorka zkušební	Sz	ks	6		0	0	0
svorka připojovací	SR 02	ks	6		0	0	0
svorka	SR 03	ks	8		0	0	0
svorka okapová	SO	ks	6		0	0	0
uzem.vodič	AlMgSi	kg	15		0	0	0
dtto	FeZn 10	kg	15		0	0	0
základový zemnič	FeZn 30/4	kg	90		0	0	0
krabice pro SZ	KO 125	ks	6		0	0	0
ochranný úhelník	OU 1,7	ks	6		0	0	0
držák OU	DOUa 1,5	ks	12		0	0	0
trubka pevná	8032	m	20		0	0	0
označovací štítek		ks	6		0	0	0
formování dílu		ks	12		0	0	0
měření zem.odporu a revize	za svod	ks	6		0	0	0
součet					0	0	0
pomocný materiál	5%				0	0	0,0
celkem za oddíl							0,0
Revize		hod	25		0	0	0
Telefonní technologie							
telefonní ústředna	Bonnel Tina 206	ks	1		0	0	0
switch	D-Link DES-1016R+	ks	1		0	0	0
wifi AP -Ubiquiti Unifi	Access Point 2,4GHz	kpl	1		0	0	0
vč.anteny							
ADSL/VDSL modem+router							
součet							0
Technologie AV Media							
dle specifikace odborné dodávky firmy		kpl	1		0	0	0
slaboproudé prvky					0	0	0
měření,seřízení,uvedení do provozu		v dodávce	1		0	0	0
součet							0
Datové rozvody STK							
datová zásuvka	2xRJ 45	ks	16		0	0	0
kabel UTP cat 5e		m	250		0	0	0
montážní příslušenství		kpl	1		0	0	0
trubka Kabuflex	40mm	m	250		0	0	0
součet					0	0	0
Zemní práce							
vytyčení trasy		km	0,3		0	0	0
sejmutí ornice		m	10		0	0	0
bet.základ do zeminy		m3	1		0	0	0
výkop kabel.rýhy 35/70		m	20		0	0	0
výkop kabel.rýhy 50/120		m	10		0	0	0
trubka Kabuflex 40		m	30		0	0	0
zához kabel.rýhy 35/70		m	20		0	0	0
zatažení prot.lana do tvárnic		m	2		0	0	0
zához kabel.rýhy 50/120		m	10		0	0	0
kabel.chrán. PE trouba (kabuflex100)		m	20		0	0	0
kabel.prostup bet.trouba 15cm		m	2		0	0	0
křížovatka s kabelem		ks	1		0	0	0
křížovatka s potrubím		ks	1		0	0	0
zajištění otvoru proti vodě		ks	2		0	0	0
odvoz zeminy do 1km		m3	2		0	0	0
odvoz zeminy další km		m3	10		0	0	0
provizorní úprava terenu		m2	10		0	0	0
součet							0
Rekapitulace							0
	kabely						0
	přístroje						0
	instal.materiál						0
	svítidla						0
	rozvaděče						0

Požadavek zhotovitele na změnu č. 018

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 7. duben 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko -
ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDU A SLABOPROUDU****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V projektové dokumentaci bylo uvažováno s telefonní ústřednou Bonnel Tina 206.

Nové řešení: (viz příložená situace)

No vě je navržena telefonní ústředna Yeastar MyPBX SOHO, IP PBX.

Zdůvodnění změny:

S ohledem na budoucí zajištění telefonních a datových služeb v areálu je již kapacitně nedostačující původní telefonní ústředna nahrazena novým typem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 5 200,00 Kč bez DPH.

Poznámka: ve změně č.019 je řešeno doplnění telefonní ústředny vyhovující novým technickým požadavkům.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 022

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 4. květen 2015

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

4.6. 2015

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

3.6. 2015

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 022

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 4. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní projektová dokumentace řešila obecné rozložení a rozměry komunikací.

Nové řešení: (viz příložená situace)

V novém řešení byly konkretizovány tvary a upřesněny výměry komunikací na základě úpravy a schválení projektové dokumentace DI PČR.

Zdůvodnění změny:

DI PČR provedlo úpravy a následně schválení projektové dokumentace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 30 524,00 Kč bez DPH.

Ocenění ke změně č. 022

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 04.05.2015

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
48.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-68,00	127,00	-8 636,00
51.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-46,00	188,00	-8 648,00
53.	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-46,00	9,00	-414,00
56.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-46,00	163,00	-7 498,00
61.	59245308	Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-22,00	104,00	-2 288,00
63.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-22,00	157,00	-3 454,00
104.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-13,25	5,00	-66,27
Celkem						-31 004,27
Celkem včetně DPH 21 %						-37 515,17

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

EUROVIA CS, a.s.
odstěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Pízní, oddíl C, vložka 22480

Požadavek zhotovitele na změnu č. 023


Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 4. květen 2015

Podpis:



EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Příspěvný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary


Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

2.6.2015

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

3.6.2015

Podpis:



Ocenění ke změně č. 023

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 02 - Cvičné budovy, CB 02, CB 03, CB 04, CB 05 a CB 08**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 04.05.2015

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou	kus	-23,00	2 000,00	-46 000,00
Celkem						-46 000,00
Celkem včetně DPH 21 %						-55 660,00

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1



Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice


Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Šedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Požadavek zhotovitele na změnu č. 023

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 4. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy VaryNázev části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 02 - Cvičné budovy, CB 02, CB 03, CB 04, CB 05 a
CB 08****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původní projektové dokumentaci je napojení střešních svodů do kanalizace přes geigry.

Nové řešení:

V nové projektové dokumentaci je napojení střešních svodů do kanalizace řešeno na přímo bez použití geigrů.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k upřesnění konstrukce buněk, základů a odvodnění střech nelze napojit přes geigry.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 46 000,00 Kč bez DPH.

Poznámka: ve změně č.026 je řešena úprava přímým napojením do kanalizace.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 029

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 18. květen 2015

Podpis:



EUROVIA VINET, s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
odštepny závod Oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sešlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

1.6.2015


Podpis:

Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

3.6.2015

Podpis:



Ocenění ke změně č. 029

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.05.2015

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
48.	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-33,50	127,00	-4 254,50
61.	59245308	Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-33,50	104,00	-3 484,00
63.	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	-33,50	157,00	-5 259,50
104.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z	t	-4,42	5,00	-22,11
Celkem						-13 020,11
Celkem včetně DPH 21 %						-15 754,33

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře



EUROVIA CS, a.s.
odštěpený závod oblast Čechy záp.úř.
zář.úř. Karlovy Vary
Sepelecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 995
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22400

Požadavek zhotovitele na změnu č. 029

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 18. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původní projektové dokumentaci jsou započteny výměry chodníků k nerealizovaným objektům SO 02 - CB 05 Mimořádné události, SO 02 - CB 07 Operační středisko, SO 02 - CB 06 Vjemy a SO 02 - CO 17 Trafo model.

Nové řešení:

Chodníky k nerealizovaným objektům SO 02 - CB 05 Mimořádné události, SO 02 - CB 07 Operační středisko, SO 02 - CB 06 Vjemy a SO 02 - CO 17 Trafo model nebudou realizovány, výměry budou odečteny.

Zdůvodnění změny:

Realizace chodníků pozbyla významu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 13 020,11 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 032

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 18. květen 2015

Podpis:



EUROVIA VINET s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
Eustřední závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

3.6.2015

Podpis:



Ocenění ke změně č. 032

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název částí stavby (stavební objekt): **SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.05.2015

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
89.	58380343	Obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	-12,12	959,00	-11 623,08
99.	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného	m	-12,00	263,00	-3 156,00
Celkem						-14 779,08
Celkem včetně DPH 21 %						-17 882,69

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

EUROVIA CS, a.s.
Bezpečný závod oblast Těchy západ
závod Karlovy Vary
Bedlačská 72, 360 02 Karlovy Vary

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Požadavek zhotovitele na změnu č. 032

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 18. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původním řešení je obsažena realizace pokládky žulové obruby.

Nové řešení:

Žulové obruby nebudou osazeny.

Zdůvodnění změny:

V místě napojení asfaltového krytu na žulovou obrubu by docházelo ve styčné spáře asfaltové plochy a žulových obrub k poruchám vlivem zamrzání a zimní údržby. Následným zatékáním a zamrzáním vody ve vzniklých příčných sparách (neuzavřená asfaltová plocha v oblouku) by docházelo ke znehodnocení asfaltové plochy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 14 779,08 Kč bez DPH.
