

Statutární město Karlovy Vary

a

OHL ŽS, a.s.

SMLOUVA O DÍLO

KARLOVY VARY 2015



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014231/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 28042395, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: 46342796

DIČ: CZ 46342796

bankovní spojení: č.ú.: 7507621/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno - město,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Káplem

jednající ve věcech technických: Ing. Markem Rýdlem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu „**Karlovy Vary, Hala pro míčové sporty – nové stavební práce dle Změnových listů č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b)**“; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2



I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, Hala pro míčové sporty – nové stavební práce dle Změnových listů č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b)**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou **Změnové listy č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b)** (příloha č.3 smlouvy).
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) označené jako „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“, zpracované v měsíci 02/2014, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
a
 - b) Změnovými listy č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b).

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 30. května 2015.**
2. **Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ihned po podpisu této smlouvy o dílo.**
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
Zahájení díla – ihned po podpisu smlouvy o dílo
Ukončení díla – 30. května 2015

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na stavbě „**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**“, která se nachází v Karlových Varech, v městské části Tuhnice.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím prizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **777.733,- Kč bez DPH** (slovy: Sedmsetsedmdesátsedmtisícsetřicet tři korun českých) (dále jen „Cena za provedení díla“).
Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

3. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesát procent) Celkové ceny díla.
Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. Splatnost faktur na dílčí plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
 - (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
 - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Objednatelům podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

5. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou včas a řádně, pokud ke dni splatnosti Ceny díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení díla nebo její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejích příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **30. května 2015**. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.
2. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla či jeho částí, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. III. odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VI odst. 1. a/nebo 5. a/nebo čl. IX odst. 1. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení povinnosti zhotovitele zvlášť.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku V. odst. 3. a 4. této smlouvy objednatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **OHL ŽS, a.s.**
Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XII., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

XIV. Zajištění závazků zhotovitele při plnění veřejné zakázky

Finanční zajištění odpovědnosti za záruku

1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku VIII. této smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3549786342, částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny díla (souhrn fakturovaných dílčích plnění a fakturované konečné částky) včetně daně z přidané hodnoty a bude sloužit jako finanční záruka (jistota) za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz článek V. této smlouvy. O dobu prodloužení zhotovitele se splněním závazku ke složení „jistoty“ se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury.
2. Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruka dle čl. XIV., odst.1. této smlouvy na účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, k úhradě svých splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozím odstavci smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční doby dle článku VIII. smlouvy, je objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku připadající na daně, bankovní poplatky či další náklady objednatele spojené s vedením účtu či dalších náklady objednatele spojené s udržováním jistoty, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční doby dle článku VIII. smlouvy.


Bankovní záruka za záruku

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek zhotovitele k poskytnutí finanční záruky (jistoty) ve smyslu článku XIV. odst.1. této smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla, včetně daně z přidané hodnoty, jak je tato definována v čl. XIV. odst.1. této smlouvy, může být nahrazen tím, že zhotovitel nejpozději do dne splatnosti jistoty dle čl. XIV. odst.1. předá objednateli bankovní záruku, resp. záruční listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podmínek upravených touto smlouvou (dále jen „**Bankovní záruka za záruku**“).
5. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených smlouvou článku XIV. odst. 4. a 6. této smlouvy, tedy Bankovní záruku za záruku, poté, kdy již zhotovitel složil jistotu, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky) včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených s udržováním kauce, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené záruční listiny (Bankovní záruky za záruku).

6. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území ČR výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku VIII. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku odpovídající výši jistoty sjednané dle článku XIV. odst.1. této smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle článku VIII. této smlouvy. Bankovní záruka za záruku podle článku XIV. odst. 4 a 5. této smlouvy musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu vůči objednateli.
7. Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje objednatel, že veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za záruku, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v nabídkové ceně zhotovitelem předložené v rámci zadávacího řízení. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádá ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.





- Příloha č. 1 :** Výpis z živnostenského rejstříku
Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 3 : Změnové listy č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b)

V Karlových Varech, dne 30.1.2015



Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



Ing. Jiří Kápl,
ředitel Divize 5
v plné moci za společnost OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS  372

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veverčí
IČ: 463 42 799, DIČ: CZ46342799





Usnesení č. RM/164/1/15
z 3. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 27.01.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnové listy 1a) a 7a), na základě kterých se snižuje cena díla o částku 239.558,- Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Brno, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Karlovy Vary, Hala pro míčové sporty – nové stavební práce dle Změnových listů č.1b), č.2, č.4, č.5, č.6 a č.7b)“ za cenu 777.733,- Kč bez DPH, v předloženém znění s tím, že částka 777.733,- Kč bez DPH bude čerpána z uspořené prostředků vzniklých na základě výsledku zadávacího řízení.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 30.01.2015 14:57:42

Subjekt

Obchodní firma:

OHL ŽS, a.s.

Sídlo:

Burešova 938/17, 602 00, Brno - Veveří

Identifikační číslo osoby:

46342796

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

[Javier De Vicente Sanchez](#)

Jméno a příjmení:

[Ing. Josef Rezek](#)

Jméno a příjmení:

[Ing. Tomáš Nossek](#)

Jméno a příjmení:

[Manuel Viciano Pedrosa](#)

Jméno a příjmení:

[Carmen Escribano Guzmán](#)

Jméno a příjmení:

[Paolo Bee, MBA](#)

Jméno a příjmení:

[Ing. Michal Štefl](#)

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

[Ing. Viktor Zachariev](#)

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Izolatérství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:

[Ing. Viktor Zachariev](#)

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

Opravy silničních vozidel

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

Zdeněk Kelar**Živnostenské oprávnění č. 4:**

Předmět podnikání:

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

Zdeněk Kelar**Živnostenské oprávnění č. 5:**

Předmět podnikání:

Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

Libor Petrů**Živnostenské oprávnění č. 6:**

Předmět podnikání:

Obráběčství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

František Matoušek**Živnostenské oprávnění č. 7:**

Předmět podnikání:

Provádění trhacích prací

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

30.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

Ing. Zdeněk Stojan**Živnostenské oprávnění č. 8:**

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

[Ing. Martin Kudláček](#)

Živnostenské oprávnění č. 9:

Předmět podnikání:

Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

12.07.1995

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

[Ing. Hubert Bodejček](#)

Živnostenské oprávnění č. 10:

Předmět podnikání:

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

07.06.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

[Ing. Milan Smutný](#)

Živnostenské oprávnění č. 11:

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

[Ing. Karol Bozán](#)

Živnostenské oprávnění č. 12:

Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

[Petr Bobek](#)

Živnostenské oprávnění č. 13:

Předmět podnikání:
Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:
10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Ing. Miroslav Zeman

Živnostenské oprávnění č. 14:

Předmět podnikání:
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:
10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Roman Dostálek

Živnostenské oprávnění č. 15:

Předmět podnikání:
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:
Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:
09.03.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Ing. Anna Králová

Živnostenské oprávnění č. 16:

Předmět podnikání:
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti:
Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:
17.12.2004

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Ing. Pavel Vrba

Živnostenské oprávnění č. 17:

Předmět podnikání:
Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:
09.03.1993

Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Ing. Miroslav Zeman**Živnostenské oprávnění č. 18:**

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designerská, aranžérská činnost a modeling
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

09.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou**Živnostenské oprávnění č. 19:**

Předmět podnikání:

Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

Ing. Viktor Zachariev

Jméno a příjmení:

Ing. Zdeněk Mlýnek**Živnostenské oprávnění č. 20:**

Předmět podnikání:

Zednictví

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

[Ing. Viktor Zachariev](#)

Jméno a příjmení:

[Ing. Zdeněk Mlýnek](#)**Živnostenské oprávnění č. 21:**

Předmět podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

[Roman Dostálek](#)**Živnostenské oprávnění č. 22:**

Předmět podnikání:

Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

10.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

[Zdeněk Kelar](#)

Jméno a příjmení:

[Ing. Viktor Zachariev](#)**Živnostenské oprávnění č. 23:**

Předmět podnikání:

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti:

Koncesovaná

Vznik oprávnění:

31.03.1993

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení:

[Zdeněk Kelar](#)

Jméno a příjmení:

[Milan Lechner](#)**Živnostenské oprávnění č. 24:**

Předmět podnikání:

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:
18.03.2013
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:
Ing. Radek Turin

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:
Javier De Vicente Sanchez
Datum narození:
22.01.1977
Jméno a příjmení:
Milan Lechner
Datum narození:
05.03.1964
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Zdeněk Kelar
Datum narození:
14.10.1959
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Ing. Michal Štefl
Datum narození:
18.05.1956
Jméno a příjmení:
Ing. Hubert Bodejček
Datum narození:
12.04.1974
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Manuel Viciano Pedrosa
Datum narození:
17.05.1957
Jméno a příjmení:
Paolo Bee, MBA
Datum narození:
27.04.1964
Jméno a příjmení:
Ing. Josef Rezek
Datum narození:
23.12.1952
Jméno a příjmení:
Ing. Martin Kudláček
Datum narození:
25.05.1978
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Ing. Milan Smutný
Datum narození:
21.12.1969
Občanství:
Česká republika

Jméno a příjmení: **Ing. Zdeněk Mlýnek**
Datum narození: **21.07.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **František Matoušek**
Datum narození: **10.12.1959**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Libor Petrů**
Datum narození: **07.08.1966**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Zdeněk Stojan**
Datum narození: **13.08.1952**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Roman Dostálek**
Datum narození: **04.08.1970**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Vrba**
Datum narození: **18.06.1978**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Miroslav Zeman**
Datum narození: **16.06.1966**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Bobek**
Datum narození: **19.02.1969**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Tomáš Nossek**
Datum narození: **22.01.1969**

Jméno a příjmení: **Carmen Escribano Guzmán**
Datum narození: **01.03.1961**

Jméno a příjmení: **Ing. Radek Turin**
Datum narození: **31.05.1979**
Občanství:

Česká republika
Jméno a příjmení:
Ing. Karol Bozán
Datum narození:
08.07.1963
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Ing. Anna Králová
Datum narození:
22.07.1967
Občanství:
Česká republika
Jméno a příjmení:
Ing. Viktor Zachariev
Datum narození:
17.06.1951
Občanství:
Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 30.01.2015.

PLNÁ MOC

evid. číslo: RA 603617/14

obchodní společnost
 OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,
 IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
 zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
 a panem Paolo Bee, MBA - členem představenstva

zmocňuje

tímto

ředitele divize 5

pana Ing. Jiřího Kápla

datum narození 15.3.1959, bytem U Stropnice 307, 373 12 Borovany


k zastupování společnosti OHL ŽS, a.s., včetně podepisování, ve věci :


- *jednání a uzavření smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků, s objednatelem (zadavatelem) - Statutární město Karlovy Vary (označení investora), se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, IČ: 00 25 46 57, jejímž předmětem je realizace stavby « **Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty** » (označení stavby - projektu), jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli (zadavateli) souvisejícím s realizací předmětu smlouvy, včetně změn smlouvy o dílo a úkonů OHL ŽS, a.s., jako dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, týkajících se změn smlouvy o dílo,*
- *uzavření smlouvy o dílo, včetně jejích dodatků, se subdodavatelem na výše uvedenou stavbu, nebo smlouvy kupní či jiné obdobné smlouvy s dodavatelem materiálu nebo služeb v souvislosti s realizací stavby, a to až do výše 120.000.000,- Kč.*

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, nebo vtištěné obchodní firmě společnosti připojí jmenovaný zaměstnanec svůj podpis s označením funkce a jména.

Toto zmocnění má platnost do 31. 12. 2015

V Brně, dne 22. 5. 2014


 Ing. Michal Štefl,
 předseda představenstva
 OHL ŽS, a.s.


 Paolo Bee, MBA
 člen představenstva
 OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám :

podpis:

datum:

28. 05. 2014

Opis

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 695

Datum zápisu: 1. dubna 1992

Spisová značka: B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 463 42 796

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: provozování drážní dopravy
provozování dráhy-vlečky
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu:
- drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů
- kabelová vedení s optickými vlákny
distribuce elektřiny
hornická činnost v rozsahu podle ust. § 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činností uvedeným v § 2 a 3 ě) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v

hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny

obchod s elektřinou

provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu:

- zařízení elektrická:

- a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah,
- b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
- c) trakční napájecí a spínací stanice,
- d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
- e) elektrická zařízení drážních vozidel,
- f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
- g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
- h) zkušební elektrických zařízení drah

- Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny.

- Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

truhlářství, podlahářství

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

zámečnictví, nástrojářství

obráběčství

projektová činnost ve výstavbě

výkon zeměměřických činností

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pokryvačství, tesařství

zednictví

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

klempířství a oprava karoserií

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou -li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

izolatérství

opravy silničních vozidel

provádění trhacích prací

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

vedení účetnictví, vedení daňové evidence

malířství, lakýrnictví a natěračství

Vodoinstalatérství, topenářství

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva, přičemž alespoň jeden z nich musí být vždy předseda nebo jeden z místopředsedů.

Statutární orgán - představenstvo: **předseda představenstva:**
Ing. MICHAL ŠTEFL, dat. nar. 18. května 1956
Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
den vzniku funkce: 1. června 2011
den vzniku členství: 1. června 2011

člen představenstva:
Carmen Escribano Guzmán, dat. nar. 1. března 1961
Madrid, Avenida de America 58 , Španělské království
den vzniku členství: 20. dubna 2012

1.místopředseda představenstva:
Manuel Viciano Pedrosa, dat. nar. 17. května 1957
Alicante, Calle Churruca 12 PO2 C, 03003 , Španělské království
den vzniku funkce: 15. listopadu 2011
den vzniku členství: 1. listopadu 2009

člen představenstva:
Javier Luis Rodríguez del Val, dat. nar. 4. února 1950
Madrid, C.Nuria 80
Španělské království
den vzniku členství: 14. listopadu 2011

člen představenstva:
Ing. Tomáš Nossek, dat. nar. 22. ledna 1969
Brno, Habrová 353/1, PSČ 644 00
den vzniku členství: 1. června 2012

člen představenstva:
JOSEF REZEK, dat. nar. 23. prosince 1952
Hosov 43, 586 01 Jihlava
den vzniku členství: 1. května 2013

člen představenstva:
PAOLO BEE, dat. nar. 27. dubna 1964
Schodová 243/22, Černá Pole, 602 00 Brno
den vzniku členství: 29. dubna 2014

Dozorčí rada: **předseda dozorčí rady:**
FRANCISCO MARÍN ANDRÉS, dat. nar. 24. září 1942
28023 La Florida Madrid, Avda.Provincias Vascongadas N.5

Španělské království
den vzniku funkce: 30. července 2013
den vzniku členství: 21. června 2013

člen dozorčí rady:

Ignacio Martinez Esteban, dat. nar. 3. srpna 1964
Madrid, Padre Damían 5-28036 , Španělské království
den vzniku členství: 6. dubna 2011

člen dozorčí rady:

Arturo Agulló Jaramillo, dat. nar. 17. prosince 1962
Madrid, c/Nuria 91, 3° B1 , Španělské království
den vzniku členství: 1. října 2011

člen dozorčí rady:

OLDŘICH SOBOL, dat. nar. 21. listopadu 1959
Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov
den vzniku členství: 28. ledna 2013

člen dozorčí rady:

JUAN LORENZO MARTÍN FERNÁNDEZ, dat. nar. 2. února 1952
28046 Torre Espacio, Madrid, Paseo de la Castellana 2590
Španělské království
den vzniku členství: 21. června 2013

člen dozorčí rady:

JAROSLAV ŠANDR, dat. nar. 26. listopadu 1950
č.p. 164, 664 04 Hostějnice
den vzniku členství: 21. října 2013

Akcie: 486 463 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál: 486 463 000,- Kč
Splaceno: 486 463 000,- Kč

Ostatní skutečnosti: Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000

Datum sepsání notářského zápisu a další údaje o zřízení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku.
Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zápisu ze dne 31.3.1992.
Neoddělitelnou součástí tohoto zápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této společnosti.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Počet členů statutárního orgánu: 7

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně

Číslo výpisu: R9074/2014

Vyhotovila: Ludmila Ambrúzová



Požadavek zhotovitele na změnu č.1a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F2. 600 Komunikace. chodníka a zpevněné plochv

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Skutečná vzdálenost odvozu ornice na mezideponii je menší, než je uvedeno v oceněném soupisu prací s výkazem výměr zhotovitelem (v nabídkovém rozpočtu).

Nové řešení:

Tato změna řeší skutečnou vzdálenost odvozu ornice na mezideponii určenou objednatelem.

Zdůvodnění změny:

Skutečná vzdálenost odvozu ornice na mezideponii je menší, než je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se sníží o 233.713,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.1a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

10/11/14

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

18. 11. 2014

Podpis:



Vyjádření objednatele:

se změnou souhlasím

Datum:

15.12.2014

Podpis:



Ocenění ke změně č. 1a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č. 1/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F2. 600 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
25	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odpočet odvozu ornice z obytnového rozpočtu : -2084,00	m3	-2 084,00000	87,50	-182 350,00
26	162701105	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odpočet odvozu ornice z obytnového rozpočtu : -587,00	m3	-587,00000	87,50	-51 362,50
celkem						-233 713 Kč

Celkem včetně DPH 21%

-282 793 Kč

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%

V Karlových Varech dne:

10/11/14

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

10.12.2014

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	01.	Změnový list č.1
R:	01.2	Změnový list č.1a) - odvoz ornice na mezideponii (odpočet)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	16	Přemístění výkopku				-233 712,50
25	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odpočet odvozu ornice z odbytového rozpočtu : -2084,00	m3	-2 084,00000 -2 084,00000	87,50	-182 350,00
26	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odpočet odvozu ornice z odbytového rozpočtu : -587,00	m3	-587,00000 -587,00000	87,50	-51 362,50

Požadavek zhotovitele na změnu č.1b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F2. 600 Komunikace. chodníka a zpevněné plochv

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Skutečná vzdálenost odvozu ornice na mezideponii je menší, než je uvedeno v oceněném soupisu prací s výkazem výměr zhotovitelem (v nabídkovém rozpočtu).
 V ZL 1a) odečteny pol. 25 a 26 z nabídkového rozpočtu.

Nové řešení:

Skutečný objem odvážené ornice je větší ve srovnání s nabídkovým rozpočtem a na menší vzdálenost.

Zdůvodnění změny:

Skutečná vzdálenost odvozu ornice na mezideponii.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.
 Cena díla se navýší o 253.526,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.1b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10/11/14

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 18. 11. 2014

Podpis:



Vyjádření objednatele: *souhlasím*

Datum: 15. 12. 2014

Podpis:



Ocenění ke změně č. 1b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.1/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F2. 600 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m skutečné množství odvezené na mezideponii : 3666	m3	3 666,00000	68	249.288,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m celkové množství ornice: 1738,40+2348=4086,40 m3 : množství ornice odvezené na mezideponii: 3666 m3 : skutečné množství ornice odvezené do 500: : 4086,40-3666 odpočet z odbytového rozpočtu, změna výměry : -264	m3	156,40	27,10	4 238,44
celkem						253 526 Kč

Celkem včetně DPH 21%	306 766 Kč
-----------------------	------------

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 10/11/14


Zhotovitel:

Projektant:

Ocenění ke změně č. 1b)
Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Objednatel: 15. 12. 2014 *Ročar*

TDI: 10. 11. 2014



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	01.	Změnový list č.1
R:	01	Změnový list č.1b) - odvoz ornice na mezideponii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	16	Přemístění výkopku				253 526,44
1	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m skutečné množství odvezené na mezideponii : 3666	m3	3 666,00000	68,00	249 288,00
				3 666,00000		
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m celkové množství ornice: 1738,40+2348=4086,40 m3 :	m3	156,40000	27,10	4 238,44
		množství ornice odvezené na mezideponii: 3666 m3 :				
		skutečné množství ornice odvezené do 500: : 4086,40-3666		420,40000		
		odpočet z odbytového rozpočtu, změna výměry : -264		-264,00000		

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Tato změna řeší počet typové průchodky základy. Dle výkazu výměr bylo oceněno nedostatečné množství průchodek.

Nové řešení:

Navýšení počtu typových průchodek dle skutečného množství prostupů základovou deskou.

Zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace musí být veškeré prostupy základovou deskou těsněny systémovými vodotěsnými chráničkami. Z tohoto důvodu musí být počet průchodek navýšen oproti výkazu výměr, kde toto množství neodpovídá počtu prostupů základovou deskou.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 24.379,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10/11/15

Podpis: [Podpis]

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržena změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12.11.2015

Podpis: [Podpis]

Vyjádření objednatele:

Datum: 7.1.2015

Podpis: [Podpis]

Poznámka: beru na vědomí, že u kódů položek 7104 a 7105³ uváděných v nabídkovém rozpočtu zhotovitele a též uváděných v tomto změnovém listu č.2 jsou rozdílné pořísy a rozdílné jednotkové ceny.

[Podpis]

Ocenění ke změně č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.2/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

Díl: 711 / z důvodu progi vade ✓

smlouva						
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
156	711001	Typová průchodka základy D150 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace: 12 : tvarovky dle rozpočtu z SOD: 6 : navýšení počtu oproti rozpočtu z SOD: 12-6	kus	6,00000	371,60	2 229,60
157	711002	Typová průchodka základy D80 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace: 10 : tvarovky dle rozpočtu z SOD: 2+2+2 : navýšení počtu oproti rozpočtu z SOD: 10-2-2-2	kus	4,00000	330,30	1 321,20
3	711003	Typová průchodka základy D110 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace : 20	kus	20,00000	350,00	7 000,00
4	711004	Typová průchodka základy D125 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace : 23+4	kus	27,00000	371,60	10 033,20
5	711005	Pažnice Typ EF 400 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 2	kus	2,00000	725,00	1 450,00
6	711006	Pažnice Typ EF 200 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 3	kus	3,00000	410,00	1 230,00
7	711007	Pažnice Typ EF 100 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 3	kus	3,00000	371,60	1 114,80
celkem						24 379 Kč

Celkem včetně DPH 21%	29 499 Kč
------------------------------	------------------

smlouva							
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	


Ocenění ke změně č.2

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“


celkem			
--------	--	--	--

Celkem včetně DPH 21%			
-----------------------	--	--	--

V Karlových Varech dne: 10/11/15

Zhotovitel: Projektant: Objednatel: 7. 1. 2015 

TDI: 10. 11. 2015



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	02.	Změnový list č.2
R:	0201...	Průchodky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				24 378,80
156	711001	Typová průchodka základy D150 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace:12 : tvarovky dle rozpočtu z SOD:6 : navýšení počtu oproti rozpočtu z SOD: : 12-6	ks	6,00000	371,60	2 229,60
157	711002	Typová průchodka základy D80 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace:10 : tvarovky dle rozpočtu z SOD:2+2+2 : navýšení počtu oproti rozpočtu z SOD: : 10-2-2-2	ks	4,00000	330,30	1 321,20
3	711003	Typová průchodka základy D110 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace : 20	kus	20,00000	350,00	7 000,00
4	711004	Typová průchodka základy D125 příruby a těsnění systémové tvarovka dle prováděcí dokumentace : 23+4	kus	27,00000	371,60	10 033,20
5	711005	Pažnice Typ EF 400 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 2	kus	2,00000	725,00	1 450,00
6	711006	Pažnice Typ EF 200 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 3	kus	3,00000	410,00	1 230,00
7	711007	Pažnice Typ EF 100 tvarovka dle prováděcí dokumentace : 3	kus	3,00000	371,60	1 114,80

Požadavek zhotovitele na změnu č.4
Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Příloha č. 6

ZL 4

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.20 Konstrukční řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Tato změna řeší dodávku a montáž kotevnic destiček pro osazení prefa sloupů v místě vetknutí. Ve výkazu výměr bylo počítáno s množstvím dle projektové dokumentace. Ve výkresu F1 001-10 004 (základové konstrukce tvar a výztuž) je uvedena celková hmotnost kotevnic desek 1738,93 kg.

Nové řešení:

Po překontrolování výkresu F1 001-10 004 bylo zjištěna chyba v počtu kusů kotevnic desek. V tabulce výpis oceli chybí kotevní desky. Po přepočítání hmotnosti správného počtu bude celková hmotnost 2219,314 kg.

Zdůvodnění změny:

Tato změna řeší chybu v projektové dokumentaci, výkres F1 001-10 004. Vzhledem ke špatně uvedenému počtu kusů kotevnic desek ve výpisu oceli byl proveden výpočet hmotnosti správného počtu kusů. Tento změnový list řeší rozdíl hmotnosti mezi původním množstvím kotevnic desek a správným množstvím.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.
Cena díla se navýší o 24.149,- Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Požadavek zhotovitele na změnu č.4

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum:

10/11/14
[Signature]

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

12.11.2014

Podpis:

[Signature]

Vyjádření objednatele: *souhlasím*

Datum:

15.12.2014

Podpis:

[Signature]

Ocenění ke změně č.4

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.4/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.20 Konstrukční řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	224004	D+M Kotevní destičky ocelové pro osazení prefa sloupů v místě vetknutí správné množství kotevních destiček - v projektové dokumentaci chybné počty kusů : P1:((4*17)+(6*18)+(4*14)+(4*9)+6)*1,57*0,001 : P2:17*31,4*0,001 : P3:18*43,96*0,001 : P4:14*20,096*0,001 : P5:9*17,58*0,001 : P6:1*24,49*0,001 : celkové množství dle projektové dokumentace:2,21931 : množství uvedené v rozpočtu z SOD :1,73900 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : : 2,21931-1,73900	t	0,48031	50 252	24 136,54
2	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m 2,21931-1,739	t	0,48031	26,00	12,49
celkem						24 149 Kč

Celkem včetně DPH 21%

29 220 Kč


smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%

V Karlových Varech dne:

10/11/14

Zhotovitel:



Projektant:




Ocenění ke změně č.4

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Objednatel: 15.12.2014 *Stavatel*

TDI:

10.11.2014


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapísaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	04.	Změnový list č.4
R:	0401	Kotevní destičky pro osazení prefa sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				24 136,54
1	224004	D+M Kotevní destičky ocelové pro osazení prefa sloupů v místě vetknutí správné množství kotevních destiček - v projektové dokumentaci chybné počty kusů : P1:((4*17)+(6*18)+(4*14)+(4*9)+6)*1,57*0,001 : P2:17*31,4*0,001 : P3:18*43,96*0,001 : P4:14*20,096*0,001 : P5:9*17,58*0,001 : P6:1*24,49*0,001 : celkové množství dle projektové dokumentace:2,21931 : množství uvedené v rozpočtu z SOD :1,73900 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD: : 2,21931-1,73900	t	0,48031	50 252,00	24 136,54
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12,49
2	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m 2,21931-1,739	t	0,48031	26,00	12,49
				0,48031		

Požadavek zhotovitele na změnu č.5

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Provedení podkladních vrstev dle projektové dokumentace.

Nové řešení:

Tato změna řeší zpevnění podkladních vrstev.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k nevyhovujícím vlastnostem podloží, je nutné provést sanaci základové spáry.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 456.782,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele na změnu č.5

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10/11/15

Podpis: 

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 18.11.2014

Podpis: 

Vyjádření objednatele: souhlasím

Datum: 15. 7. 1. 2015

Podpis: 

Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.5/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.204 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro sanaci základové spáry : osa 4-6; E-H : 0,80*13,0*11,0 osa 7-8; E-F : 0,80*4,50*4,0 osa 9-12; D-H : 0,80*24,00*17,50 osa 9-11; B-D : 0,80*7,00*11,0	m3	526,40	59,60	31 373,44
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	526,40	8,10	4 263,84
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	526,40	129,20	68 010,88
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km příplatek za další 3 km : 526,40*3	m3	1579,20	6,20	9 791,04
5	174004R	Uložení zeminy na skládku včetně skládkovného	m3	526,40	121,50	63 957,60
6	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I násyp kameniva pro sanaci základové spáry včetně dopravy, uložení a dodávky kameniva: osa 4-6; E-H : 0,80*13,0*11,0 osa 7-8; E-F : 0,80*4,50*4,0 osa 9-12; D-H : 0,80*24,00*17,50 osa 9-11; B-D : 0,80*7,00*11,0	m3	526,40	510,80	268 885,12
7	01	Tlakové zkoušky provedení tlakové zkoušky v místech sanace : 1+2+2+2	ks	7	1 500,00	10 500,00
celkem						456 782 Kč

Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Celkem včetně DPH 21%	552 706 Kč
-----------------------	------------

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 10/11/15

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	05.	Změnový list č.5
R:	0502	Změnový list č.5 - Sanace základové spáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				177 396,80
1	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro sanaci základové spáry : osa 4-6; E-H : 0,80*13,0*11,0 osa 7-8; E-F : 0,80*4,50*4,0 osa 9-12; D-H : 0,80*24,0*17,50 osa 9-11; B-D : 0,80*7,00*11,00	m3	526,40000 114,40000 14,40000 336,00000 61,60000	59,60	31 373,44
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	526,40000	8,10	4 263,84
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	526,40000	129,20	68 010,88
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km příplatek za další 3 km : 526,40*3	m3	1 579,20000 1 579,20000	6,20	9 791,04
5	174004R	Uložení zeminy na skládku včetně skládkovného	m3	526,40000	121,50	63 957,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				268 885,12
6	631571004	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I násyp kameniva pro sanaci základové spáry včetně dopravy, uložení, hutnění a dodávky kameniva : osa 4-6; E-H : 0,80*13,0*11,0 osa 7-8; E-F : 0,80*4,50*4,0 osa 9-12; D-H : 0,80*24,0*17,50 osa 9-11; B-D : 0,80*7,00*11,00	m3	526,40000 114,40000 14,40000 336,00000 61,60000	510,80	268 885,12
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				10 500,00
7	01	Tlakové zkoušky provedení tlakové zkoušky v místech sanace : 1+2+2+2	ks	7,00000 7,00000	1 500,00	10 500,00

Datum	Denní záznamy stavby
29. 8. 2014	<p>POČASÍ: + 10°C - 16°C, OBLAČNO PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰-18⁰⁰ hod PRACOVNÍCI: LB 5, SKU 2, BRUSPOC 2 STROJE: TAHOVÝ BAGR 2X, NAKLADNÍ AUTO 2X, VIBRAČNÍ DESKA 500kg 1X, KALOVÉ ČERPADLO 1X POSTUP PRÁCE: ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU, SEJTUTÍ VÝKOPU NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, DÁSTP A HŘÍVĚNÍ DOLETU KANALIZAČNÍCH ZACÍKŮ VČ. KANALIZAČNÍ LÉČATEL, ODVOZ VÝKOPU NA DEPOXII, HOVĚZÍ ŽELENKOVÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ</p>
30. 8. 2014	<p>POČASÍ: + 10°C - 16°C, JASNO PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰-16⁰⁰ hod PRACOVNÍCI: LB 4 STROJE: TAHOVÝ BAGR 2X, NAKLADNÍ AUTO 2X, POSTUP PRÁCE: SEJTUTÍ VÝKOPU NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, ODVOZ VÝKOPU NA DEPOXII</p>
1. 9. 2014	<p>Geologický deník: Na části staveniště, kde je ŽS uvažovaná nebo plánovaná je nutné začít provádět její nakládání kůrkem, minerálními s ušlechtlou kontrolou sítěřnou desku.</p> <p>POKLAD K ŽL Č. 5</p>
1. 9. 2014	<p>POČASÍ: 8°C - 15°C, ZÁHĚNÍ PRACOVNÍ DOBA: 4⁰⁰-18⁰⁰ hod PRACOVNÍCI: LB 5, SKU 3, STROJE: TAHOVÝ BAGR 2, KALOVÉ ČERPADLO 1X, POSTUP PRÁCE: ČERPÁNÍ VODY Z VÝKOPU, SEJTUTÍ VÝKOPU NA ZÁKLADOVOU SPÁRU + HŘÍVĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY VIBRAČNÍ DESKOU PROJEKTA KONTROLA GEOLOGA ZÁKLADŮ ČÁSTI VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS</p>

Datum	Denní záznamy stavby
25.8.2014	ZÁPIS o PRŮBĚHU VEZEB KAMNICE
	DŮS PŮBĚHU PRŮBĚHU KAMNICE STOJA S.1.1 - S.1.20
	STOJA JSOU PŮBĚHY DŮE PD, JS VŮZLO JS ZAGPAT. PŮBĚHU ZOLIST PRŮBĚHU KAMNICE KODL. JS DOBU 12 LOD KAMNICE KAMNICE. VŮZLOJSI K KAMNICE OČOVAT POTRIBI OD KAMNICE ČIKLOSI (PRŮBĚHU NYXU PRŮBĚHU).
26.8.2014	<p>POČASÍ: 10°C - 15°C, ZATAŽENO DĚST</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod</p> <p>PRACOVNÍCI: LB4, RČV5,</p> <p>STROJE: TRAKTOR BAGR IX, PÁSOVÝ BAGR IX NAKLADNÍ AUTO IX, KALOVÉ ČERPADLO IX, POSTUP PRACÍ:</p> <p>ŘEZYKA VÝKOPU XIA ZA KLADOVOU SPÁRKA, ODVĚZ VÝKOPU XIA SKLADEN, OŠTĚNÍ HLAVY PILOT, ZDĚNÍ KAMNICE. SACHTY, SETO SETHX12 KAMNICE. SACHTY, STRACEX12 BETHX11, ZASTI KAMNICE ZA CE, HUTHX11 SITH KAMNICE PRŮBĚHU ČERPAKŮ VODĚ Z VÝKOPU A SACHTY</p>
26.8.2014	<p>PRŮBĚHU KAMNICE</p> <p>geologická kontrola sachty z.s. dle doporučení</p>
	<p>ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM</p> <p>DALŠÍ ODBOROVÉ VŮHLEDY PRŮBĚHU 8.8. a 26.8.14, PRŮBĚHU KONTROLA PRŮBĚHU ZEMNÍCH PRACÍ, FOTODOKUMENTACE ARCHEOLOGICKÝ NEGATIVY Z A ZP. O. P. S. LEON FOTON TILA</p>

Datum	Denní záznamy stavby
22. 8. 2014	<p>geologická kontrola neúnosná místa základové spáry jeou odstraňována a nahrazována kufříným minerálem. Únosnost bude ověřena při číselní desce</p> <p style="color: red; font-size: 2em; text-align: center;">PŘÍKLAD K ZL 2.5</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">Mojz!</p>
20. 8. 2014	<p>Teplota: 11°C - 25°C, oblačno Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ hod Pracovníci: LBZ, SKV 5, ALLSTRUB Stroje: PÁSOVÝ BAZR 1X, VYŠAČKOVÝ PUMP SOVING 1X, Postup práce: BĚŽNÉ POKYBY PRO BETON C18/20, ŽELEZ. PŘE - SÍŤKA NA ZÁKLADOVÉ SPÁRĚ, KONTAKT LEŽATE KANALIZACE, BĚŽNÝ KANAL. PŘÍJET - ZTRACENÉ ŽELEŽ. U H. 150 mm</p> <p>BYLA PROVEDENA KONTROLA ZHODNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY V OSÁCE D-H A 4-9. VÝSLEDKY ZOUŠKY VIZ PŘÍLOŽENÝ PROTOKOL.</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">Mojz!</p>
25. 8. 2014	<p>Teplota: 4°C - Pracovní doba: 4⁰⁰ - Pracovníci: LBZ, SKV 5 Stroje: PÁSOVÝ BAZR 1X, NA KLADNÍ AUTO 16T 1X Postup práce: ŽÁST KANALIZACE, KONTAKT LEŽATE KANALIZACE 1.XIP, ŽELEŽ. KANAL. PŘÍJET, ČERPAKOVÝ SPONNÍ VODY, ŽELEŽNÝ ŽEMNÍK NA ZÁKLADOVÉ SPÁRĚ PRO POKYBY PRO BETON</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">Mojz!</p>


Sanace základové spáry 1. oblast
osa 4-5-6 a F-G-H

Postup prací:

1. vytěžení nesoudržné zeminy v tl. 80cm
2. tl. 60cm nahrazeno netříděným odvalem
3. tl. 20cm tříděný odval
4. protokol č. 304/14 - nevyhovující zkouška
5. protokol č. 305/14 – vyhovující zkouška
6. fotodokumentace

20.10.2014

Nasler Petr

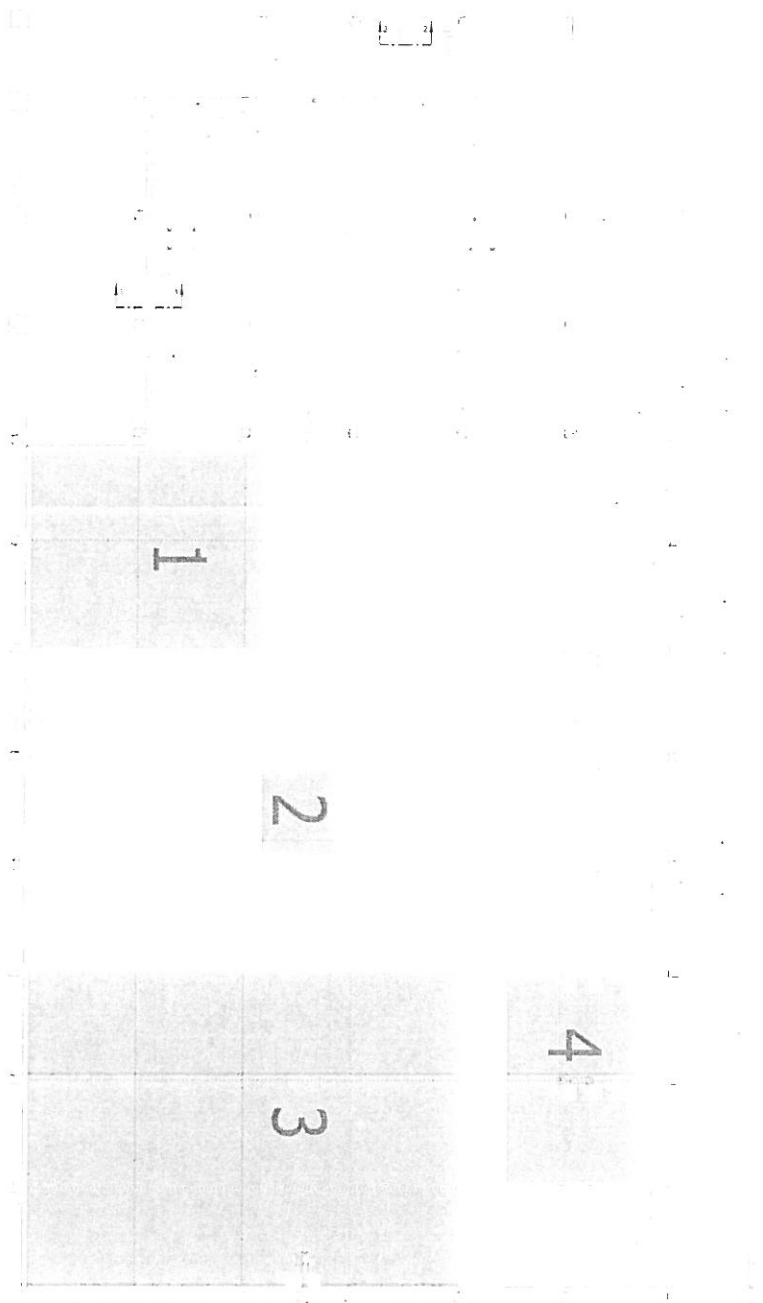


STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 305/14

Objednatel: OHL ŽS a.s. - divize 5
Název stavby: Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
Objekt: hala
Místo zkoušení: v křížení os 5-6 a G-H
Konstrukční vrstva: sanovaná základová spára
Datum a hodina zkoušení: 9.9.2014 13:55
Materiál pod deskou: odval

vzorek č.: 504/14

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,27
0,12	0,83
0,18	1,42
0,25	2,05
0,33	2,65
0,41	3,16
0,50	3,70
0,25	3,61
0,12	3,24
0,00	1,86
0,06	2,18
0,12	2,47
0,18	2,69
0,25	2,96
0,33	3,23
0,41	3,49

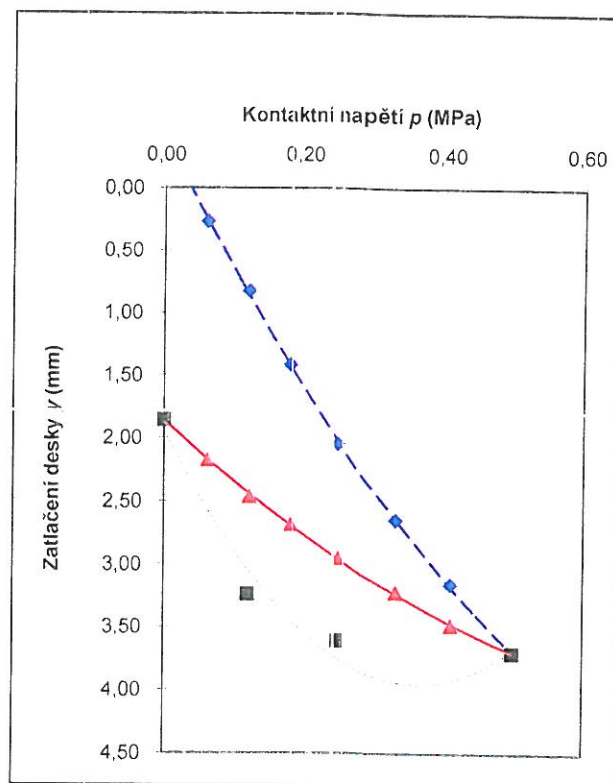

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1. zatěžovací cyklus)	27,50	MPa
$E_{def,2}$ (2. zatěžovací cyklus)	61,61	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)	2,24	

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 9.9.2014



Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Jiří Siničák, TZL - Technická zkušební laboratoř, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 304/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

**Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
hala**

Objekt:

v křížení os 5-6 a G-H

Místo zkoušení:

sanovaná základová spára

Konstrukční vrstva:

Datum a hodina zkoušení:

5.9.2014


13:30

vzorek č.: 503/14

Materiál pod deskou:

odval

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	2,12
0,12	4,46
0,18	7,49
0,25	10,81
0,33	14,19
0,41	17,12
0,50	19,86
0,25	19,45
0,12	17,82
0,00	14,76
0,06	16,44
0,12	17,31
0,18	17,92
0,25	18,44
0,33	19,12
0,41	19,88

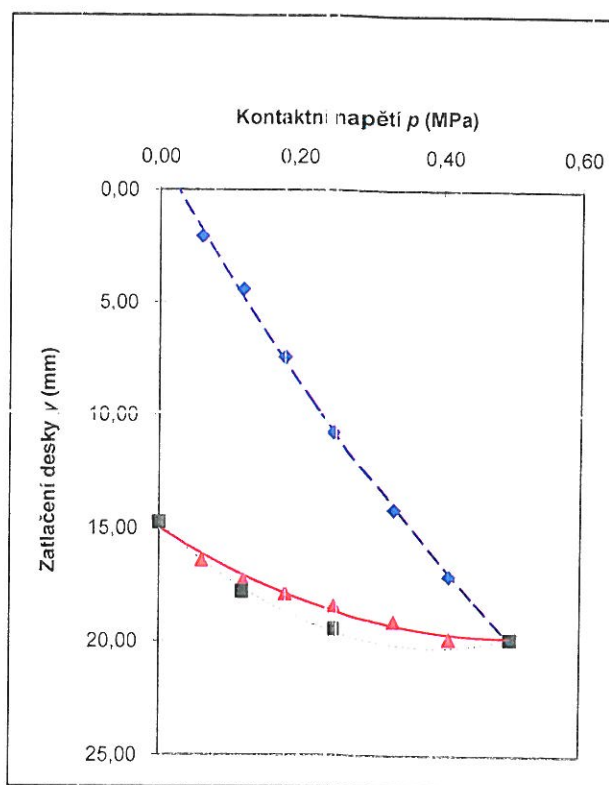

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1. zatěžovací cyklus)	5,27	MPa
$E_{def,2}$ (2. zatěžovací cyklus)	23,52	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)	4,46	

Zkoušel: **Jan Lukáš**

Zpracoval: **Jan Lukáš**

Schválil: **Jan Lukáš**

Protokol vydán dne: **5.9.2014**










Sanace základové spáry 2. oblast
osa 7-8 a E-F

Postup prací:

1. vytěžení nesoudržné zeminy v tl. 80cm
2. tl. 60cm nahrazeno netříděným odvalem
3. tl. 20cm tříděný odval
4. protokol č. 261/14 - nevyhovující zkouška
5. protokol č. 262/14 – vyhovující zkouška
6. fotodokumentace

20.10.2014

Nasler Petr

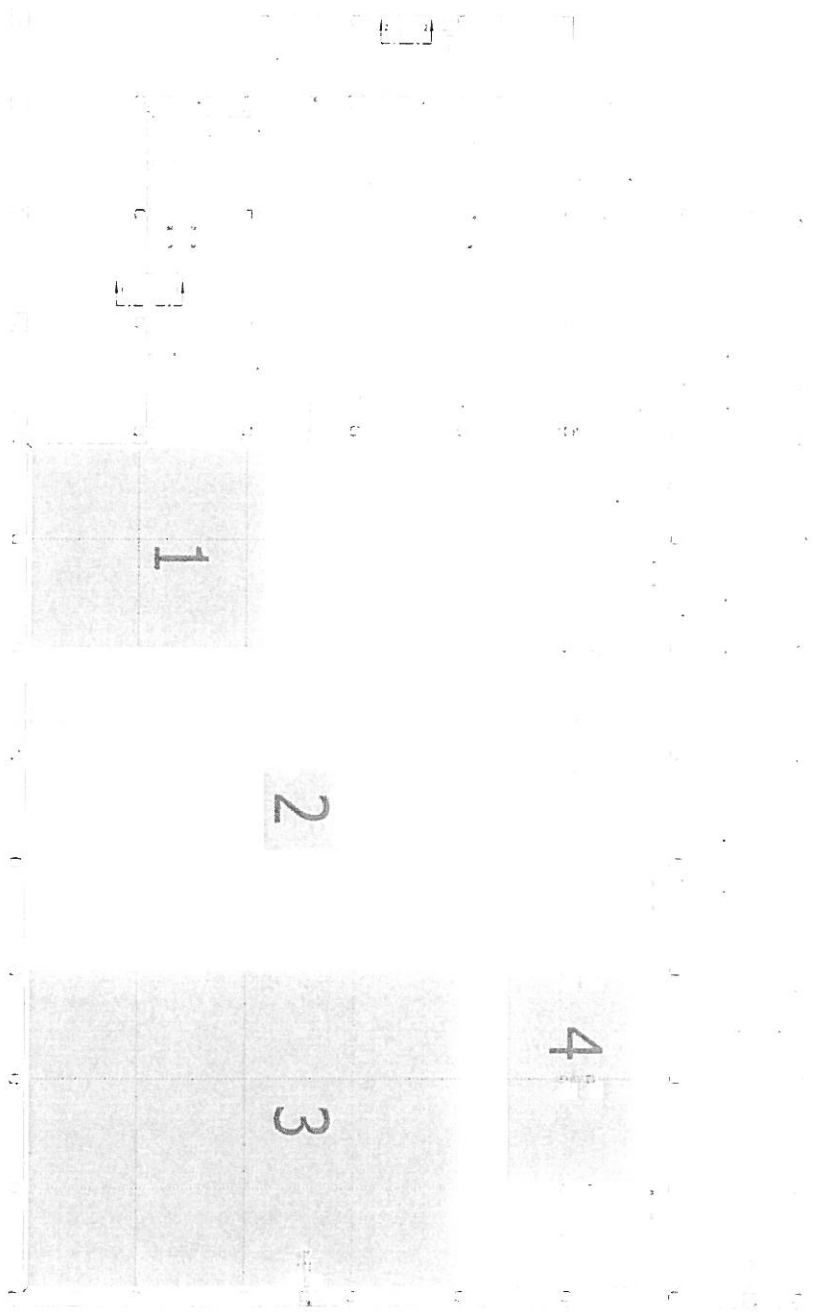


STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
 protokol č.: 261/14

Objednatel: OHL ŽS a.s. - divize 5
Název stavby: Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
Objekt: hala
Místo zkoušení: v křížení os 7-8 a E-F
Konstrukční vrstva: základová spára
Datum a hodina zkoušení: 22.8.2014 16:15
Materiál pod deskou: stávající zemina

vzorek č.: 460/14

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,79
0,12	2,31
0,18	3,57
0,25	4,99
0,33	6,63
0,41	8,20
0,50	9,84
0,25	9,58
0,12	8,00
0,00	5,87
0,06	6,52
0,12	7,14
0,18	7,75
0,25	8,43
0,33	9,03
0,41	9,67

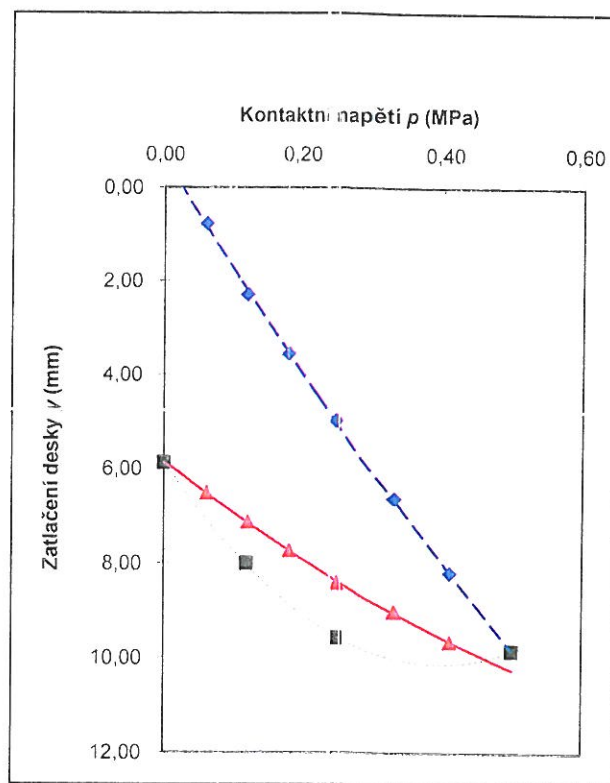

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	10,82	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)	25,57	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,36	

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 25.8.2014



STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 262/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Objekt:

hala

Místo zkoušení:

v křížení os 7-8 a E-F

Konstrukční vrstva:

sanovaná základová spára

Datum a hodina zkoušení:

22.8.2014

16:45

vzorek č.: 461/14


Teplota materiálu(°C):

22°C

Materiál pod deskou:

odval

Kont. napětí	Zatlač.desky
p (MPa)	y (mm)
0,06	0,48
0,12	1,19
0,18	1,87
0,25	2,57
0,33	3,41
0,41	4,19
0,50	5,01
0,25	4,87
0,12	4,29
0,00	2,87
0,06	3,29
0,12	3,61
0,18	3,96
0,25	4,25
0,33	4,63
0,41	4,92

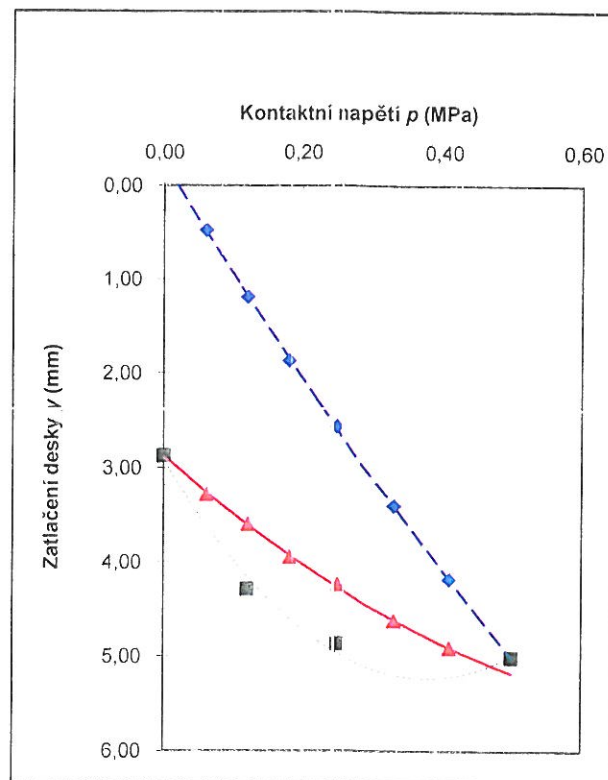

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	21,51	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)	48,94	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,28	

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 25.8.2014



Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Jiří Siničák, TZL - Technická zkušební laboratoř, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198






Sanace základové spáry 3. oblast
osa 9-10-11-12 a E-F-G-H

Postup prací:

1. vytěžení nesoudržné zeminy v tl. 80cm
2. tl. 60cm nahrazeno netříděným odvalem
3. tl. 20cm tříděný odval
4. protokol č. 314/14 , 312/14 - nevyhovující zkouška
5. protokol č. 326/14, 327/14 – vyhovující zkouška
6. fotodokumentace

20.10.2014

Nasler Petr

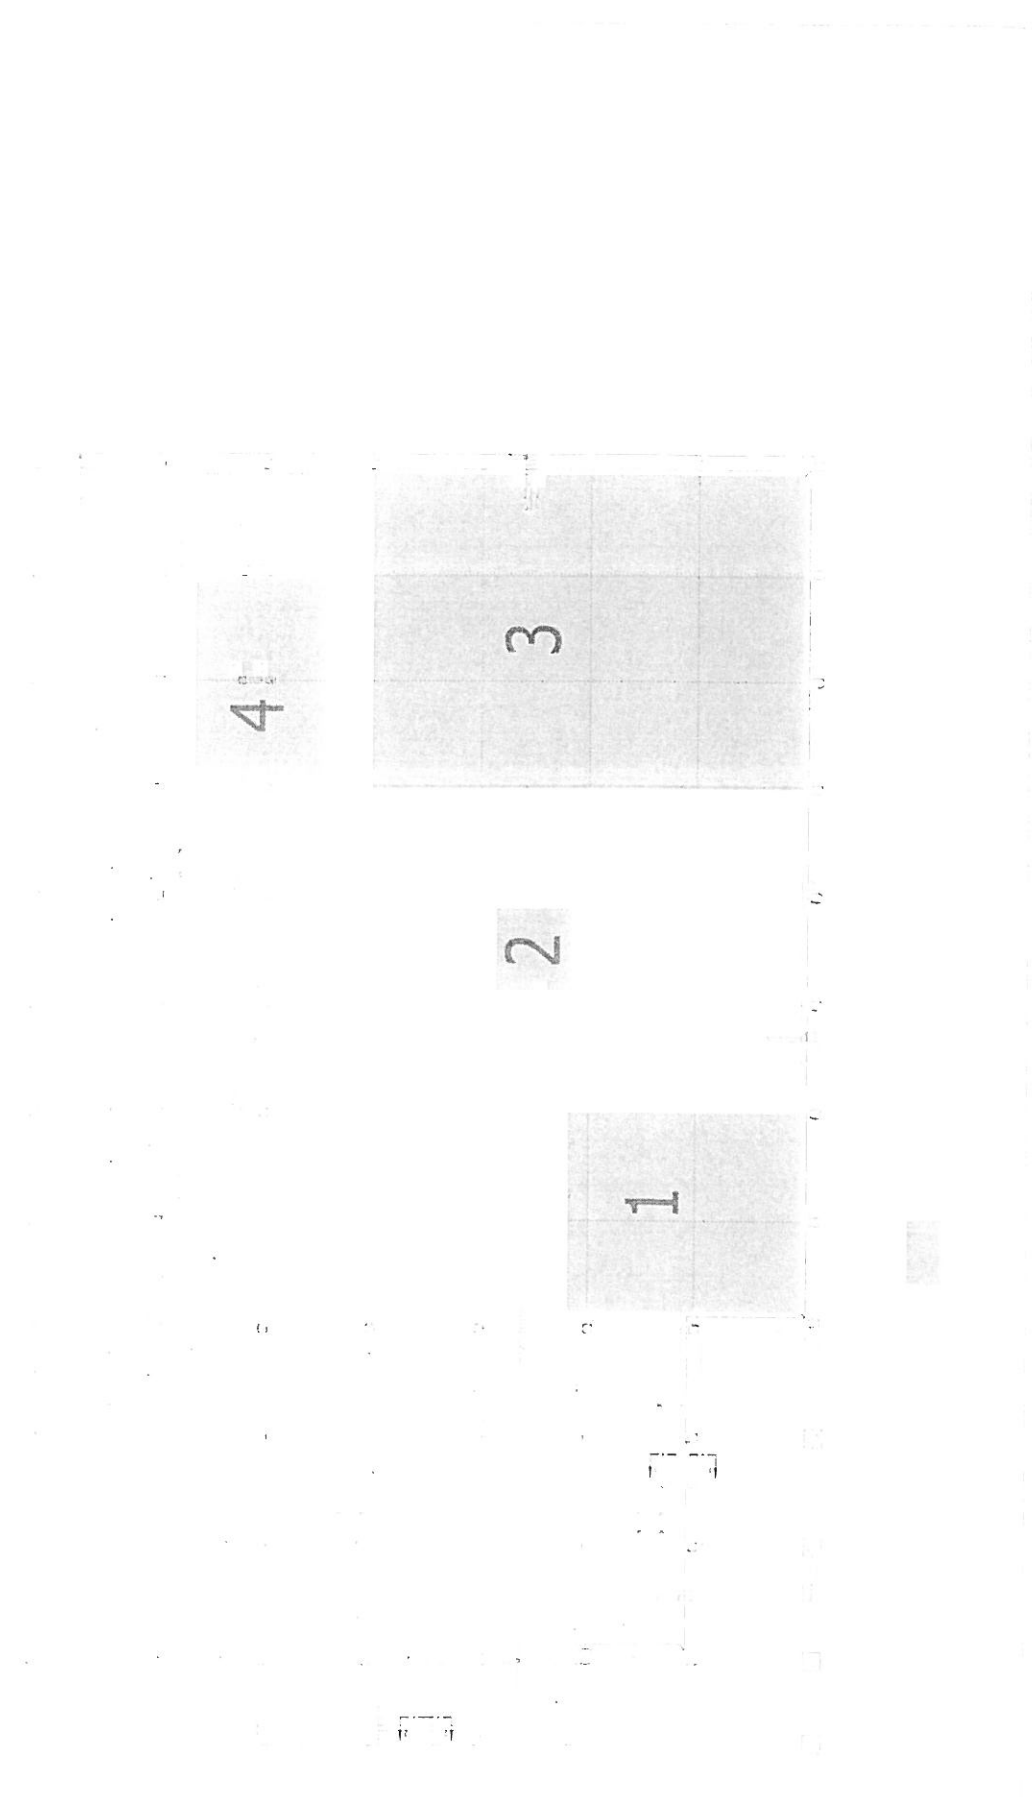

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle CSN 721006 příl. A
protokol č.: 313/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Objekt:

hala

Místo zkoušení:

v křížení os 11-12 a E-F

Konstrukční vrstva:

základová spára

Datum a hodina zkoušení:

9.9.2014


16:10

vzorek č.: 512/14

Materiál pod deskou:

stávající zemina

Kont. napětí <i>p</i> (MPa)	Zatlač.desky <i>y</i> (mm)
0,06	1,79
0,12	4,61
0,18	8,16
0,25	12,94
0,33	18,52
0,41	konec
0,50	
0,25	
0,12	
0,00	
0,06	
0,12	
0,18	
0,25	
0,33	
0,41	

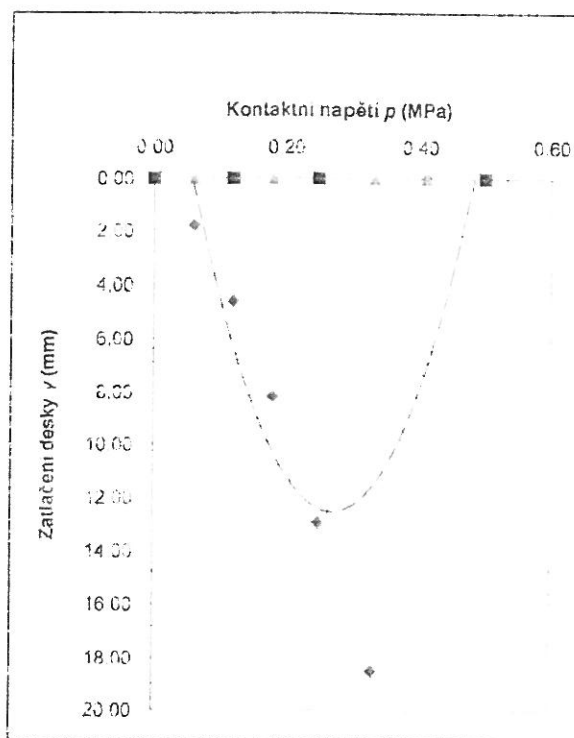

Poznámka Pokles desky je větší než rozsah měřidla - neměřitelné.

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1. zatěžovací cyklus)		MPa
$E_{def,2}$ (2. zatěžovací cyklus)		MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)		

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukaš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 9.9.2014

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 326/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Objekt:

hala

Místo zkoušení:

v křížení os 11-12 a E-F

Konstrukční vrstva:

základová spára

Datum a hodina zkoušení:

16.9.2014


8:20

vzorek č.: 526/14

Materiál pod deskou:

odval

Kont. napětí	Zatlač.desky
p (MPa)	y (mm)
0,06	1,70
0,12	3,39
0,18	4,84
0,25	6,62
0,33	8,31
0,41	10,19
0,50	13,07
0,25	12,69
0,12	12,10
0,00	8,52
0,06	9,96
0,12	10,97
0,18	11,44
0,25	11,98
0,33	12,63
0,41	13,39

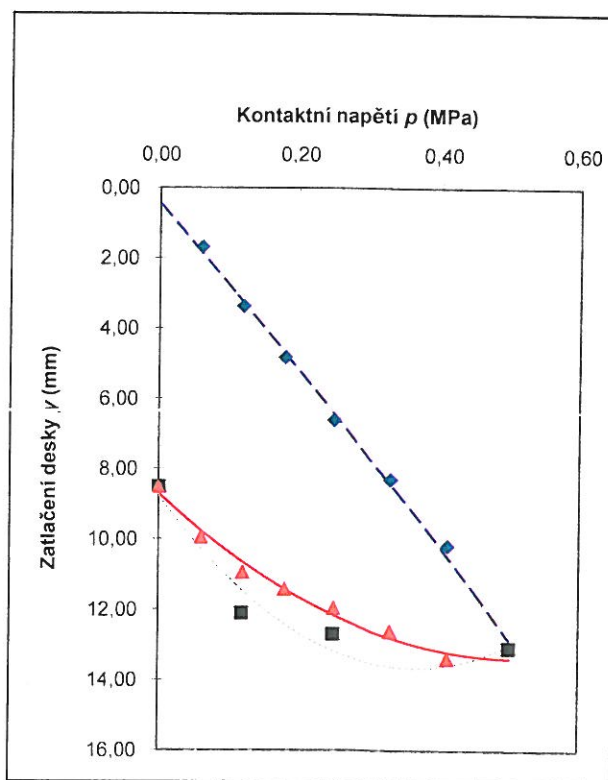

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	9,08	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)	24,24	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	2,67	

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš



Protokol vydán dne: 16.9.2014

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Jiří Siničák, TZL - Technická zkušební laboratoř, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 312/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - hala pro míčové sporty

Objekt:

hala

Místo zkoušení:

v křížení os 11-12 a G-H

Konstrukční vrstva:

základová spára

Datum a hodina zkoušení:

9.9.2014


15:50

vzorek č.: 511/14

Material pod deskou:

stávající zemina

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	1,29
0,12	3,76
0,18	6,49
0,25	9,80
0,33	14,36
0,41	19,07
0,50	konec
0,25	
0,12	
0,00	
0,06	
0,12	
0,18	
0,25	
0,33	
0,41	

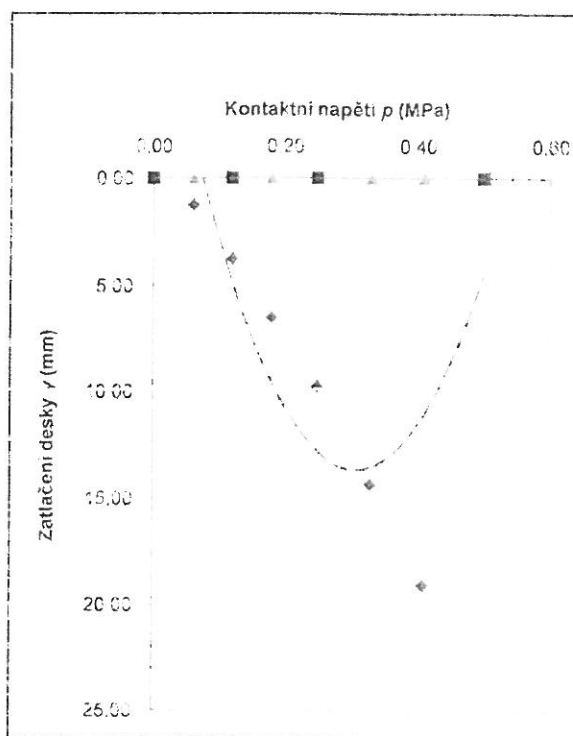

Poznámka. Pokles desky je větší než rozsah měřidla - neměřitelné.

výsledky zkoušky		
$E_{def 1}$ (1. zatěžovací cyklus)		MPa
$E_{def 2}$ (2. zatěžovací cyklus)		MPa
$E_{def 2} / E_{def 1}$ (poměr)		

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval:

Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne:

9.9.2014

Tento protokol násmi byl bez souhlasu laboratore kopirovan jinak než celj

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

Jiří Simečák, TZL - Technická zkušební laboratoř, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 72 1005 příl. A
 protokol č.: 327/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
 hala

Objekt:

v křížení os 11-12 a G-H
 sanovaná základová spára

Místo zkoušení:

Konstrukční část:

Účel a povaha zkoušení:


16.9.2014 8:45

vzorek č. 527/14

Statutární představitel:

odval

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač. desky y (mm)
0,06	2,02
0,12	3,43
0,18	4,68
0,25	5,89
0,33	6,92
0,41	8,15
0,50	9,55
0,25	9,19
0,12	8,66
0,00	5,95
0,06	7,35
0,12	7,91
0,18	8,43
0,25	8,79
0,33	9,30
0,41	9,71

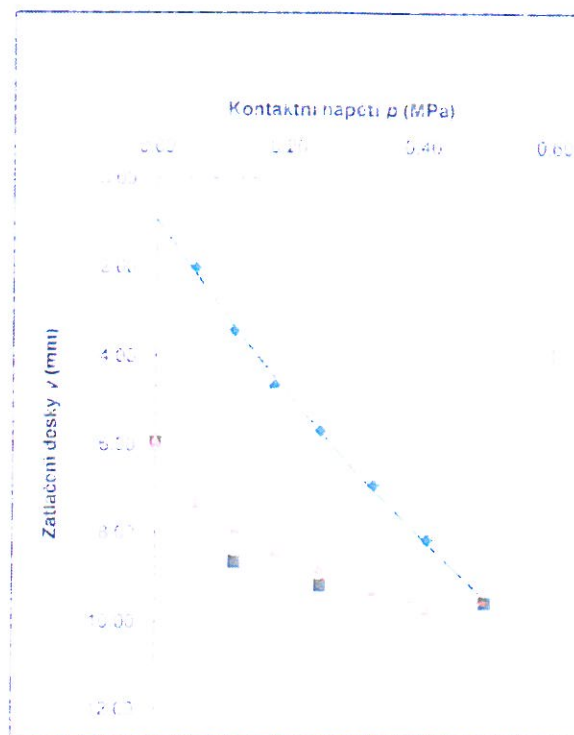

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	13,14	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)		MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)		%


Zkoušel: Jan Lukáš

Posuzoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 16.9.2014



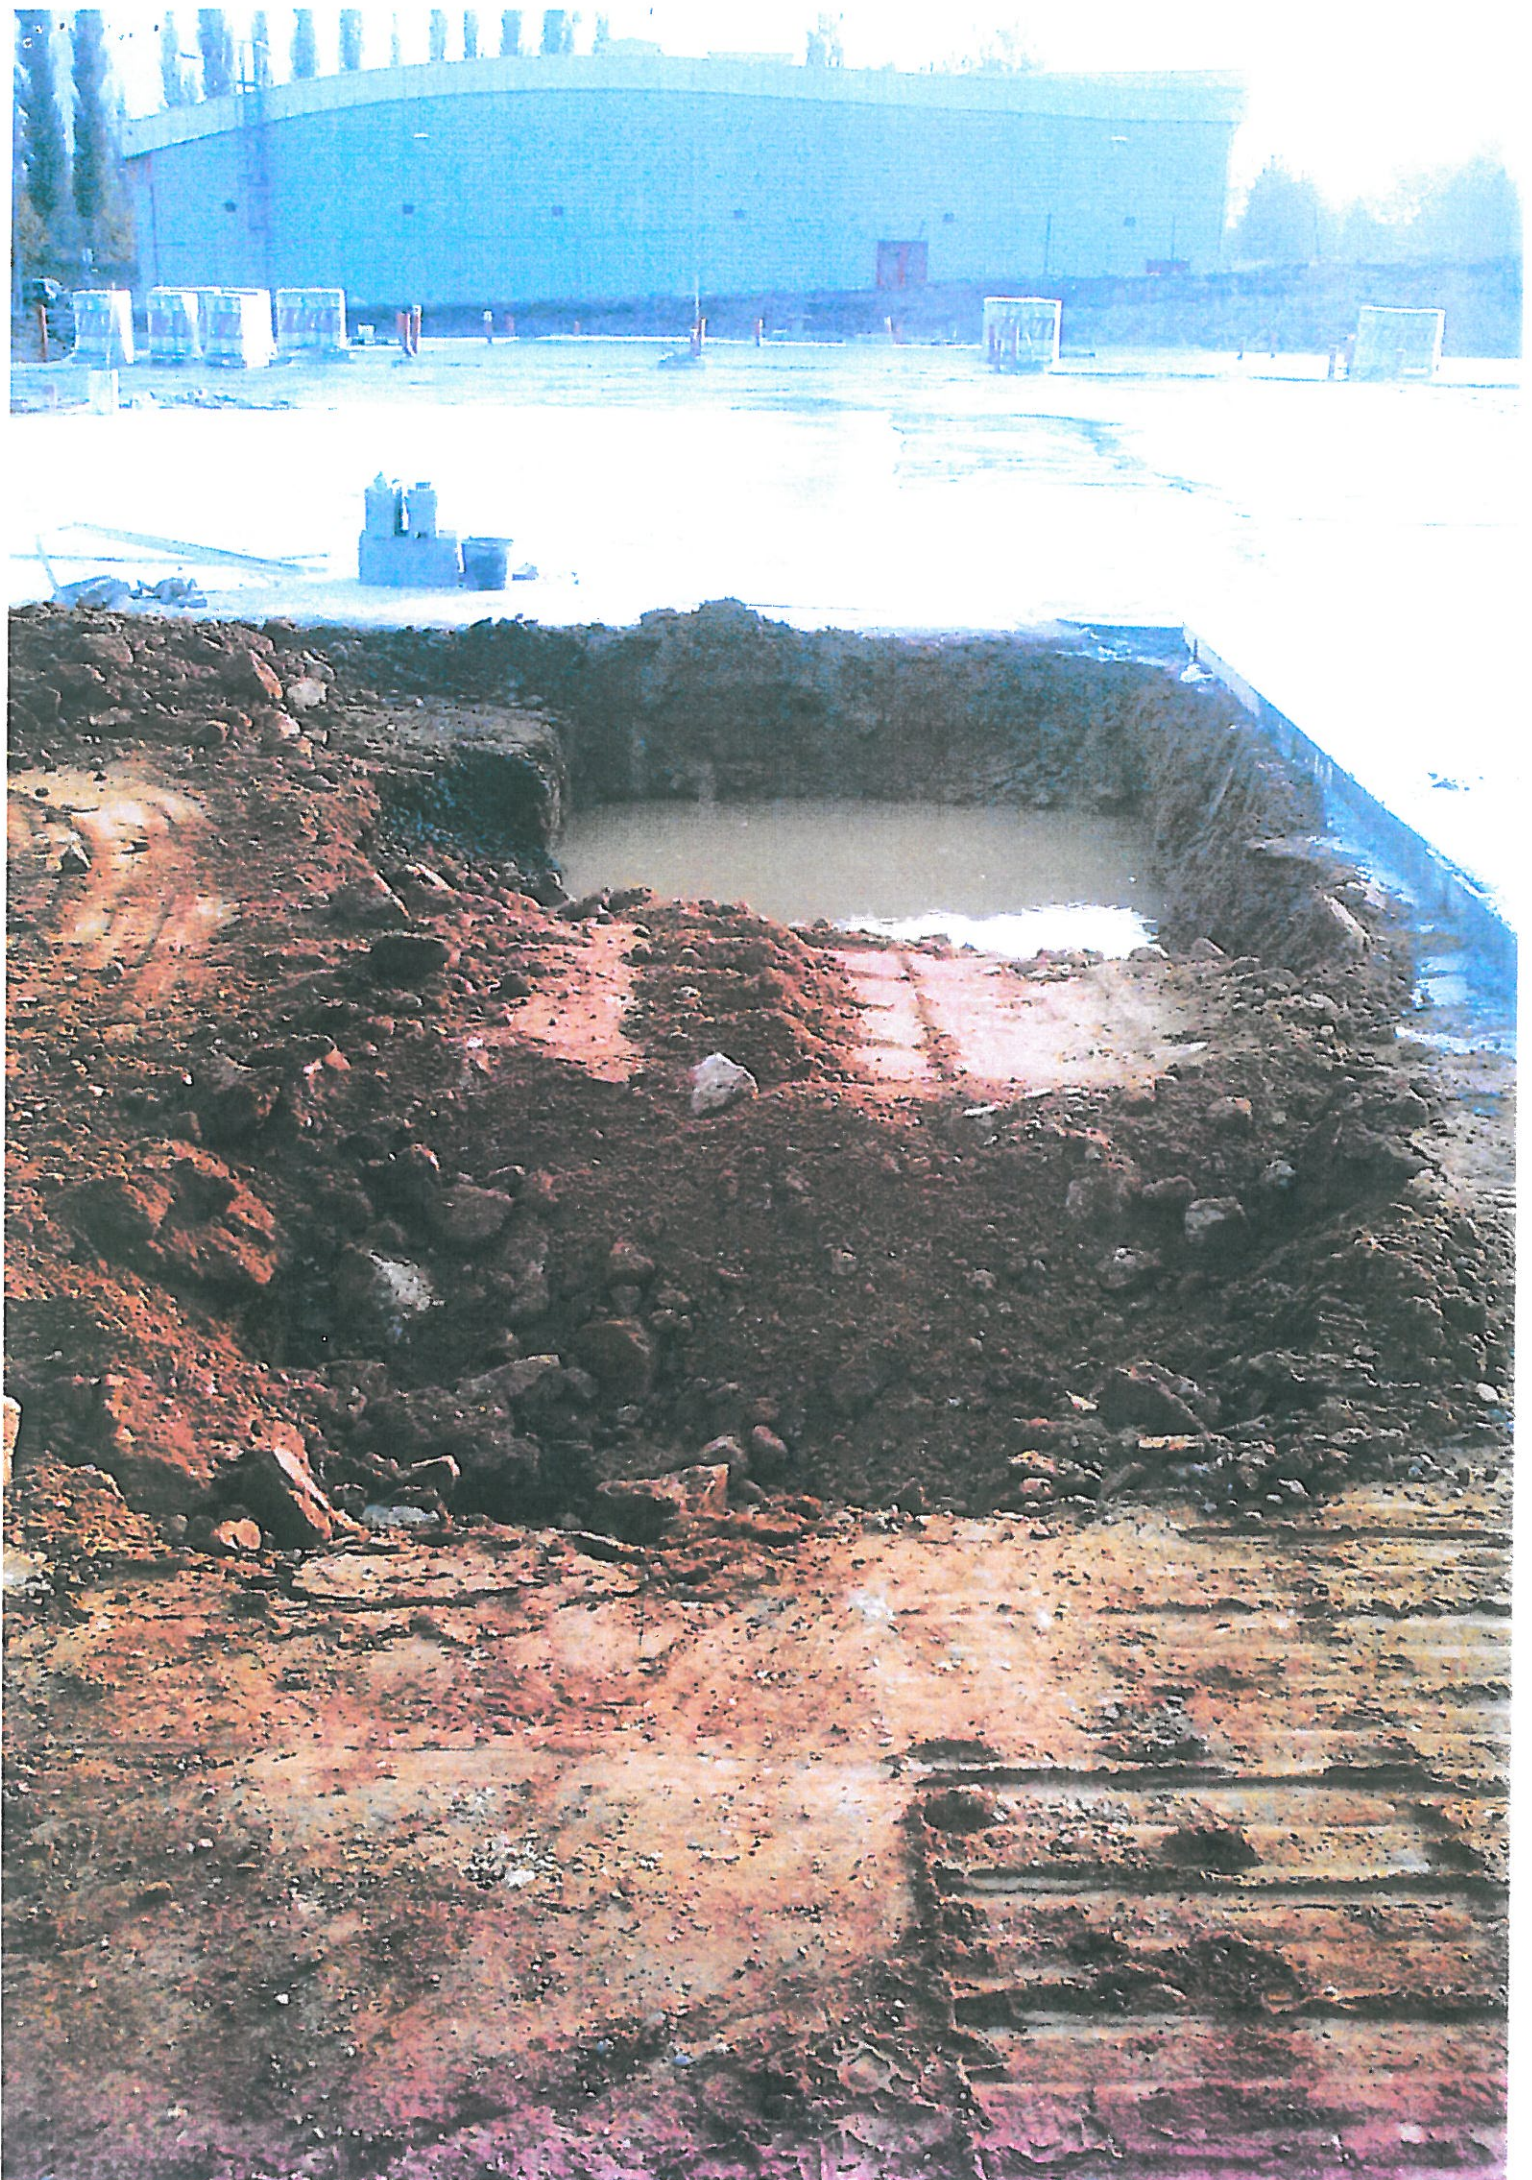



05/09/2014 10:31






Sanace základové spáry 4. oblast
osa 9-10-11 a B-C-D

Postup prací:

1. vytěžení nesoudržné zeminy v tl. 80cm
2. tl. 60cm nahrazeno netříděným odvalem
3. tl. 20cm tříděný odval
4. protokol č. 271/14- nevyhovující zkouška
5. protokol č.311/14- vyhovující zkouška
6. fotodokumentace

20.10.2014

Nasler Petr

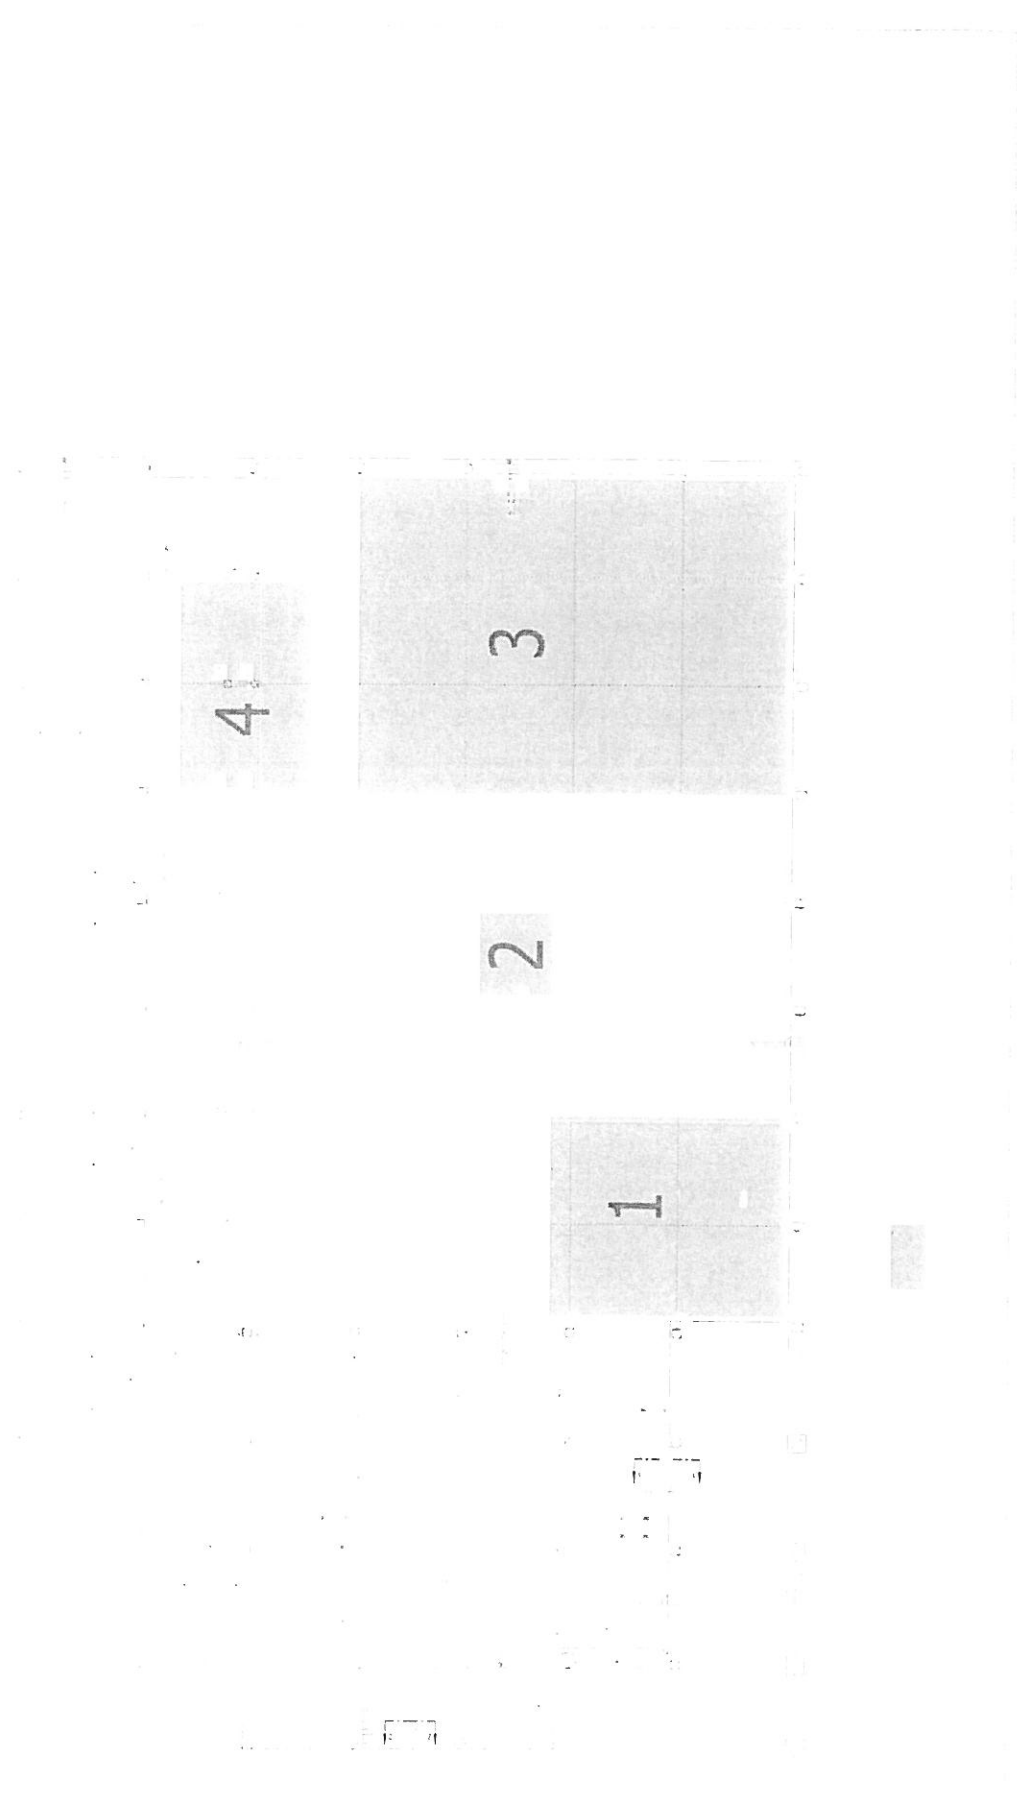

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 271/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
hala

Objekt:

v křížení os 9-10 a B-C

Místo zkoušení:

základová spára

Konstrukční vrstva:

Datum a hodina zkoušení:

28.8.2014


16:20

vzorek č.: 469/14

Materiál pod deskou:

pisčítý jíl

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,87
0,12	1,74
0,18	2,64
0,25	3,69
0,33	4,81
0,41	6,11
0,50	7,58
0,25	7,32
0,12	6,09
0,00	4,32
0,06	4,84
0,12	5,29
0,18	5,74
0,25	6,24
0,33	6,74
0,41	7,19

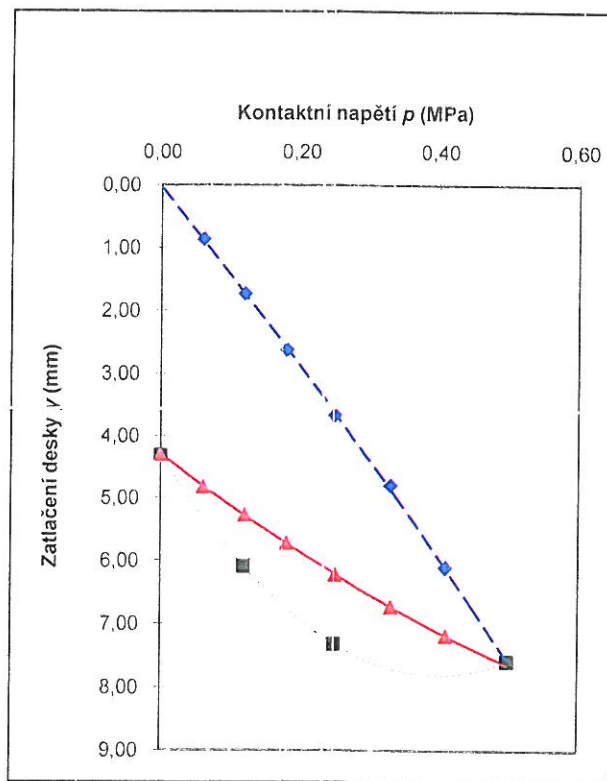

výsledky zkoušky		
$E_{def,1}$ (1. zatěžovací cyklus)	14,98	MPa
$E_{def,2}$ (2. zatěžovací cyklus)	33,88	MPa
$E_{def,2} / E_{def,1}$ (poměr)	2,26	

Zkoušel: Siničák

Zpracoval: Siničák

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 28.8.2014



Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.

Výsledky zkoušky se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty

Jiří Siničák, TZL - Technická zkušební laboratoř, Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 198

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

podle ČSN 721006 příl. A
protokol č.: 311/14

Objednatel:

OHL ŽS a.s. - divize 5

Název stavby:

Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
hala

Objekt:

v křížení os 9-10 a B-C

Místo zkoušení:

Konstrukční vrstva:

sanovaná základová spára

Datum a hodina zkoušení:

9.9.2014


15:25

vzorek č.: 510/14

Materiál pod deskou:

odval

Kont. napětí p (MPa)	Zatlač.desky y (mm)
0,06	0,35
0,12	0,62
0,18	0,94
0,25	1,49
0,33	1,91
0,41	2,64
0,50	3,34
0,25	3,23
0,12	2,97
0,00	1,76
0,06	2,09
0,12	2,41
0,18	2,61
0,25	2,90
0,33	3,12
0,41	3,43

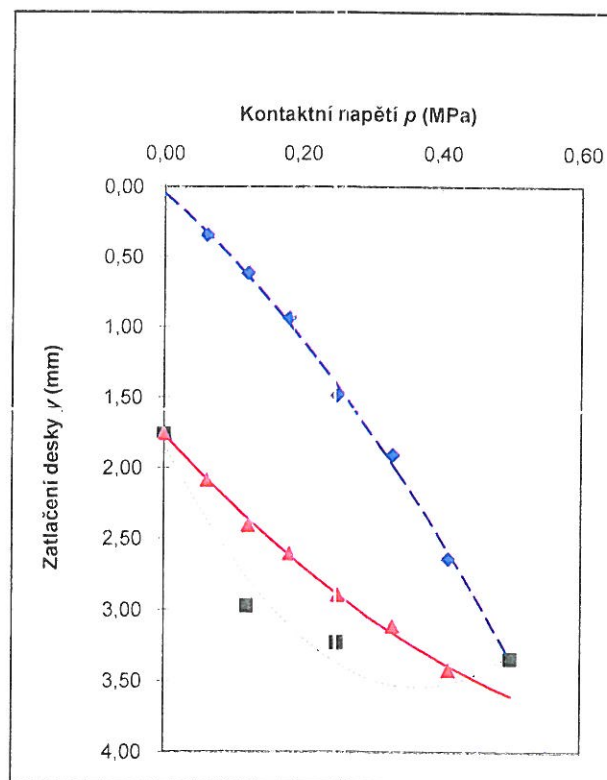

výsledky zkoušky		
$E_{def.1}$ (1. zatěžovací cyklus)	34,10	MPa
$E_{def.2}$ (2. zatěžovací cyklus)	61,35	MPa
$E_{def.2} / E_{def.1}$ (poměr)	1,80	

Zkoušel: Jan Lukáš

Zpracoval: Jan Lukáš

Schválil: Jan Lukáš

Protokol vydán dne: 9.9.2014





Požadavek zhotovitele na změnu č.6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F2.100.100 Odvodnění stavební jámy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Provedení zatrubnění příkopu bez dodatečných úprav.

Nové řešení:

Tato změna řeší úpravu šachty Š01 a přidání odbočovací tvarovky.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku na změnu zatrubnění příkopu, tento změnový list řeší úpravu šachty Š01 a přidání odbočky na potrubí.

Účel: napojení potrubí ze sousední stavby „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary (CZB)“.

Poznámka: ve stavbě CZB nebylo zkoordinováno - projektant uvažoval svedení vod do otevřeného (původního) příkopu; na požadavek SŽDC byl příkop zatrubněn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 11.333,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele na změnu č.6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10/11/17

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

10.11.2017

Podpis:



Vyjádření objednatele: souhlasím

Datum: 15.12.2017

Podpis:



Ocenění ke změně č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.6/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F2.100.100 Odvodnění stavební jámy

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	001	Úprava šachty ŠO1 úprava šachty ŠO1 přidáním odbočky : 1,0	kpl	1,00000	5 140,00	5 140,00
2	P	kanalizační tvarovky plastové PP ULTRA-RIB 2 s plným žebrem, třída SN 8 - odbočky DN 600/200	kus	1,00000	6 192,60	6 192,60
celkem						11 333 Kč

Celkem včetně DPH 21%

13 713 Kč

smlouva							
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

V Karlových Varech dne:

10/11/11

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	06.	Změnový list č.6
R:	0601	Změnový list č.6 - šachta ŠO1, kanalizační odbočka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	827-2	MONTÁŽE POTRUBÍ				11 332,60
1	001	Úprava šachty ŠO1	kpl	1,00000	5 140,00	5 140,00
		úprava šachty ŠO1 přidáním odbočky : 1,0		1,00000		
2	P	kanalizační tvarovky plastové PP ULTRA-RIB 2 s plným žebrem, třída SN 8 - odbočky DN 600/200	kus	1,00000	6 192,60	6 192,60

Požadavek zhotovitele na změnu č.7a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Místnost č. 1.18 byla rozdělena pletivovou zábranou včetně dveří.

Nové řešení:

Tato změna řeší v místnosti č. 1.18 samostatné vstupy pro část ČEZ a část odběratele.
 Pletivová zábrana bez dveří.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku investora byla na základě změny projektové dokumentace provedena úprava v místnosti č. 1.18. V této místnosti byl proveden samostatný vstup pro část ČEZ a část odběratele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se sníží o 5.845,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

10/11/15


Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č.7a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

10/11/17

Podpis:

[Handwritten signature]

Vyjádření objednatele:

souhlasím

Datum:

18.11.2017 15.12.2014

Podpis:

[Handwritten signature]

Ocenění ke změně č. 7a)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.7/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1		Změna místnosti 1.18 a 1.19 - odpočty viz příloha	Kpl	-1	5 845,00	-5 845,00
Celkem						-5 845 Kč

Celkem včetně DPH 21%	-7 072 Kč
-----------------------	-----------

smlouva							
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne:

10/11/14

Zhotovitel:

Dg

Projektant:

[Signature]

Objednatel:

11.12.2014 [Signature]

TDI:

[Signature]

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480


Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	07.	Změnový list č.7
R:	07.	Změna místnosti 1.18 a 1.19 - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-2 823,13
1	311112315	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnic betonem C 16/20 odpočet : -3,38*1,40 -0,90*2,00	m2	-6,53200 -4,73200 -1,80000	432,20	-2 823,13
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-1 326,45
2	612445510	Omitka sádrová jednovrstvá, penetrace, tl. 10 mm odpočet : -3,38*1,40 -0,90*2,0*2	m2	-8,33200 -4,73200 -3,60000	159,20	-1 326,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-1 500,00
3	767011	D+M Pletivová zábrana viz ZV11 odpočet - změna pletivové zábrany : -1,0	ks	-1,00000 -1,00000	1 500,00	-1 500,00
Díl:	784	Malby				-194,97
4	784451271	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m odpočet : -3,38*1,40 -0,90*2,0*2	m2	-8,33200 -4,73200 -3,60000	23,40	-194,97


ZL 7a)

PAŽNICE S PŘÍRUBOU PRO 4xDN200 VE STĚNĚ
BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY.

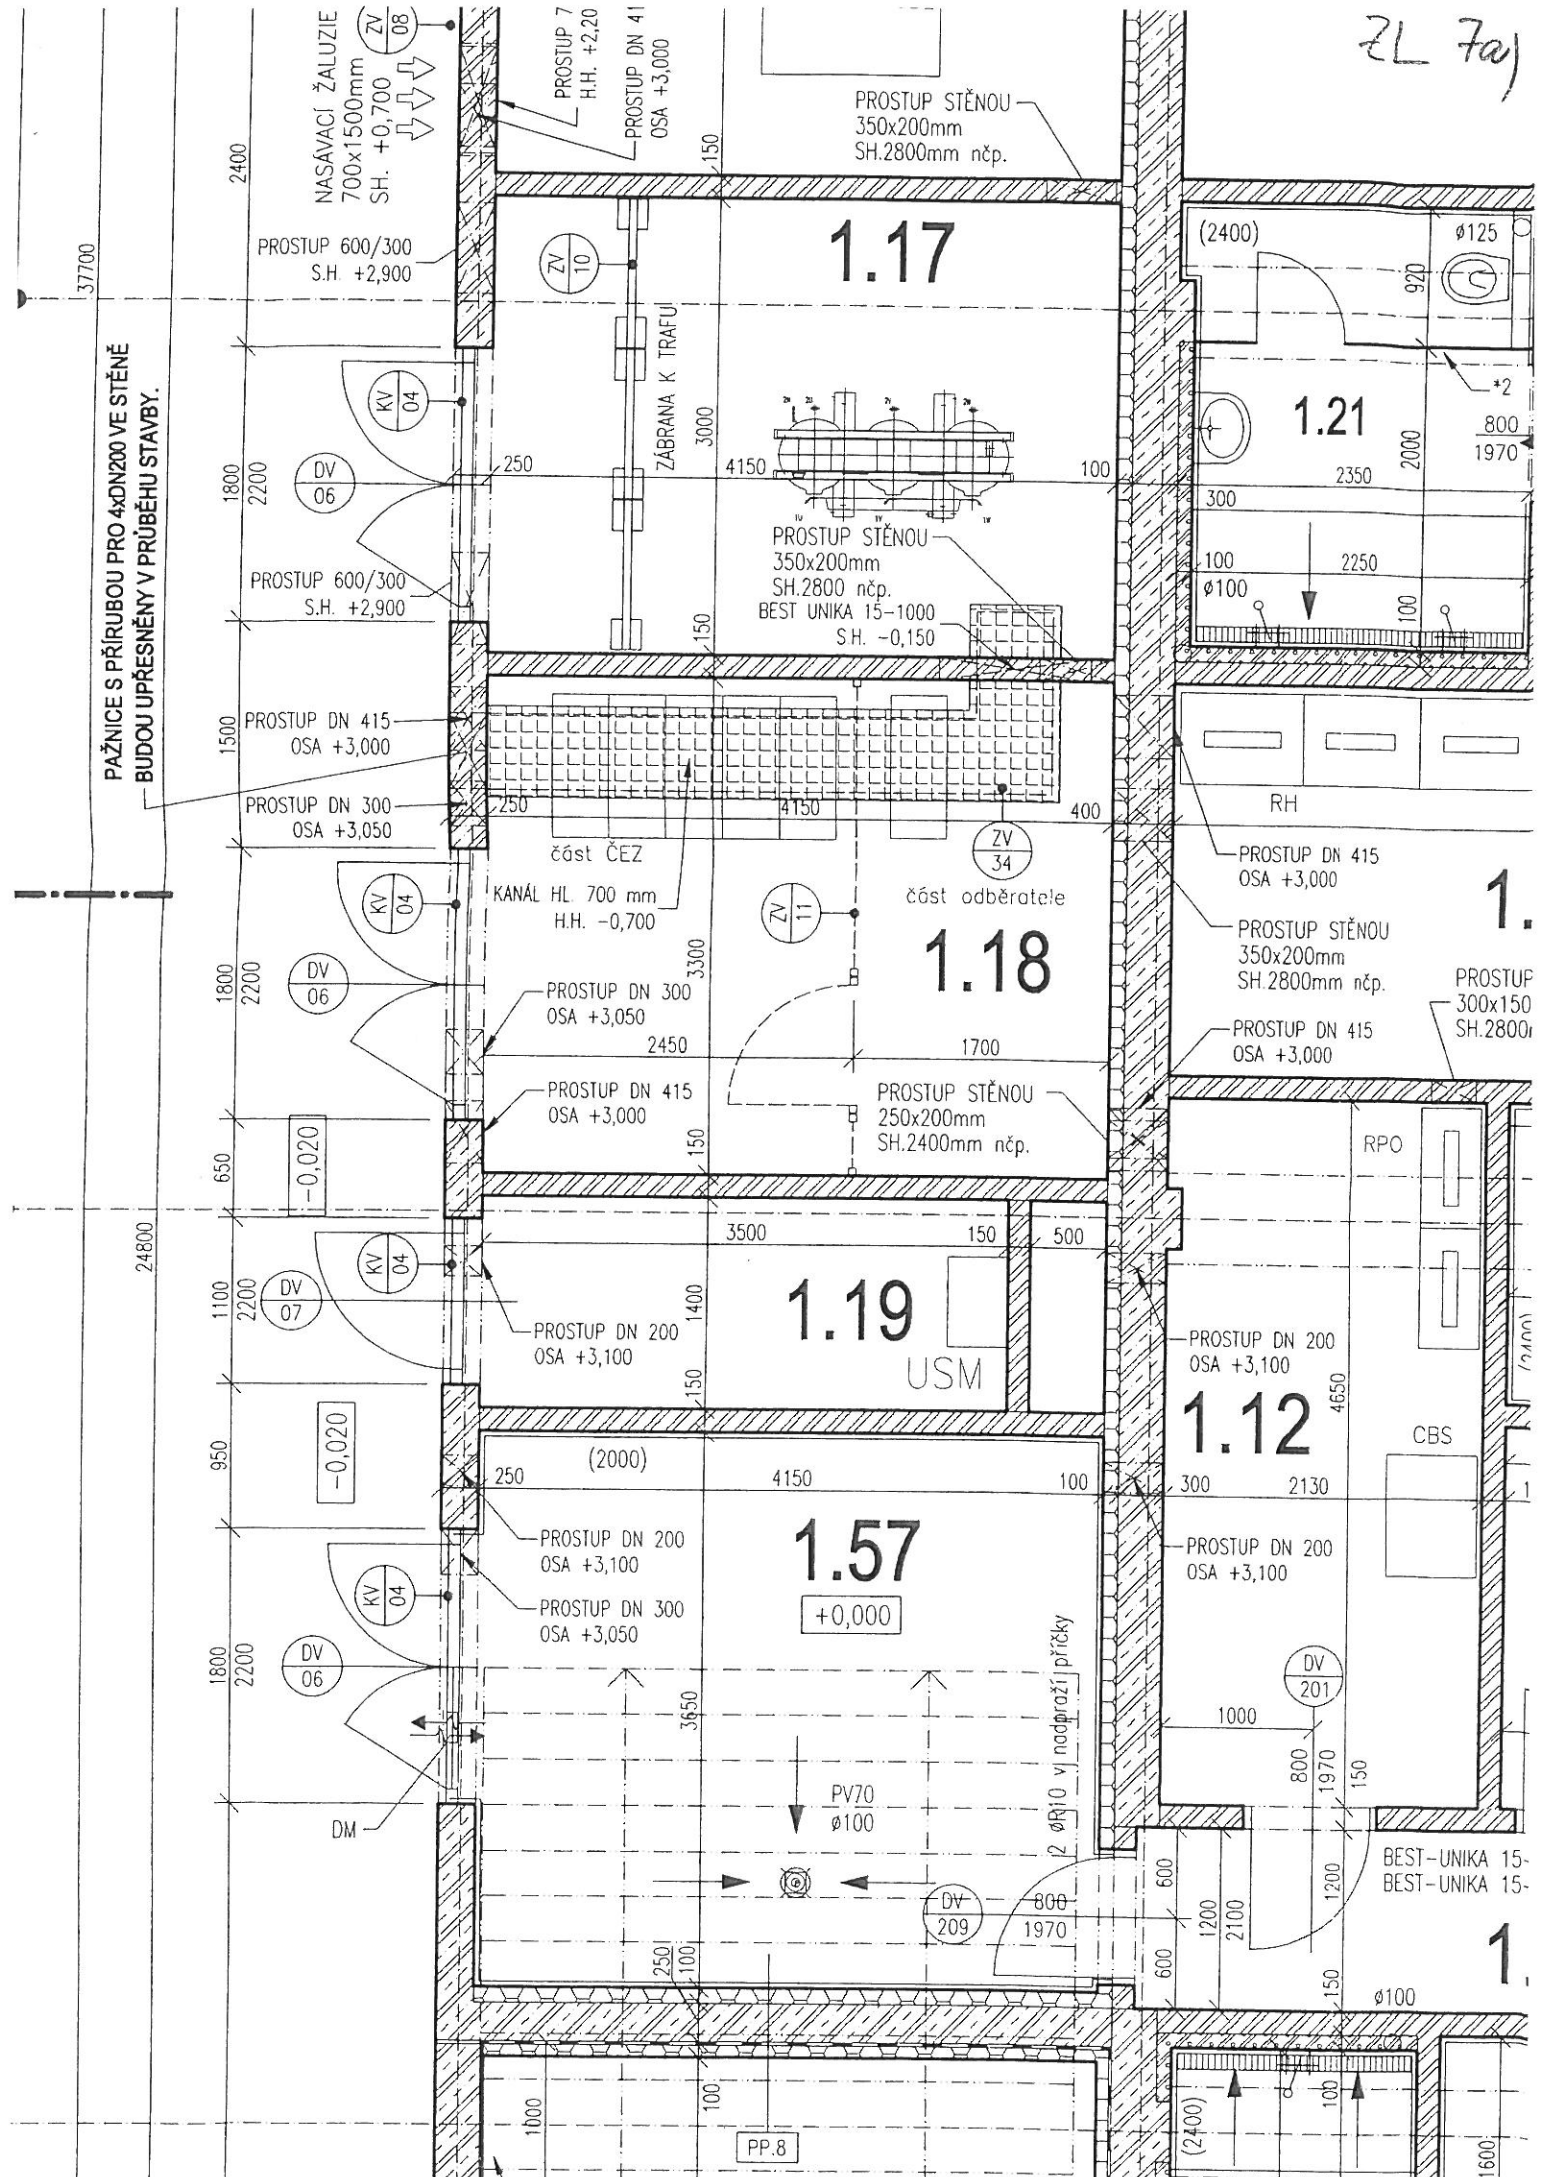

1.

1.

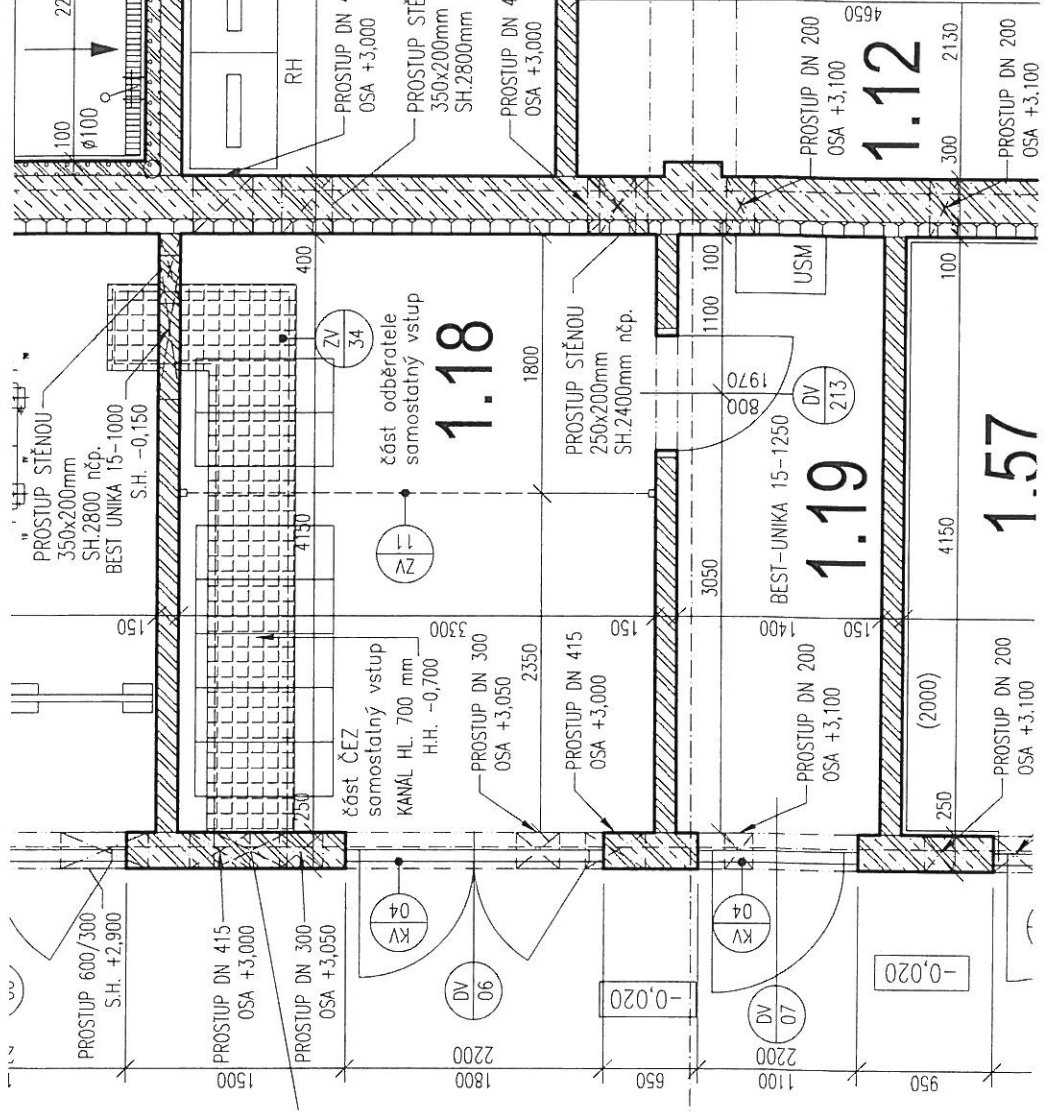

Požadavek zhotovitele na změnu č.7b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Místnost č. 1.18 byla rozdělena pletivovou zábranou včetně dveří.

Nové řešení:

Tato změna řeší v místnosti č. 1.18 samostatné vstupy pro část ČEZ a část odběratele. Pletivová zábrana bez dveří.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku investora byla na základě změny projektové dokumentace provedena úprava v místnosti č. 1.18. V této místnosti byl proveden samostatný vstup pro část ČEZ a část odběratele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 7.564,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele na změnu č.7b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 10/11/15

Podpis: DG

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis: 

Vyjádření objednatele: souhlasím

Datum: 15. 12. 2014

Podpis: 

Ocenění ke změně č. 7b)

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.7/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	317147001	Překlád nenosný U ztrac.bednění 150x250x1200 včetně vylití betonem C16/20	kus	1,00	139,30	139,30
2	641055	D+M Dveře dřevěné vnitřní 1kr 800/1970mm specifikace viz DV213	kus	1,00	7 424,30	7 424,30
celkem						7 564 Kč

Celkem včetně DPH 21%	9 152 Kč
-----------------------	----------

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 10/11/14

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	07.	Změnový list č.7
R:	07.	Změna místnosti 1.18 a 1.19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				139,30
1	317147001	Překlad nenosný U ztrac.bednění 150x250x1200 včetně vylití betonem C16/20	kus	1,00000	139,30	139,30
Díl:	64	Výplně otvorů				7 424,30
2	641055	D+M Dveře dřevěné vnitřní 1kř 800/1970mm specifikace viz DV213	ks	1,00000	7 424,30	7 424,30

