

Krián *cl*

**Město Karlovy Vary**

**a**

**Sdružení Karlovy Vary – Mattoniho nábřeží**

---

**D O D A T E K č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**č. zhotovitele: 1514.1060245MSA**

**č.objednatele:15-00061/2011**

**ze dne 29.12.2011**

---

***KARLOVY VARY 2012***

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 4.5.1992, oddíl B, vložka 1561

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 1.3.1994, oddíl B, vložka 7634,

které spolu uzavřeli sdružení pod názvem Sdružení Karlovy Vary – Mattoniho nábřeží. Jménem sdružení jedná jeho vedoucí účastník, společnost EUROVIA CS, a.s.

Kontaktní adresa sídla sdružení: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary.

Účastníci této smlouvy na straně zhotovitele jsou zastoupeni Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, na základě plné moci od EUROVIA CS, a.s. ze dne 19.3.2012.

EUROVIA CS a.s. je oprávněna zastupovat účastníky sdružení Sdružení Karlovy Vary – Mattoniho nábřeží na základě Smlouvy o sdružení ze dne 21.09.2011.

bankovní spojení: zhotovitel zřídí účet sdružení dle čl. VIII. 3. Smlouvy o sdružení

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ

zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Král, provozně-obchodní náměstek

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. smlouvy zhotovitele: 1514.1060245MSA  
č.objednatele:15-00061/2011**

**ze dne 29.12.2011**

A.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. a 5.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 29.12.2011 dohodly následovně:

1) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, „**KARLOVY VARY-REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ**“ provedl změny č.1-č.8, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 5.1.smlouvy o dílo uzavřené dne 29.12.2012.

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **44.784.390,- Kč (slovy: Čtyřicet čtyři miliónů sedm set osmdesát čtyři tisíc tři sta devadesát korun českých) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 37.320.325,- Kč (slovy: Třicet sedm milionů tři sta dvacet tisíc tři sta dvacet pět korun českých) a DPH 7 464 065,- Kč (slovy: Sedm milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc šedesát pět korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.12.2011 zůstávají beze změny.**

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnové listy č.1-č.8


Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 28.8.2012

Příloha č.3: Plná moc Ing. Zdeňka Nováka


V Karlových Varech, dne 12.9.2012



Město Karlovy Vary  
Jednatel Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.  
Národní 10  
113 19 Praha 1

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 1**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

12.1.2012

Adresa objednatele:  
Město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží

**Popis změny, technického řešení: Změna konstrukce dělicí pásu mezi vozovkou a chodníkem**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní konstrukce dělicího pásu byla tvořena : zámková dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva z drobného kameniva tl. 30 mm, podkladní šterkodrt' tl. 150 mm

**Nové řešení:**

Nová konstrukce dělicího pásu je tvořena : dosypávkou vhodným materiálem tl. 90 mm, ohumusováním (osetím) v tl. 150 mm

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek ze strany investora

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni RDS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 196.989,86 včetně DPH.

# Požadavek zhotovitele na změnu č. 1


Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

## Vyjádření zhotovitele:

Požadavek investora nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 12. 01. 2012

Podpis:



## Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 12. 1. 2012

Podpis:

PRAGOPROJEKT, s.r.o.  
K Právně 1548/16, 147 00 Praha 4  
IČO: 432 72 347, zapsaná v obch.  
Měst. soudu v Praze, odd. B, číslo 134

## Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(71)

18

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.1 ze dne 12.1.2012

název části stavby  
(stavební objekt):K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží

Na základě žádosti objednatele ze dne 12.1.2012 se odsouhlasuje změna : č.1

smlouva						
č.poj.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	17310	Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním	M3	64	155,26	9 936,64
2	18223	Rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,20 m	M2	312	17,04	5 316,48
3	18242	Založení trávníku hydroosevem na ornici	M2	312	26,98	8 417,76
4	18247	Ošetřování trávníků	M2	312	2,13	664,56
5	18351	Chemické odplevelení	M2	312	2,27	708,24
6	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	M3	-48	936,90	-44 971,20
7	574121	Asfaltový beton TR. I tl. 30 mm ACO 8 (ABJ I)	M2	18	263,31	4 739,58
8	574621	Obalované kamenivo TR I tl. do 100 mm ACP 16 + (OK I)	M2	18	331,74	5 971,32
9	582611	Kryty z betonové dlažby se zámkem šedých tl. 60 m do lože z kameniva	M2	-330	469,52	-154 941,60
celkem						-164 158,22
Celkem včetně DPH 20%						-196 989,86

V Karlových Varech dne:

12. 01. 2012

Zhotovitel:

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rybníku 168/10, 141 00 Praha 4  
IČO: 452 72 787, zapsaná u  
Měst. soudu v Praze odd. B, 12/234

Objednatel:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(19)

TDI:

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 2**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

23.2.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
 SO 301 - Dešťová kanalizace**

**Popis změny, technického řešení: Zkrácení nově budované dešťové kanalizace o 12 bm**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původním projektové dokumentaci (DZS) byla kanalizační stoka „D“ vedena v komunikaci, až na KÚ úpravy.

**Nové řešení:**

Po dohodě se správcem stávající kanalizace (VAK a.s.) bylo z důvodu křížení nového plynovodu posunuti trasy kanalizace do chodníku a její zkrácení o 12bm.

**Zdůvodnění změny:**

Po dohodě se správcem stávající kanalizace (VAK a.s.) bylo z důvodu křížení nového plynovodu posunuti trasy kanalizace do chodníku. Při hloubení rýh bylo zjištěn výskyt zemin tř.7. Kanalizace byla zkrácena z důvodu nepřiměřeně vysokých nákladů na odstranění zemin tř.7.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 136 093,75 Kč včetně DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 23. 12. 2012

Podpis:




ELIŠKA VAVRÍKOVÁ  
 ELIŠKA VAVRÍKOVÁ, a.s.  
 Ing. Jaroslav Vavřík, ředitel  
 Příkopská 72, 360 02 Karlovy Vary

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 23. 2. 2012

Podpis:




PRAGOPROJEKT, a.s.  
 K Rybníku 1196/15, 147 50 Praha 4  
 IČO: 452 71 387, zapsán v OR  
 Měst. soud v Praze odd. B, v. 1434

### Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Státní úřad pro stavebnictví  
 Městský úřad Karlovy Vary



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu: 

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.2 ze dne 23.2.2012

název části stavby  
(stavební objekt):K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahoměřino nábřeží,  
SO 301 - Dešťová kanalizace

Na základě žádosti objednatele ze dne 23.2.2012 se odsouhlasuje změna : č. 2

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-64,08	209,00 Kč	-13392,72 Kč
2	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 vč.odvozu a uložení na skládku	M3	-64,08	618,30 Kč	-39620,66 Kč
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-54,72	744,19 Kč	-40722,08 Kč
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,88	902,48 Kč	-2599,14 Kč
5	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-1,44	1 151,01 Kč	-1657,45 Kč
9	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM PP DN300	M	-12	1 180,86 Kč	-14170,32 Kč
20	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	-12	58,65 Kč	-703,80 Kč
21	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	-12	45,44 Kč	-545,28 Kč
celkem						- 113 411,46 Kč


Celkem včetně DPH 20%

- 136 093,75 Kč

V Karlových Varech dne:

23. 02. 2012

Zhotovitel:



Projektant:

PRAGOPROJEKT, s.r.o.  
K Rybníku 1668/1g, 142 00 Praha 4  
IČO: 452 72 337, zapsaná v  
Měst. soudní v Praze odd.č. 152/2006

Objednatel:

TDI:

**Požadavek zhotovitele na změnu č.3**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

22.3.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
 SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží**

**Popis změny, technického řešení: Změna konstrukce chodníku u stávající zidky****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní konstrukce chodníku u stávající zidky byla tvořena : zámková dlažba tl. 60 mm, ložná vrstva z drobného kameniva tl. 30 mm, podkladní šterkodrť tl. 150 mm

**Nové řešení:**

Nová konstrukce chodníku u stávající zidky je tvořena : dosypávkou vhodným materiálem tl. 90 mm, ohumusováním (osetím) v tl. 150 mm

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu havarijního stavu stávající zidky, jejíž oprava nebyla předmětem stavby, byla změněna konstrukce chodníku s ohledem na bezpečnost a záruku za nově vybudovaný chodník.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni RDS.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 8.533,07 včetně DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č.3


Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 22. 03. 2012

Podpis:



EUROVIA s.r.o.  
 K Rybářce 1664/16, 147 04 Rybářka  
 IČO: 471 72 507, zapsaná u  
 Měst. soudu v Praze odd.ř. 01/151/97

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 22. 3. 2012

Podpis:



PRAGOPROJEKT, a.s.  
 K Rybářce 1664/16, 147 04 Rybářka  
 IČO: 471 72 507, zapsaná u  
 Měst. soudu v Praze odd.ř. 01/151/97

### Vyjádření objednatele:

1/4

Datum:

Podpis:

## Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.3 ze dne 22.3.2012

název části stavby  
(stavební objekt):K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží

Na základě žádosti objednatele ze dne 22.3.2012 se odsouhlasuje změna : č. 3

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	18223	Rozprostření ornice ve svahu v tl. do 0,20 m	M2	18,0	17,04	306,72
2	18242	Založení trávníku hydroosevem na ornici	M2	18,0	26,98	485,64
3	18247	Ošetřování trávníků	M2	18,0	2,13	38,34
4	18351	Chemické odplevelení	M2	18,0	2,27	40,86
5	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	M3	-3,06	936,9	-2 866,91
6	582611	Kryty z betonové dlažby se zámkem šedých tl. 60 m do lože z kameniva	M2	-18,0	469,52	-8 451,36
7	91721	Záhonové obruby z betonových obrubníků	M2	10,6	314,7	3 335,82
celkem						-7 110,89
Celkem včetně DPH 20%						-8 533,07

V Karlových Varech dne:

22. 03. 2012

Zhotovitel:

EUROVIA s.r.o.  
K Pražské 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 471 72 387, zapsaná v ORL  
Měst. soudní v Praze: odů. 11, v. 1434

Projektant:

Objednatel:

PRAGOPROJEKT, s.s.  
K Pražské 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 471 72 387, zapsaná v ORL  
Měst. soudní v Praze: odů. 11, v. 1434

TDI:

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 4**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

29.3.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
 301 - Dešťová kanalizace**

**Popis změny, technického řešení: Změna způsobu napojení nové dešťové kanalizace**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původním projektové dokumentaci (DZS) bylo provedeno zaústění nové kanalizace (stoka B a C) do monolitické kanalizace vytvořené na stávajícím odtoku.

**Nové řešení:**

Po dohodě se správcem stávající kanalizace (VAK a.s.) bylo dohodnuto napojení stok B a C nové dešťové kanalizace navrtávkou do původní (stávající) kanalizace při vynechání původně plánované revizní šachty.

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu vysoké hladiny spodní vody (s ohledem na blízkost řeky) nebylo možno provést plánovanou monolitickou revizní šachtu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 20.331,13 včetně DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum:

29. 03. 2012

Podpis:

  
**SUROVIA**  
 Surovia CS, s.r.o.  
 Křižkova 204/II, 280 02 Karlovy Vary  
 IČO: 250 20 123

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

29. 3. 2012

Podpis:

  
**KŘÍDLO**  
 Křídlo, s.r.o.  
 Křižkova 204/II, 280 02 Karlovy Vary  
 IČO: 250 20 123  
 Míst. soudu v ul. Křižkova 204/II, VI/134

### Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

14

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.4 ze dne 29.3.2012

název části stavby  
(stavební objekt):

K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
301 - Dešťová kanalizace

Na základě žádosti objednatele ze dne 29.3.2012 se odsouhlasuje změna : č. 4

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	850545121	Výřez nebo výsek o průměru 300 na potrubí DN 1300	KS	2,0	11 729,18	23 458,36
2	850495121	Výřez nebo výsek o průměru 300 na šachtu DN 1000	KS	2,0	9 144,56	18 289,12
3	721100909	Utěsnění navrtávek do DN 300	KS	4,0	494,66	1 978,64
4	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	1,5	2 862,22	4 293,33
5	894183a	Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN do 1400 mm betonové dno 2mx1m,vč. roznášecí desky	KS	-1,0	64 962,06	-64 962,06
celkem						-16 942,61
Celkem včetně DPH 20%						-20 331,13

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

29. 03. 2012

PRAGOPROJEKT, s.r.o.

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

Právní úřad, 100 00 Praha 10

EUROVIA  
EUROVIA s.r.o.  
Právní úřad, 100 00 Praha 10

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 5**

Projekt: „KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

22.4.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
 SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží**

**Popis změny, technického řešení: Změna způsobu napojení nové dešťové kanalizace**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původním projektové dokumentaci (DZS) bylo počítáno s odfrézováním stávající komunikace v tl. 22cm. A provedení aktivní zóny z nakupovaných materiálů

**Nové řešení:**

Odfrézování komunikace v tloušťce 30-33cm. Částečné použití stávajícího vytěženého materiálu do aktivní zóny.

**Zdůvodnění změny:**

Po kontrole stavby bylo zjištěno, že tloušťka stávajících živičných vrstev je větší než bylo v dokumentaci DZS. Odtěžený materiál byl po kontrole uznán jako částečně vhodný pro zpětné použití. Bylo navrženo odvést materiál na mezideponii, promíchat s štěrkodrtí a přivést zpět.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 51 724,94 Kč včetně DPH.



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 22. 04. 2012

Podpis:

**STRABAG**  
 STRABAG a.s.  
 ŽITĚSKÉ BUDĚJOVICE  
 VRBENSKÁ 3  
 370 06 DEČKA BUDĚJOVICE  
 IČO: 258 22 712  
 ZÁVODNÍ A 12  
 300 05 KARLOVY VARY  
 DIČ: CZ0002011  
 (15)

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 22. 4. 12

Podpis:

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
 K Rýsánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
 IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
 Měst. soudu v Praze odd. B. v. l. 1437

### Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.5 ze dne 22.4.2012

název části stavby  
(stavební objekt):K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží

Na základě žádosti objednatele ze dne

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč.odvozu k recyklaci	M3	173	601,44 Kč	104049,12 Kč
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	282	50,70 Kč	14297,40 Kč
	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	M3	564	85,00 Kč	47940,00 Kč
	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně zlepšených štěrkodrtí	M3	282	93,80 Kč	26451,60 Kč
	122302202	Odkop tř4.do 1000m3	M3	282	160,00 Kč	45120,00 Kč
16	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ vč.nákupu a dovozu	M3	-282	592,54 Kč	-167096,28 Kč
13	12331	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 pouze přeprava a skládkovné	M3	-282	403,78Kč	-113865,96 Kč
Celkem						-43 104,12 Kč

Celkem včetně DPH 20%

-51 724,94 Kč

V Karlových Varech dne:

22-04-2012

Zhotovitel:

**STRABAG**

STRABAG a.s.

PRAŽSKÉ BUDĚJOVICI

VYBENČKA 31

17115 PRAHA BUDĚJOVICE

IČO: 25230000

ZÁVODNÍ 211

KARLOVY VARY

IČO: 25230000

IČO: 25230000

Projektant:

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Rysánci 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Objednatel:

TDI:



20 LET PRO VÁS



**GS-geodetické služby s.r.o.**

Sokolovská 37, 360 05 Karlovy Vary  
IČ:46882821 DIČ:CZ46882821  
Kraj.soud v Plzni, oddíl C,vložka 2599

**PROTOKOL č. 006/2012**

Dne  
bylo na staveništi  
pro  
provedeno  
způsob stabilizace  
počet bodů

25.4.2012  
K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží  
**Strabag a.s.**  
SO 101: kubatura frézování živичné vrstvy v úsecích km 0,48-0,74 a 1,10-1,18

**STRABAG**

V období 1-4/2012 byla zaměřena plocha odfrézovaného stávajícího živичného povrchu v úsecích 1,10-1,18 km a 0,48-0,74 km. Následně byla určena kubatura odfrézovaného materiálu na základě tloušťky frézované vrstvy (viz. obrázky).

Přehled výsledků:

1) úsek 1,10 – 1,18 km

plocha	P = 866 m <sup>2</sup>
kubatura	V = 242,5 m <sup>3</sup>

2) úsek 0,48 – 0,74 km

plocha	P = 2427 m <sup>2</sup>
kubatura	V = 719,5 m <sup>3</sup>

Porovnání kubatury odfrézovaného materiálu s rozpočtem

skutečnost [m <sup>3</sup> ]	962,0
rozpočet [m <sup>3</sup> ]	789,0
rozdíl [m <sup>3</sup> ]	173,0

kancelář Sokolov  
kontakt: ing.Tomáš Honzík  
Svatopluka Čecha 1001  
356 01 Sokolov  
mob.: +420 777656256  
tel.: +420 352624023  
sokolov@geodeticke-sluzby.cz

kancelář Karlovy Vary  
kontakt: ing.Jaromír Pinter  
Sokolovská 37  
360 05 Karlovy Vary  
mob.: +420 602423686  
tel.: +420 353565894  
kvary@geodeticke-sluzby.cz

kancelář Cheb  
kontakt: ing.Josef Kára  
Pisečná 2520/2A  
350 02 Cheb  
mob.: +420 602261582  
tel.: +420 354436201  
cheb@geodeticke-sluzby.cz



Za GS – geodetické služby s.r.o.  
Za Strabag a.s.


Ing. J.Pinter  
P.Hudlický email: petr.hudlicky@strabag.com  
L.Patak


Dne: 25.4.2012  
Dne:

# PLOCHA A KUBATURA FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉ VRSTVY

## úsek 1,10 - 1,18 km



$P = 866\text{m}^2$   
 $V = 242,5\text{m}^3$

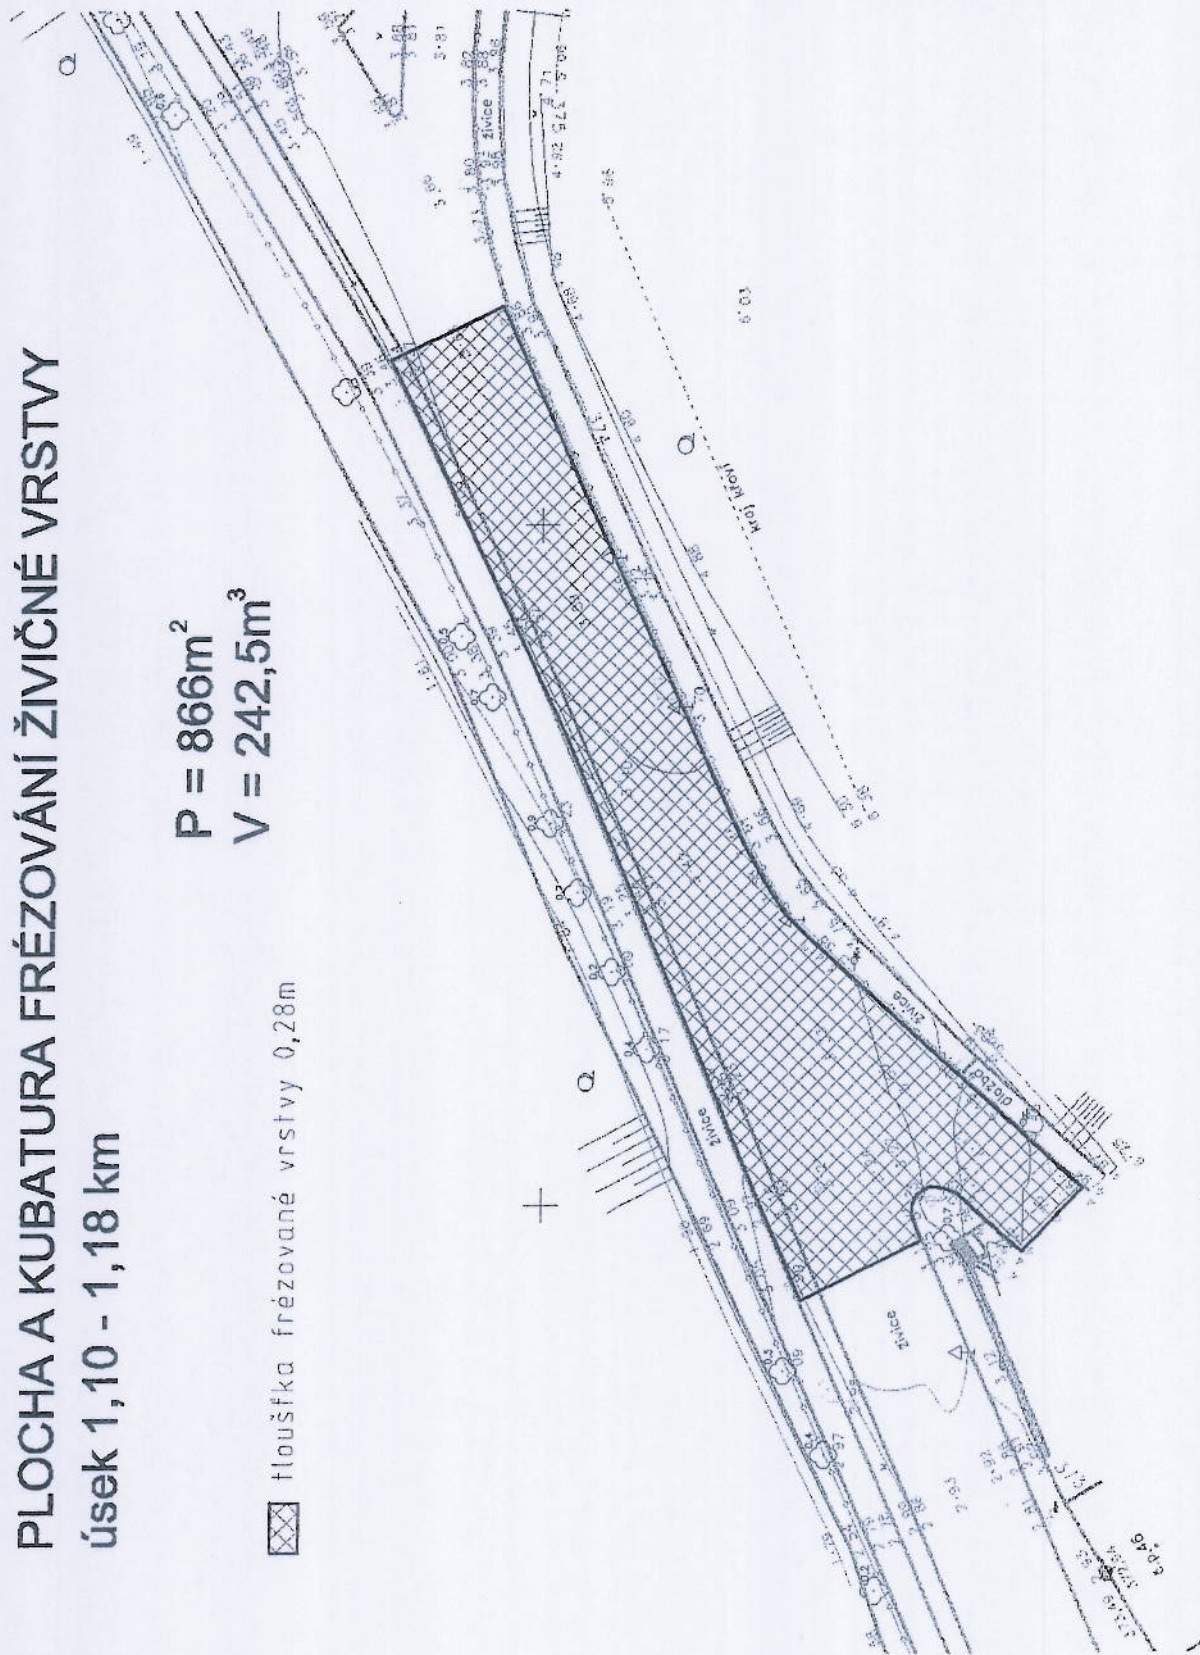 Hlouška frézované vrstvy 0,28m




# PLOCHA A KUBATURA FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉ VRSTVY

úsek 0,48 - 0,74 km

-  Hloušfka frézované vrstvy 0,30m
-  Hloušfka frézované vrstvy 0,15m

$P = 2370\text{m}^2$   
 $V = 710,9\text{m}^3$

$P = 57\text{m}^2$   
 $V = 8,6\text{m}^3$

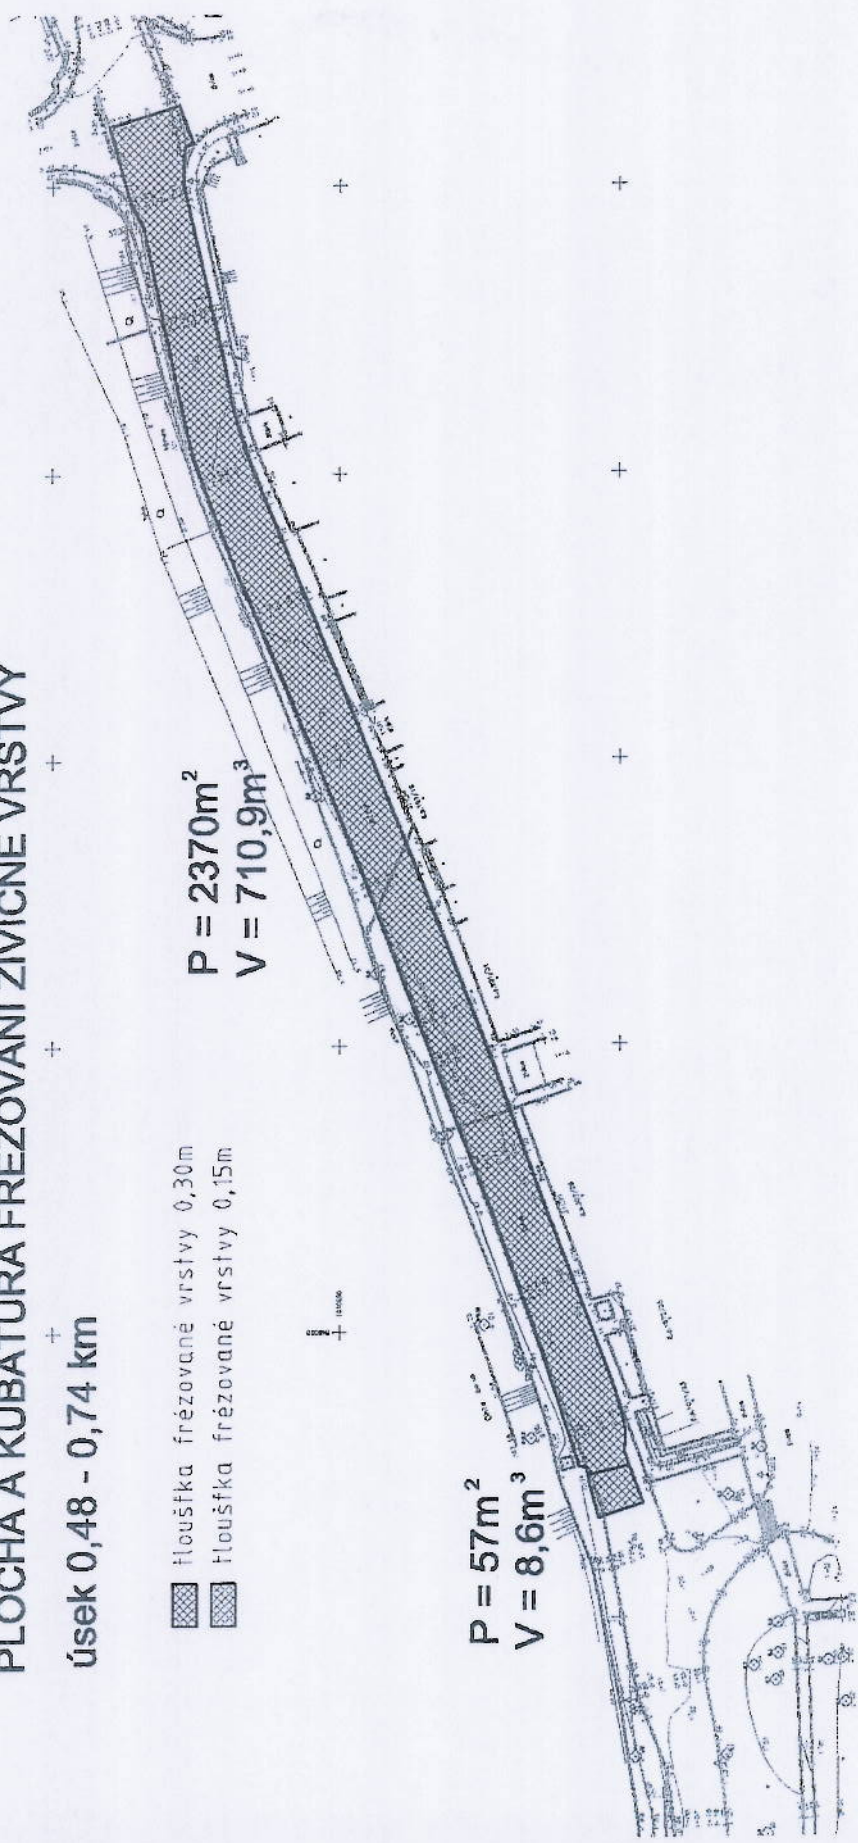



20 LET PRO VÁS



**GS-geodetické služby s.r.o.**

Sokolovská 37, 360 05 Karlovy Vary  
IČ:46882821 DIČ:CZ46882821  
Kraj.soud v Plzni, oddíl C,vložka 2599

**PROTOKOL č. 008/2012**

Dne 25.4.2012  
bylo na staveništi K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží  
pro Strabag a.s.  
provedeno SO 101: kubatura odtěženého materiálu, který zůstane na stavbě (úsek km 0,49 – 0,68)  
způsob stabilizace  
počet bodů




Dne 20.4.2012 byla zaměřena plocha odtěženého materiálu v úseku 0,49 – 0,68 km. Následně byla určena kubatura odtěženého materiálu na základě tloušťky odtěžené vrstvy (viz. obrázek).

Přehled výsledků:

úsek 0,49 – 0,68 km

plocha	P = 940 m <sup>2</sup>
kubatura	V = 282,0 m <sup>3</sup>

### PLOCHA A KUBATURA MATERIÁLU, KTERÝ ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ úsek 0,49 - 0,68 km

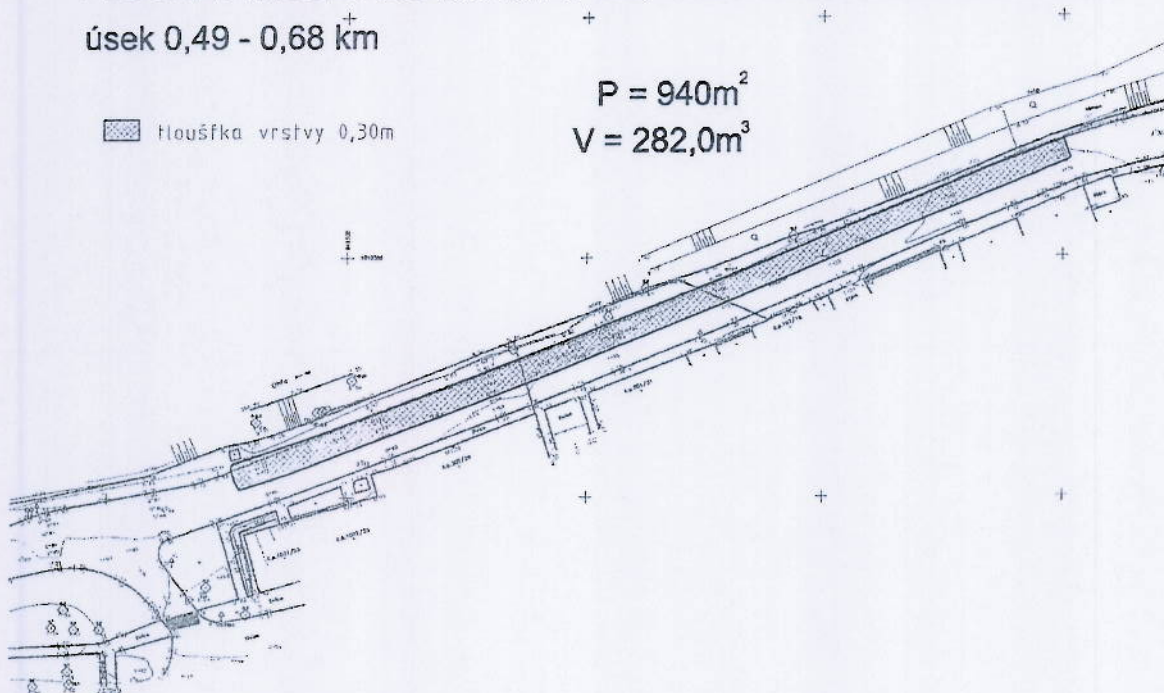

kancelář Sokolov  
kontakt: ing. Tomáš Honzík  
Svatopluka Čecha 1001  
356 01 Sokolov  
mob.: +420 777656256  
tel.: +420 352624023  
sokolov@geodeticke-sluzby.cz

kancelář Karlovy Vary  
kontakt: ing. Jaromír Pinter  
Sokolovská 37  
360 05 Karlovy Vary  
mob.: +420 602423686  
tel.: +420 353565894  
kvary@geodeticke-sluzby.cz

kancelář Cheb  
kontakt: ing. Josef Kára  
Písečná 2520/2A  
350 02 Cheb  
mob.: +420 602261582  
tel.: +420 354436201  
cheb@geodeticke-sluzby.cz



Za GS – geodetické služby s.r.o.  
Za Strabag a.s.

Ing. J. Pinter  
P. Hudlický email: petr.hudlicky@strabag.com  
L. Patak

Dne: 25.4.2012  
Dne:

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

9.5.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
 SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží**

**Popis změny, technického řešení: Změna způsobu opravy stávající kamenné zdi**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V dokumentaci pro stavební povolení bylo uvažováno s opravou opěrné kamenné zdi u vjezdů do dvorů.

**Nové řešení:**

Stěna nebude opravována, ale bude zbourána.

**Zdůvodnění změny:**

Po dohodě s investorem stavby a následné kontrole opěrné zdi bylo konstatováno, že oprava v navržené technologii nelze provést. Změna technologie opravy by byla velice finančně náročná, proto bylo rozhodnuto stěnu neopravovat.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 118 323,50 Kč včetně DPH.

**Požadavek zhotovitele na změnu č. 6**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

**Vyjádření zhotovitele:**

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 9. 05. 2012

Podpis:




**EUROVIA**  
EUROVIA CS, s.r.o.  
Královské náměstí 101/10, 360 02 Karlovy Vary  
IČO: 252 20 123

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 9. 5. 2012

Podpis:




**PRAGOPROJEKT, s.r.o.**  
K Ryšince 1660/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 492 71 347, zapsán v ČR  
Měst. soud v Praze u.s. II., st. 1434

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:







**Požadavek zhotovitele na změnu č. 7**

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

29.6.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,**  
**SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží**

**Popis změny, technického řešení: Změna počtů značek u SDZ**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V původním výkazu výměr bylo uvažováno s počtem 16 kusů dopravních značek a 13 kusů sloupků.

**Nové řešení:**

Množství značek je poníženo na 13 kusů (tj. o 3 méně) a 11 kusů sloupků (tj. o 2 méně).

**Zdůvodnění změny:**

S ohledem na dopracování projektové dokumentace do stupně RDS došlo k upřesnění SDZ a sním i ke změně počtu dopravních značek (sloupků).

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 10.706,80 včetně DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 7


Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 29. 06. 2012

Podpis:




EUROVIA VINCI S.A.S.  
 tel. číslo střední oblast Čechy západ  
 Zasedací místnost  
 Štefánikova 72, 360 02 Karlovy Vary

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.


Datum: 29. 6. 2012

Podpis:



PRAGOPROJEKT, s.r.o.  
 K Měsíčnímu náměstku, 107 54 Praha 6  
 IČO: 452 77 102, zapsán v OR  
 1101, 20.581 v s.taze o.s.č.č. 11.1634

### Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 8

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

Datum vydání požadavku:

29.6.2012

Adresa objednatele:  
**Město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
 (včetně čísla SO):

**K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,**  
**SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží**

**Popis změny, technického řešení: Změna způsobu ochrany nových stromů**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

V dokumentaci pro stavební povolení bylo uvažováno s osazením betonových separátorů okolo kořenů stromů.

**Nové řešení:**

Separátory nebudou dodávány.

**Zdůvodnění změny:**

Po dohodě s investorem stavby a následné kontrole bylo dojednáno, že separátory nebudou osazeny.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna byla zapracována do projektové dokumentace ve stupni DSPS

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Bez vlivu na termín, nebo kvalitu díla. Změnou konstrukce dojde k úspoře ve výši 24 092,26 Kč včetně DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 8


Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

### Vyjádření zhotovitele:

Požadavek zhotovitele nebude mít vliv na kvalitu ani termín dokončení díla.

Datum: 29. 06. 2012

Podpis:




EUROVIA s.r.o.  
 IČO: 250 11 000  
 Sídlo: Karlovy Vary  
 Sedláčková 72, 360 02 Karlovy Vary

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 29.6.2012

Podpis:




PRAGOPROJEKT, s.s.  
 Pohořelá 658/1b, 147 54 Praha 4  
 IČO: 252 33 331, zapsaný OR  
 Sídlo: Praha 4, zapsaný v OR, 14334

### Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Statutární město  
 KARLOVY VARY  
 (71)

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 8

Projekt: „KARLOVY VARY–REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ“

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: 

č.8 ze dne 29.6.2012

název části stavby  
(stavební objekt):K. Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží,  
SO 101 - Rekonstrukce ulice Drahomířino nábřeží

Na základě žádosti objednatele ze dne 29.6.2012 se odsouhlasuje změna : č. 8

č.pol	kód položky	popis	smlouva			celkem Kč
			m.j.	množství	j.cena	
29	27211a	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH dodání a osazení betonového separátoru (kolem stromu)	ks	4	5 019,22 Kč	- 20 076,88 Kč
Celkem						- 20 076,88 Kč

Celkem včetně DPH 20%

- 24 092,26 Kč

V Karlových Varech dne:

29. 06. 2012

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

PRAGOPROJEKT, s.r.o.


K Rašínova 114/16, 247 54 Praha 4

IČO: 257 367 414, DIČ: CZ 257 367 414

1504, e-mail: prah@pragoprojekt.cz, tel: 241 434

Statutární město

KARLOVY VARY


 EUROVIA VINCI  
 EUROVIA CS, s.r.o.  
 IČO: 257 367 414, DIČ: CZ 257 367 414  
 1504, e-mail: prah@pragoprojekt.cz, tel: 241 434

## Výpis z usnesení

**z 23. jednání Rady města Karlovy Vary které se uskutečnilo dne 28.8.2012  
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

### **25. Veřejná zakázka "Karlovy Vary - Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží"**

Rada města

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Sdružením Karlovy Vary - Mattoniho nábřeží, vedoucí účastník sdružení EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, další účastník sdružení STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží", na základě kterého se, z důvodu provedených Změn č.1 - č.8, snižuje cena díla o částku 474.114,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 37.320.325,- Kč bez DPH.



**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje investic

