Harmonogram postupu prací - K.Vary, úpravy nástupních prostor a komunikaci u Tržnice

ID	Režim zadání	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení
1		**PŘÍPRAVNÉ PRÁCE**	**10 dny?**	**31.05. 21**	**13.06. 21**
2		vytyčování stávajících sítí	10 dny	31.05. 21	13.06. 21
3		přípravné stavenbiště	1 den?	04.06. 21	04.06. 21
4		zařízení staveniště	5 dny	07.06. 21	11.06. 21
5		**1.ETAPA STAVBY**	**75 dny**	**08.06. 21**	**21.09. 21**
6		osazení dopravního značení - DIO	5 dny	08.06. 21	15.06. 21
7		**SO 100 - STAVEBNÍ ČÁST**	**66,88 dny**	**21.06. 21**	**21.09. 21**
8		**Opěrná stěna OS 1**	**30 dny**	**21.06. 21**	**30.07. 21**
9		zemní práce - výkopy	7 dny	21.06. 21	29.06. 21
10		zemní práce - násyp	3 dny	28.07. 21	30.07. 21
11		základ opěrné zdi	3 dny	28.06. 21	30.06. 21
12		bednění a výztuž	14 dny	30.06. 21	19.07. 21
13		betonáž opěrné zdi	7 dny	19.07. 21	27.07. 21
14		**Zábradlí opěrné zdi OS 1**	**23 dny**	**29.06. 21**	**29.07. 21**
15		zemní práce - výkopy	3 dny	29.06. 21	01.07. 21
16		betonové patky	3 dny	30.06. 21	05.07. 21
17		montáž zábradlí	14 dny	12.07. 21	29.07. 21
18		**Drobná architektura**	**6 dny**	**13.09. 21**	**21.09. 21**
19		osazení laviček	6 dny	13.09. 21	21.09. 21
20		osazení odpadkových košů	6 dny	13.09. 21	21.09. 21
21		**OS 2 - opěrná stěna**	**22 dny**	**28.06. 21**	**27.07. 21**
22		zemní práce	14 dny	28.06. 21	15.07. 21
23		základ	7 dny	12.07. 21	20.07. 21
24		bednění a výztuž	7 dny	12.07. 21	20.07. 21
25		betonáž	7 dny	19.07. 21	27.07. 21
26		**SO 101 - KOMUNIKACE**	**71,88 dny**	**14.06. 21**	**21.09. 21**
27		**OSA "A" - komunikace ul. Varšavská**	**63 dny**	**17.06. 21**	**14.09. 21**
28		Zemní práce	21 dny	17.06. 21	16.07. 21
29		Konstrukční vrstvy	20 dny	21.06. 21	19.07. 21
30		Pokládka obrub	21 dny	27.07. 21	24.08. 21
31		Žaluziákové panely	25 dny	03.08. 21	06.09. 21
32		Živičné povrchy	6 dny	08.09. 21	14.09. 21
33		Odvodnění	5 dny	25.06. 21	02.07. 21
34		**OSA "B" - komunikace ul. Varšavská**	**66,88 dny**	**21.06. 21**	**21.09. 21**
35		Zemní práce	14 dny	21.06. 21	08.07. 21
36		Konstrukční vrstvy	14 dny	28.06. 21	15.07. 21
37		Pokládka obrub	14 dny	06.07. 21	23.07. 21
38		Živičné povrchy	7 dny	10.09. 21	21.09. 21
39		**OSA "C" - komunikace ul. Horova**	**64 dny**	**14.06. 21**	**09.09. 21**
40		Zemní práce	14 dny	14.06. 21	01.07. 21
41		Konstrukční vrstvy	14 dny	23.06. 21	12.07. 21
42		Pokládka obrub	21 dny	28.06. 21	26.07. 21
43		Živičné povrchy	7 dny	01.09. 21	09.09. 21
44		Odvodnění	14 dny	28.06. 21	15.07. 21
45		**OSA "D1" - chodník k Albertu**	**54 dny**	**28.06. 21**	**09.09. 21**
46		Zemní práce	14 dny	28.06. 21	15.07. 21
47		Konstrukční vrstvy	14 dny	05.07. 21	22.07. 21
48		Pokládka obrub	14 dny	12.07. 21	29.07. 21
49		Živičné povrchy	7 dny	01.09. 21	09.09. 21
50		**OSA "D2" - chodník k Albertu**	**54 dny**	**28.06. 21**	**09.09. 21**
51		Zemní práce	14 dny	28.06. 21	15.07. 21
52		Konstrukční vrstvy	14 dny	05.07. 21	22.07. 21
53		Pokládka obrub	14 dny	12.07. 21	29.07. 21
54		Živičné povrchy	7 dny	01.09. 21	09.09. 21
55		**SO 103 - ELEKTROINSTALACE**	**35 dny**	**18.06. 21**	**06.08. 21**
56		**El. silnoproud**	**35 dny**	**18.06. 21**	**06.08. 21**
57		zemní práce	30 dny	18.06. 21	30.07. 21
58		pokládání kabeláže	30 dny	25.06. 21	06.08. 21
59		**El. veřejné osvětlení**	**35 dny**	**18.06. 21**	**06.08. 21**
60		zemní práce	30 dny	18.06. 21	30.07. 21
61		pokládání kabeláže	30 dny	25.06. 21	06.08. 21
62		**2.ETAPA STAVBY**	**54,13 dny**	**13.09. 21**	**26.11. 21**
63		osazení dopravního značení - DIO	5 dny	13.09. 21	20.09. 21
64		**SO 100 - STAVEBNÍ ČÁST**	**42,88 dny**	**27.09. 21**	**24.11. 21**
65		**Zábradlí okraje pojížděné plochy**	**34 dny**	**27.09. 21**	**11.11. 21**
66		zemní práce - výkopy	14 dny	27.09. 21	14.10. 21
67		betonové patky	14 dny	04.10. 21	21.10. 21
68		montáž zábradlí	14 dny	25.10. 21	11.11. 21
69		**Osazení bulley**	**8 dny**	**05.10. 21**	**14.10. 21**
70		zemní práce	3 dny	05.10. 21	07.10. 21
71		štěrkové vrstvy	3 dny	11.10. 21	13.10. 21
72		obrubníky	2 dny	13.10. 21	14.10. 21
73		**Drobná architektura**	**6 dny**	**16.11. 21**	**24.11. 21**
74		osazení laviček	6 dny	16.11. 21	24.11. 21
75		osazení odpadkových košů	6 dny	16.11. 21	24.11. 21
76		**SO 101 - KOMUNIKACE**	**47 dny**	**20.09. 21**	**24.11. 21**
77		**OSA "A" - komunikace ul. Varšavská**	**44 dny**	**23.09. 21**	**24.11. 21**
78		Zemní práce	15 dny	23.09. 21	14.10. 21
79		Konstrukční vrstvy	14 dny	04.10. 21	21.10. 21
80		Pokládka obrub	13 dny	07.10. 21	25.10. 21
81		Živičné povrchy	5 dny	17.11. 21	24.11. 21
82		Odvodnění	5 dny	28.09. 21	05.10. 21
83		**OSA "C" - komunikace terminál**	**47 dny**	**20.09. 21**	**24.11. 21**
84		Zemní práce	12 dny	20.09. 21	06.10. 21
85		konstrukční vrstvy	18 dny	05.10. 21	29.10. 21
86		pokládka obrub	10 dny	29.10. 21	12.11. 21
87		zastávkové panely	14 dny	28.10. 21	17.11. 21
88		Živičné povrchy	5 dny	17.11. 21	24.11. 21
89		odvodnění	5 dny	30.09. 21	07.10. 21
90		**OSA "D" - komunikace terminál**	**45,88 dny**	**22.09. 21**	**24.11. 21**
91		Zemní práce	14 dny	22.09. 21	11.10. 21
92		konstrukční vrstvy	18 dny	07.10. 21	01.11. 21
93		pokládka obrub	10 dny	27.10. 21	09.11. 21
94		zastávkové panely	14 dny	28.10. 21	17.11. 21
95		Živičné povrchy	5 dny	17.11. 21	24.11. 21
96		odvodnění	5 dny	04.10. 21	08.10. 21
97		**SO 103 - ELEKTROINSTALACE**	**44,13 dny**	**27.09. 21**	**26.11. 21**
98		**El. silnoproud**	**32 dny**	**27.09. 21**	**10.11. 21**
99		zemní práce	29 dny	27.09. 21	05.11. 21
100		pokládání kabeláže	29 dny	30.09. 21	10.11. 21
101		**El. veřejné osvětlení**	**41,13 dny**	**30.09. 21**	**26.11. 21**
102		zemní práce	29 dny	30.09. 21	10.11. 21
103		pokládání kabeláže	29 dny	05.10. 21	15.11. 21
104		osazení stožárů a svítidel VO	20 dny	05.11. 21	26.11. 21
105		**3.ETAPA STAVBY**	**37 dny**	**22.11. 21**	**11.01. 22**
106		osazení dopravního značení - DIO	5 dny	22.11. 21	26.11. 21
107		**SO 101 - KOMUNIKACE**	**32 dny**	**29.11. 21**	**11.01. 22**
108		**OSA "A" - komunikace ul. Varšavská**	**32 dny**	**29.11. 21**	**11.01. 22**
109		Zemní práce	14 dny	29.11. 21	16.12. 21
110		Konstrukční vrstvy	14 dny	02.12. 21	21.12. 21
111		Pokládka obrub	14 dny	06.12. 21	23.12. 21
112		Živičné povrchy	5 dny	05.01. 22	11.01. 22
113		Odvodnění	3 dny	01.12. 21	03.12. 21
114		**OSA "B" - komunikace ul. Varšavská**	**29 dny**	**02.12. 21**	**11.01. 22**
115		Zemní práce	10 dny	02.12. 21	15.12. 21
116		Konstrukční vrstvy	10 dny	06.12. 21	17.12. 21
117		Pokládka obrub	10 dny	09.12. 21	22.12. 21
118		Živičné povrchy	5 dny	05.01. 22	11.01. 22
119		**OSA "F" - komunikace ul. Jugoslávská**	**29 dny**	**02.12. 21**	**11.01. 22**
120		Zemní práce	10 dny	02.12. 21	15.12. 21
121		Konstrukční vrstvy	10 dny	06.12. 21	17.12. 21
122		Pokládka obrub	10 dny	09.12. 21	22.12. 21
123		Živičné povrchy	5 dny	05.01. 22	11.01. 22
124		**DOKONČOVACÍ PRÁCE**	**4 dny**	**11.01. 22**	**14.01. 22**
125		závěr stavby	3 dny	11.01. 22	13.01. 22
126		přednání staveniště	1 den	14.01. 22	14.01. 22

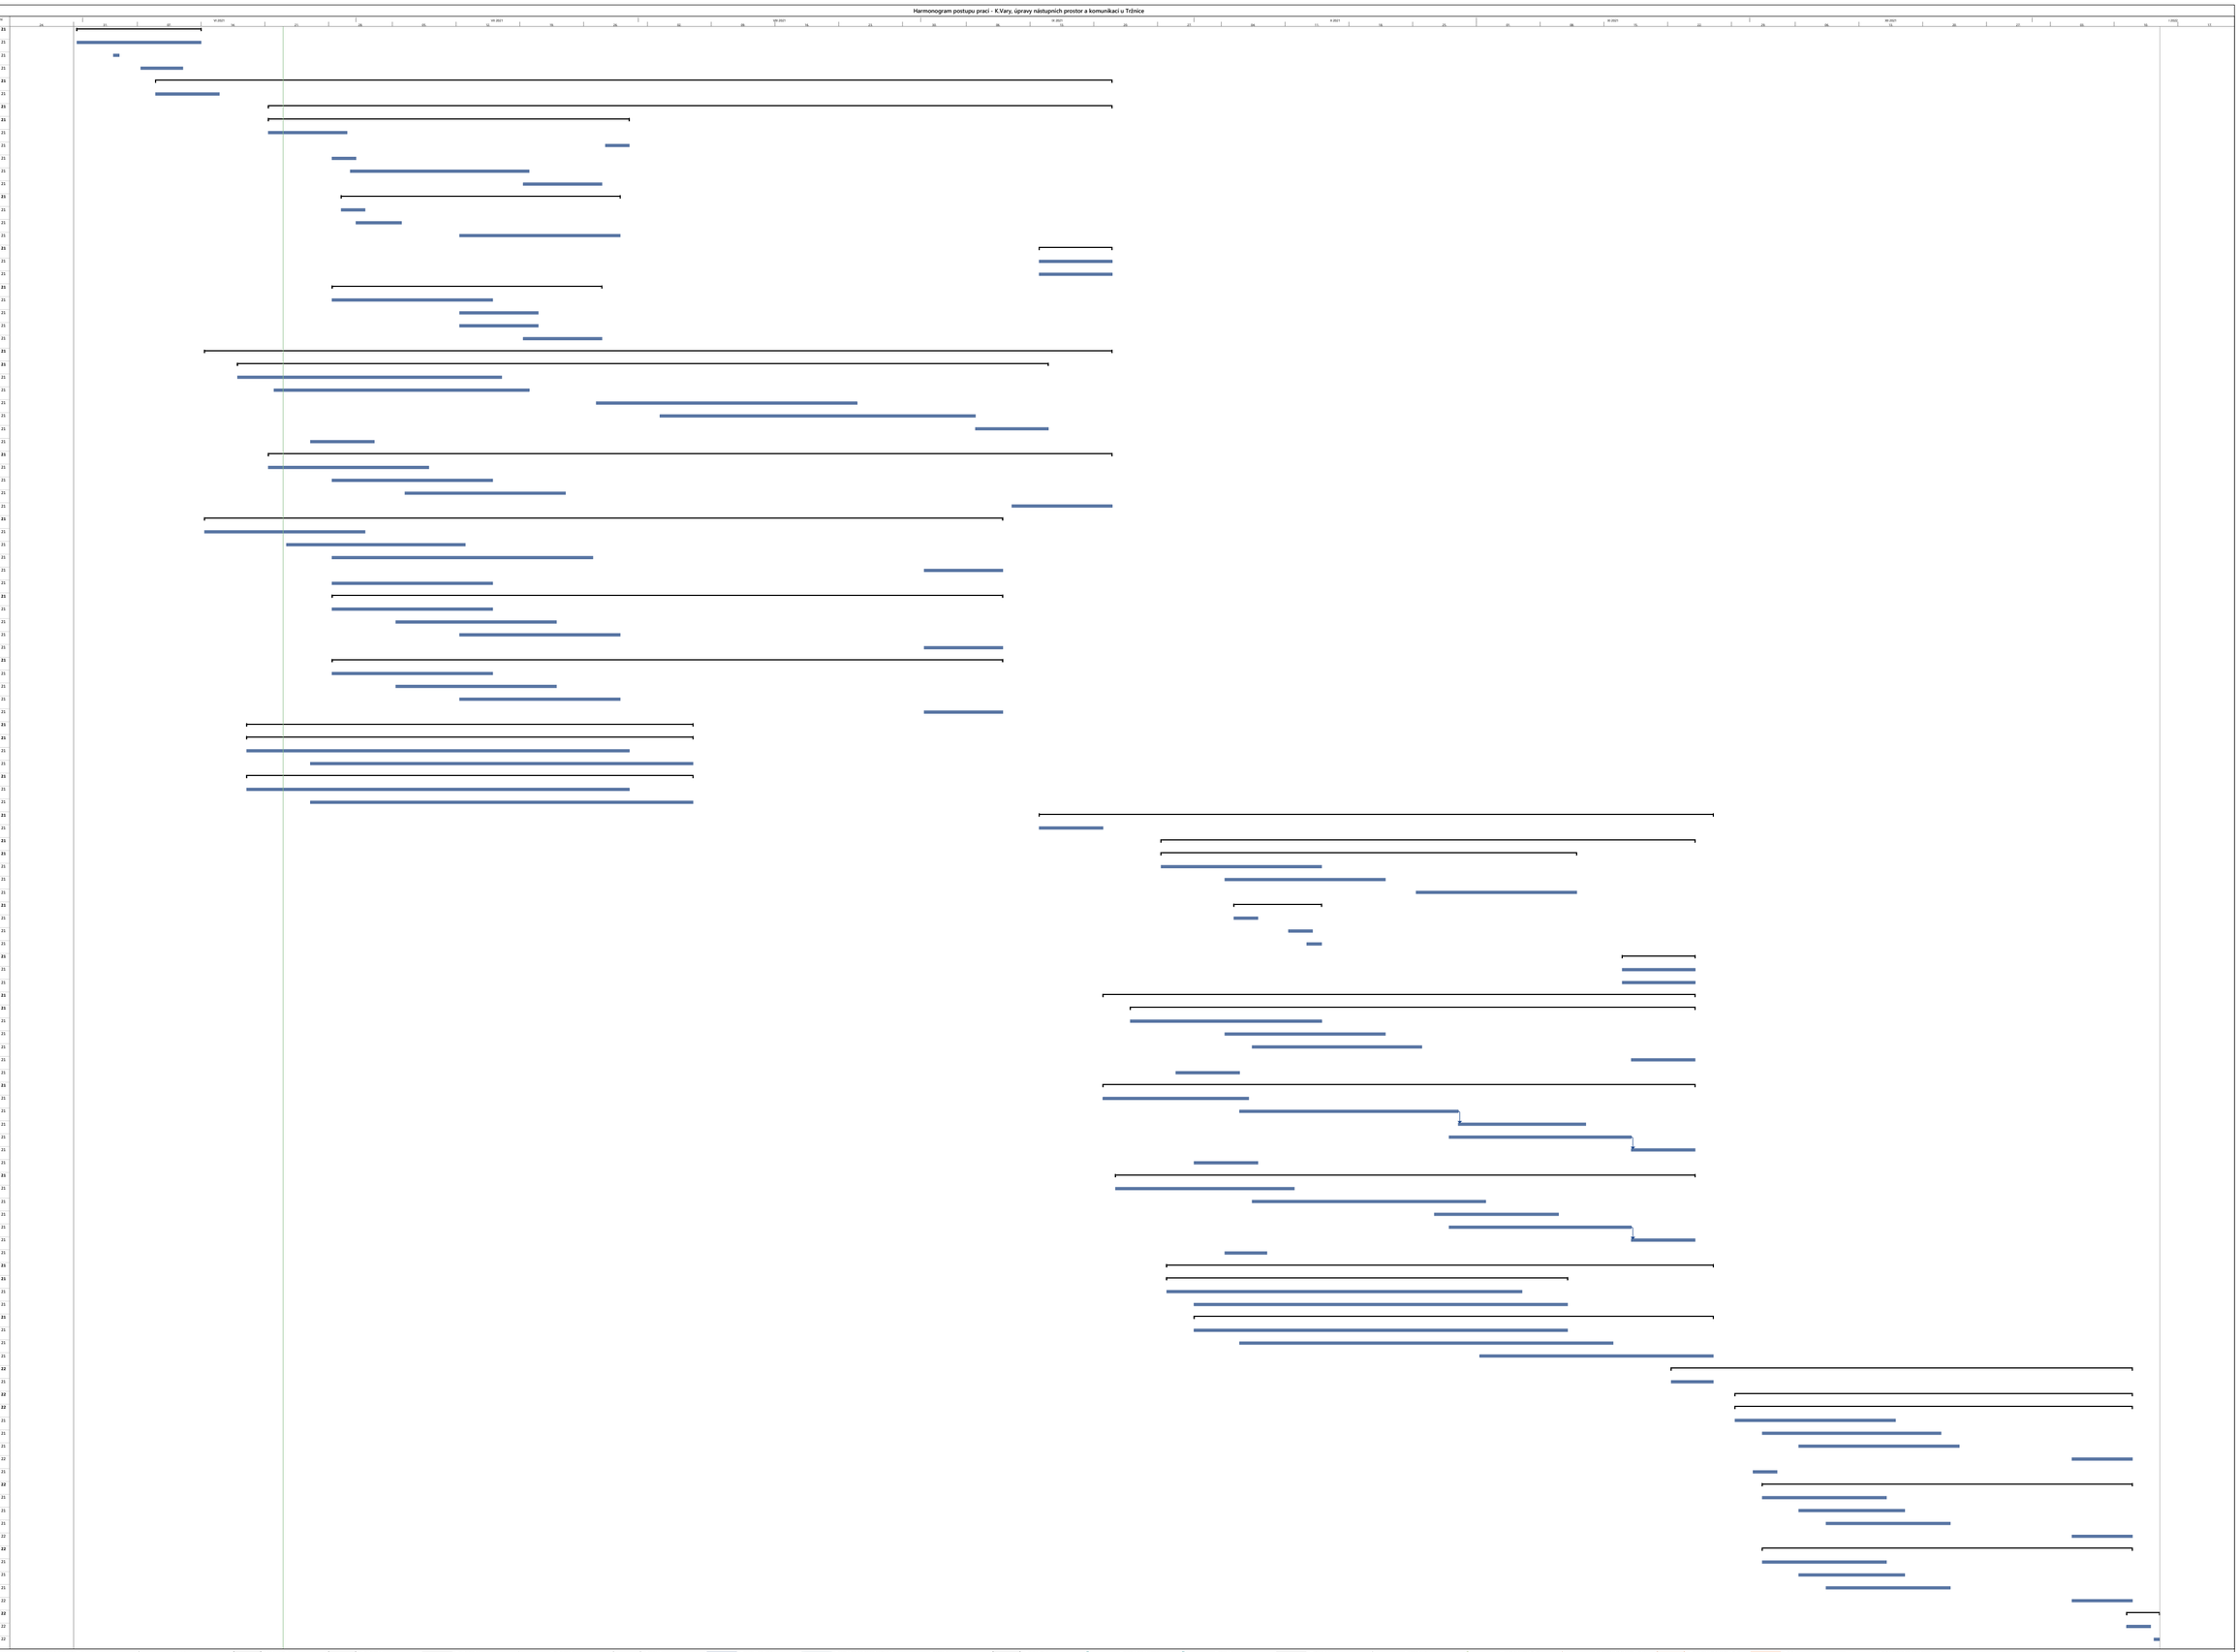

Datum: 23.06. 21 | Úkol | Souhrnný | Souhrn projektu | Kritická cesta | Postup | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly setrvané v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Uzavřený termín | Milník řídícího přehledu | Souhrnný úkol řídícího přehledu | Termínový úkol řídícího přehledu | Průběh | Průběh ruční sadarážky úkolu
