

Statutární město Karlovy Vary

a

Magic KV s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

KARLOVY VARY 2016

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Magic KV s.r.o.

se sídlem: Smolné Pece 242 Nová Role 362 25

IČO: 29074541

DIČ: CZ29074541

bankovní spojení č.ú.: 230268395/0300 vedený u ČSOB

zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Martina Andršová

zastoupená ve věcech technických: Jiří Filip

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ nebo „**Zednictví**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“ vyhlášené dne 27.6.2016 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

II. Specifikace díla

1. Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby, označené jako „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“, která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.4 smlouvy). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13.7.2016 (příloha č.3 smlouvy). Dílo je blíže specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavbu „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a projektová dokumentace tvoří nedílnou součást této smlouvy a byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje.
2. Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“ ze dne 27.6.2016; a
 - b) projektovou dokumentací s názvem Budova MM K.Vary. U Spořitelny 2, stavební úpravy vč. výměny oken“, zpracovaná Ing.Janem Duškem, BPO Ostrov spol. s r.o. Lidická 1239, 363 01 Ostrov, v 05/2016; a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 13.7.2016, včetně oceněného soupisu prací.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v níže uvedených termínech:
Termín realizace: 1.9.2016 – 31.10.2016
2. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště, které proběhne dne 1.9.2016.
3. Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

IV. Místo provádění díla

1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena a způsob plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.535.123,- Kč** (slovy: jedenmilionpěstřicetpěttisícstodvacettřít korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla **1.268.697,- Kč** bez DPH Kč (slovy: jedenmiliondvěstěšedesátosmtisícšestsetdevadesátšedem korun českých) a DPH **266.426,- Kč** (slovy: dvěšedesátšesttisícčtyřistadvacetšest korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
3. Objednatelům nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílejší plnění, a to až do výše 90% (slovy: Devadesát procent) Celkové ceny díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílejší plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.
4. Splatnost faktur na dílejší plnění je smluvními stranami dohodnuta na 21 (dvacetjedna) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílejší plnění bude:
 - a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílejší plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů (výkazu výměr); a současně
 - b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Objednatelům podepsaný zjišťovací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

5. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílejších plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílejší plnění dle předchozího odstavce.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude Cena za provedení díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název projektu stavbu „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit.
9. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak souhlas s provedením ohlášené stavby, doby provádění stavebních prací apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
4. Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí; zavazuje se při plnění díla postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha předmětu díla, podle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo je musí znát či předpokládat.
7. Zhotovitel umožní práce na staveništi bez finančních nebo jiných nároků v době provádění díla i dodavatelům, se kterými nebude ve smluvním vztahu a kteří se budou podílet na výstavbě vybraných objektů díla „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny práce, které souvisí s provedením díla „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“, nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a dokončeny v řádných termínech.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v této Smlouvě, včetně jejich příloh, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VIII. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle obecně závazných technických norem a této smlouvy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla objednateli zhotovitelem.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do **31.10.2016**.
2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělků, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. 3, odst. 1 až 3. této smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedení díla, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku 7. odst. 1.a 2., v článku 9. odst. 1. a 2. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.
3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelům ruší.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle této smlouvy, které bude delší než sedm kalendářních dnů.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatelů vzniká objednatelům vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelům nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatelů účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Adresy pro doručování

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
 - a) adresa pro doručování objednateli je: **Magistrát města Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic
 - b) adresa pro doručování zhotoviteli je: **Magic KV s.r.o.**
Dolní 98
362 63 Dalovice
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XIII. Doručování

1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou.
2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
 - (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (ii) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 12., odst. 1, písm. a), b) této smlouvy.
 - (iii) při doručování do datové schránky
dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 : Výpis z živnostenského rejstříku – prostá kopie


Příloha č. 2 : Výpis z obchodního rejstříku – prostá kopie

Příloha č. 3 : Nabídkový rozpočet – prostá kopie

Příloha č. 4 : Projektová dokumentace s názvem projektovou dokumentací s názvem Budova MM K.Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy vč. výměny oken“, zpracovaná Ing.Janem Duškem, BPO Ostrov spol. s r.o. Lidická 1239, 363 01 Ostrov, v 05/2016; a


Příloha č. 5 : Harmonogram postupu prací

V Karlových Varech, dne **15. 08. 2016**

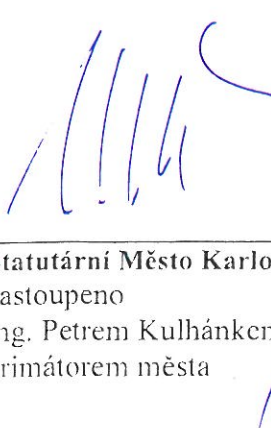


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města





MAGIC KV s.r.o.
zastoupena
Bc. Martinou Andršovou
jednatelkou společnosti



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 23.05.2016 13:24:34

Obchodní firma: **Magie KV s.r.o.**
Sídlo: **362 25, Smolné Pece 242**
Identifikační číslo osoby: **29074541**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **17.06.2009**

Statutární orgán nebo jeho členové

Jméno a příjmení: **Martina ANDRŠOVÁ (3)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **03.07.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Filip (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **03.07.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Zednictví**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **03.07.2009**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Vladimír Krystyn (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků

Adresa: **Dolní 98, 362 63, Dalovice - Všeborovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007347449**

Zahájení provozování dne: **15.07.2009**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Dolní 98, 362 63, Dalovice - Všeborovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007347449**

Zahájení provozování dne: **15.07.2009**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Dolní 98, 362 63, Dalovice - Všeborovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007347449**

Zahájení provozování dne: **15.07.2009**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Dolní 98, 362 63, Dalovice - Všeborovice**

Identifikační číslo provozovny: **1007347449**

Zahájení provozování dne: **15.07.2009**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jiří Filip (1)**

Datum narození: **24.08.1972**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Vladimír Krystyn (2)**

Datum narození: **23.05.1972**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Martina ANDRŠOVÁ (3)**

Datum narození: **18.03.1981**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Karlovy Vary**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Výpis

z obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 23402

Datum zápisu: 3. července 2009

Spisová značka: C 23402 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: Magic KV s r. o.

Sídlo: č.p. 242, 362 25 Smolné Pece

Identifikační číslo: 290 74 541

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
truhlářství, podlahářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zednictví

Statutární orgán:
jednatel:
Bc. MARTINA ANDRŠOVÁ, dat. nar. 18. března 1981
Masarykova 672, 363 01 Ostrov
Den vzniku funkce: 31. října 2012

Počet členů: 1

Způsob jednání: Za společnost jedná jednatel samostatně.



Společníci:
Společník: JIŘÍ FILIP, dat. nar. 24. srpna 1972
č.p. 242, 362 25 Smolné Pece

Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: na podíl nebyl vydán kmenový list

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky	
Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny Zvýměna oken-východní část	
2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče	
Obchodní firma / Název:	MAGIC KV s.r.o.
Právní forma:	s.r.o.
IČO:	29074541
Sídlo / místo podnikání:	Smolné Pece 242 Nová Role / Dolní 98, Dalovice
Kontaktní osoba:	Jiří Filip
Adresa pro doručování:	Dolní 98, Dalovice 36263
E-mail:	filip@magickv.cz
Tel. / fax:	603767947
3. Celková nabídková cena	
Cena bez DPH	1.268.697,-
DPH	266.426,-
Cena včetně DPH	1.535.123,-
4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Bc. Martina Andršová
Funkce:	Jednatelka společnosti
Datum podpisu:	13.7.2016
Podpis oprávněné osoby:	 



Dolní 98
Karlovy Vary, Dašice 362 63

IČ: 29074541
DIČ: CZ29074541

Provozovna +420 605 470 431
Okna +420 731 656 206
+420 606 454 013
Kuchyně +420 724 753 548

cenová nabídka :

ze dne: 13.7.2015


Magistrát města
Karlovy Vary

MMKV (suterén)	164.112,-
MMKV (přízemí)	101.289,-
MMKV (1. patro)	430.499,-
MMKV (2. patro)	206.027,-
MMKV (3. patro)	205.950,-
MMKV (4.patro)	205.950,-


celková cena bez DPH 1.313.827,-
dodatečná sleva 45.130,-

celková cena po slevě bez DPH 1.268.697,-
DPH 21% 266.426,-

celková cena po slevě s 21% DPH 1.535.123,-

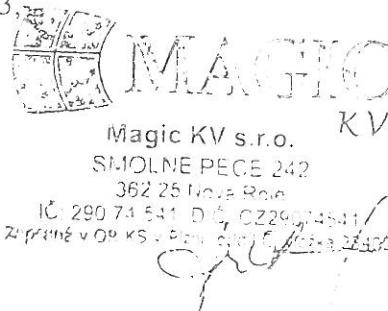

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

 <p>BPO spol s r o Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tei +420353675111 Fax +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA	Budova M M K. Vary, U Spořitelny 2, stavebni úpravy vč výměny oken	Datum:	31.05.2016
	ČAST (SO,PS)		Ved. zak.:	Dušek Jan Ing.
	OBSAH	Seznam dokumentace	HIP:	
	OBJEDNATEL	Statutární město Karlovy Vary	Slupeň:	
			Zodp proj	Vopat Věroslav Ing.
		Číslo zak	7979-81	
		Číslo archivní	BPO 9-93161	



Dolní 98

Karlovy Vary · Dašovice 362 63

IČ 29074541

DIČ CZ29074541

Provozovna +420 605 470 431

Ořna +420 731 656 206

+420 606 454 013

Kuchyně +420 724 753 548

Závazný harmonogram postupu prací :

Ze dne: 13.7.2016

Magistrát města
Karlovy Vary

Zahájení prací : 1.9. 2016

Ukončení prací: 14.10. 2016

Celková doba prováděných prací 31 pracovních dnů...









V N.P.	17 ks oken	montáž	1.- 5. 9.
		zednické začištění	2.- 6. 9.
IV N.P.	17 ks oken	montáž	6.- 9. 9.
		zednické začištění	7.- 12. 9.
III N.P.	17 ks oken	montáž	12.- 14. 9.
		zednické začištění	13.- 15. 9.
II N.P.	35 ks oken	montáž	15.- 22. 9.
		zednické začištění	16.- 23. 9.
I N.P.	9 ks oken	montáž	26.- 27. 9.
		zednické začištění	27.- 29. 9.
I P.P.	9 ks oken	montáž	29.9.- 3. 10.
		zednické začištění	3.- 5. 10.
I PP	mříže+luxfery+dokončovací práce		5.- 14. 10.

Sídlo: Smolné Pece 242, 362 25 Nová Role

E-mail: info@magickv.cz

Bankovní spojení : 230268395/0300

Doložka smluv uzavřených Statutárním městem Karlovy Vary

Smlouva č. 2016-00043/ORI	Datum	Titul, jméno, příjmení (nebo název orgánu)	Pracovní pozice	Podpis
Zpracoval	9.8.2016	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Příkazce operace	9.8.2016	Ing. Daniel Riedl	vedoucí ORI	
Zaměstnanec odpovědný za rozpočet odboru	9.8.2016	Marcela Boháčková	ekonom ORI	
Správce rozpočtu MKV	10.8.16	Ing. Martina Švédová		
Zaměstnanec odpovědný za vedení účetnictví MKV	9.8.16	vedoucí oddělení Zdeňka Čínková výkaznictví		
Právně posoudil	9.8.2016	PRŮCHA M.	PRÁV.	
Primátor, náměstek primátora, tajemník	15.8.2016	Ing. P. Kulhánek	primátor	
Smlouva zveřejněna v registru smluv	15.8.2016	RS		

dotace podmíněná pohledávka podmíněný závazek _____ Kč (vč. DPH)
