

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací**č. SRM: 8020000305****č. SAP: 71010-006749, 71010-006762**

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:**Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Václavem Rozhoněm, MBA, manažerem útvaru Výstavba pevné přístupové sítě, na základě pověření ze dne 1.6.2015

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:**Statutární město Karlovy Vary**

Se sídlem Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČ : 00254657

DIČ : CZ00254657

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků :

Ing. Petr Kulháněk, primátor města

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu : 800424389/0800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK č.j. 510774/13 ze dne 21.1.2013 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením :

- VPI K.Vary, Rumunská, rek.komunikací, MK (překládka metalické kabelizace)
- VPI K.Vary, Rumunská, rek.komunikací, OK (překládka optické kabelizace)

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny náklady, které společností CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle dokumentace **DUR „Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, Karlovy Vary, SO 402 Přeložky SEK TCR“** a navazující prováděcí PD, kterou pro Stavebníka zpracovala PK ing. Jiří Kovařík / K-projekt Karlovy Vary. Situační výkresy překládky SEK jsou Přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

a) před realizací Překládky:

- zajistit aktualizaci prováděcí PD zpracované PK ing. Jiří Kovařík / K-projekt Karlovy Vary v roce 2013.

b) po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.
- zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje :

Před realizací Překládky:

- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- oznámit společnosti O2 nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky stavební připravenost,

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z **Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská, Karlovy Vary“, vydaného Magistrátem města Karlovy Vary – Stavebním úřadem dne 29.8.2013**, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN (**SO 402 DUR**) za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **nejpozději do 30.11.2015** a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi O2 a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104

odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených rozpočtem projektové dokumentace, kterou pro Stavebníka zpracovala PK ing. Jiří Kovařík / K-projekt Karlovy Vary v roce 2013, v cenách aktuálně platných ke dni uzavření této smlouvy činí **664.900,93 Kč (bez DPH)**.

Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů společnosti CETIN známých ke dni zpracování této smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu „Zemní práce“ předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační. **Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.**

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit současně s platbou dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle čl. 6, bod 6.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4, bod. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Případné náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5, bod 5.4 budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dní od jeho vystavení.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: ing. Václav Rozhoň, MBA, manažer útvaru Výstavba pevné přístupové sítě
e-mail: vaclav.rozhon@cetin.cz , tel. 602 409 503

ve věcech technických: Jiří Dufek, specialista pro výstavbu sítě – projektový koordinátor
e-mail: jiri.dufek@cetin.cz , tel. 602 409 501

b) Za Stavebníka :

ve věcech smluvních: ing. Petr Kulháněk, primátor města Karlovy Vary
e-mail: p.kulhanek@mmkv.cz , tel. 353 118 319

ve věcech technických: Petr Kořán, technik rozvoje a investic
e-mail: p.koran@mmkv.cz , tel. 725 533 321

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,

leďaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Přílohy :

1. Situační polohopisný výkres PD Překládky
2. Specifikace nákladů Překládky
3. Pověření ing. Václava Rozhoně, MBA

V Praze dne : 17. 9. 2015

V Karlových Varech dne :

21. 10. 2015








Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Stavebník

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
242




KLAD LISTŮ

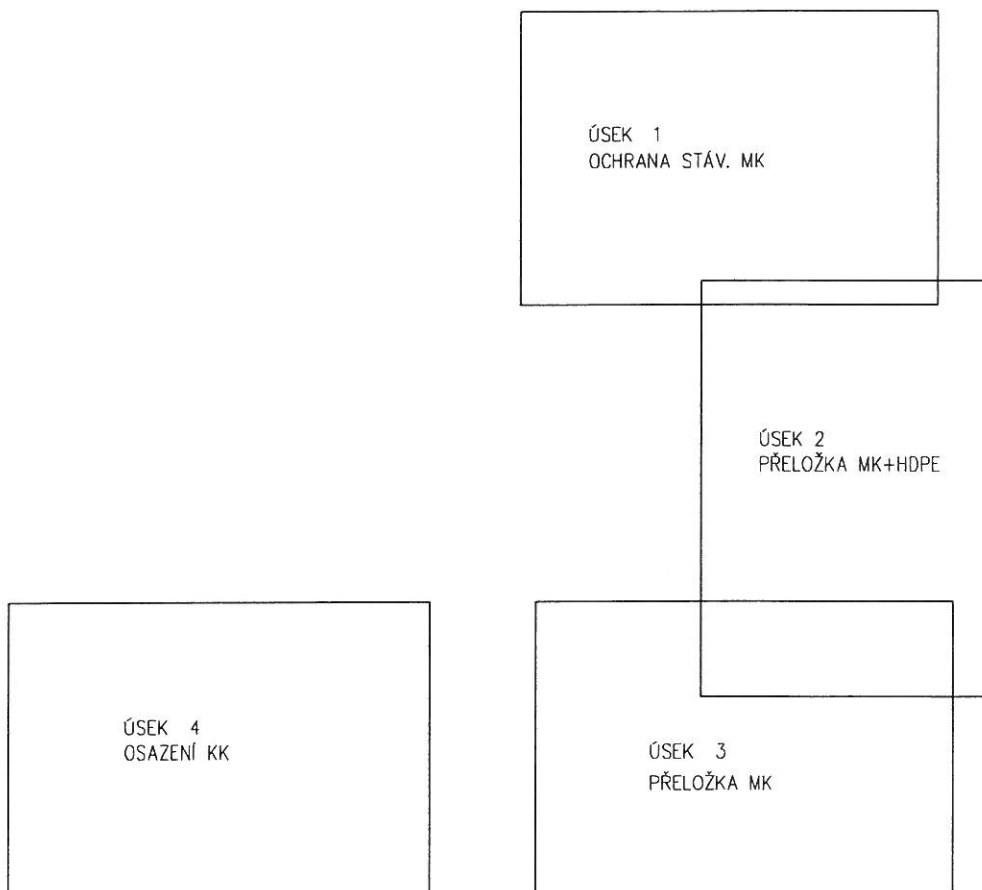

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ TRASA, KABELY O2
- STÁVAJÍCÍ TRASA, KABELY O2 ULOŽ DO NOVÝCH KZ
- NOVÁ TRASA, KABELY O2
- NOVÁ TRASA, PŘENES. STÁV. KABEL O2
- ZRUŠENÁ TRASA, KABELY O2

Kopírování a rozšiřování této dokumentace bez souhlasu jejího zpracovatele je zakázáno.			
VYPRACOVAL ING. J. KOVAŘÍK	KRESLIL	KONTROLOVAL ING. J. KOVAŘÍK	ING. J. KOVAŘÍK H - projekt
OBEC : Karlovy Vary	KRAJ : KARLOVVARSKÝ	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, AUTORIZACE, KONZULTACE IČO : 733 98 781	
INVESTOR : Statutární město Karlovy Vary			DATUM 05 / 2015
REKONSTRUKCE ULIC AMERICKÁ A RUMUNSKÁ KARLOVY VARY			STUPEŇ RD
SO 402 PŘELOŽKA SEK O2			FORMÁT 5 A4
POLOHOPISNÝ PLÁN – KLAD LISTŮ			ZMĚNA
			MĚŘITKO VÝKRES Č. 1

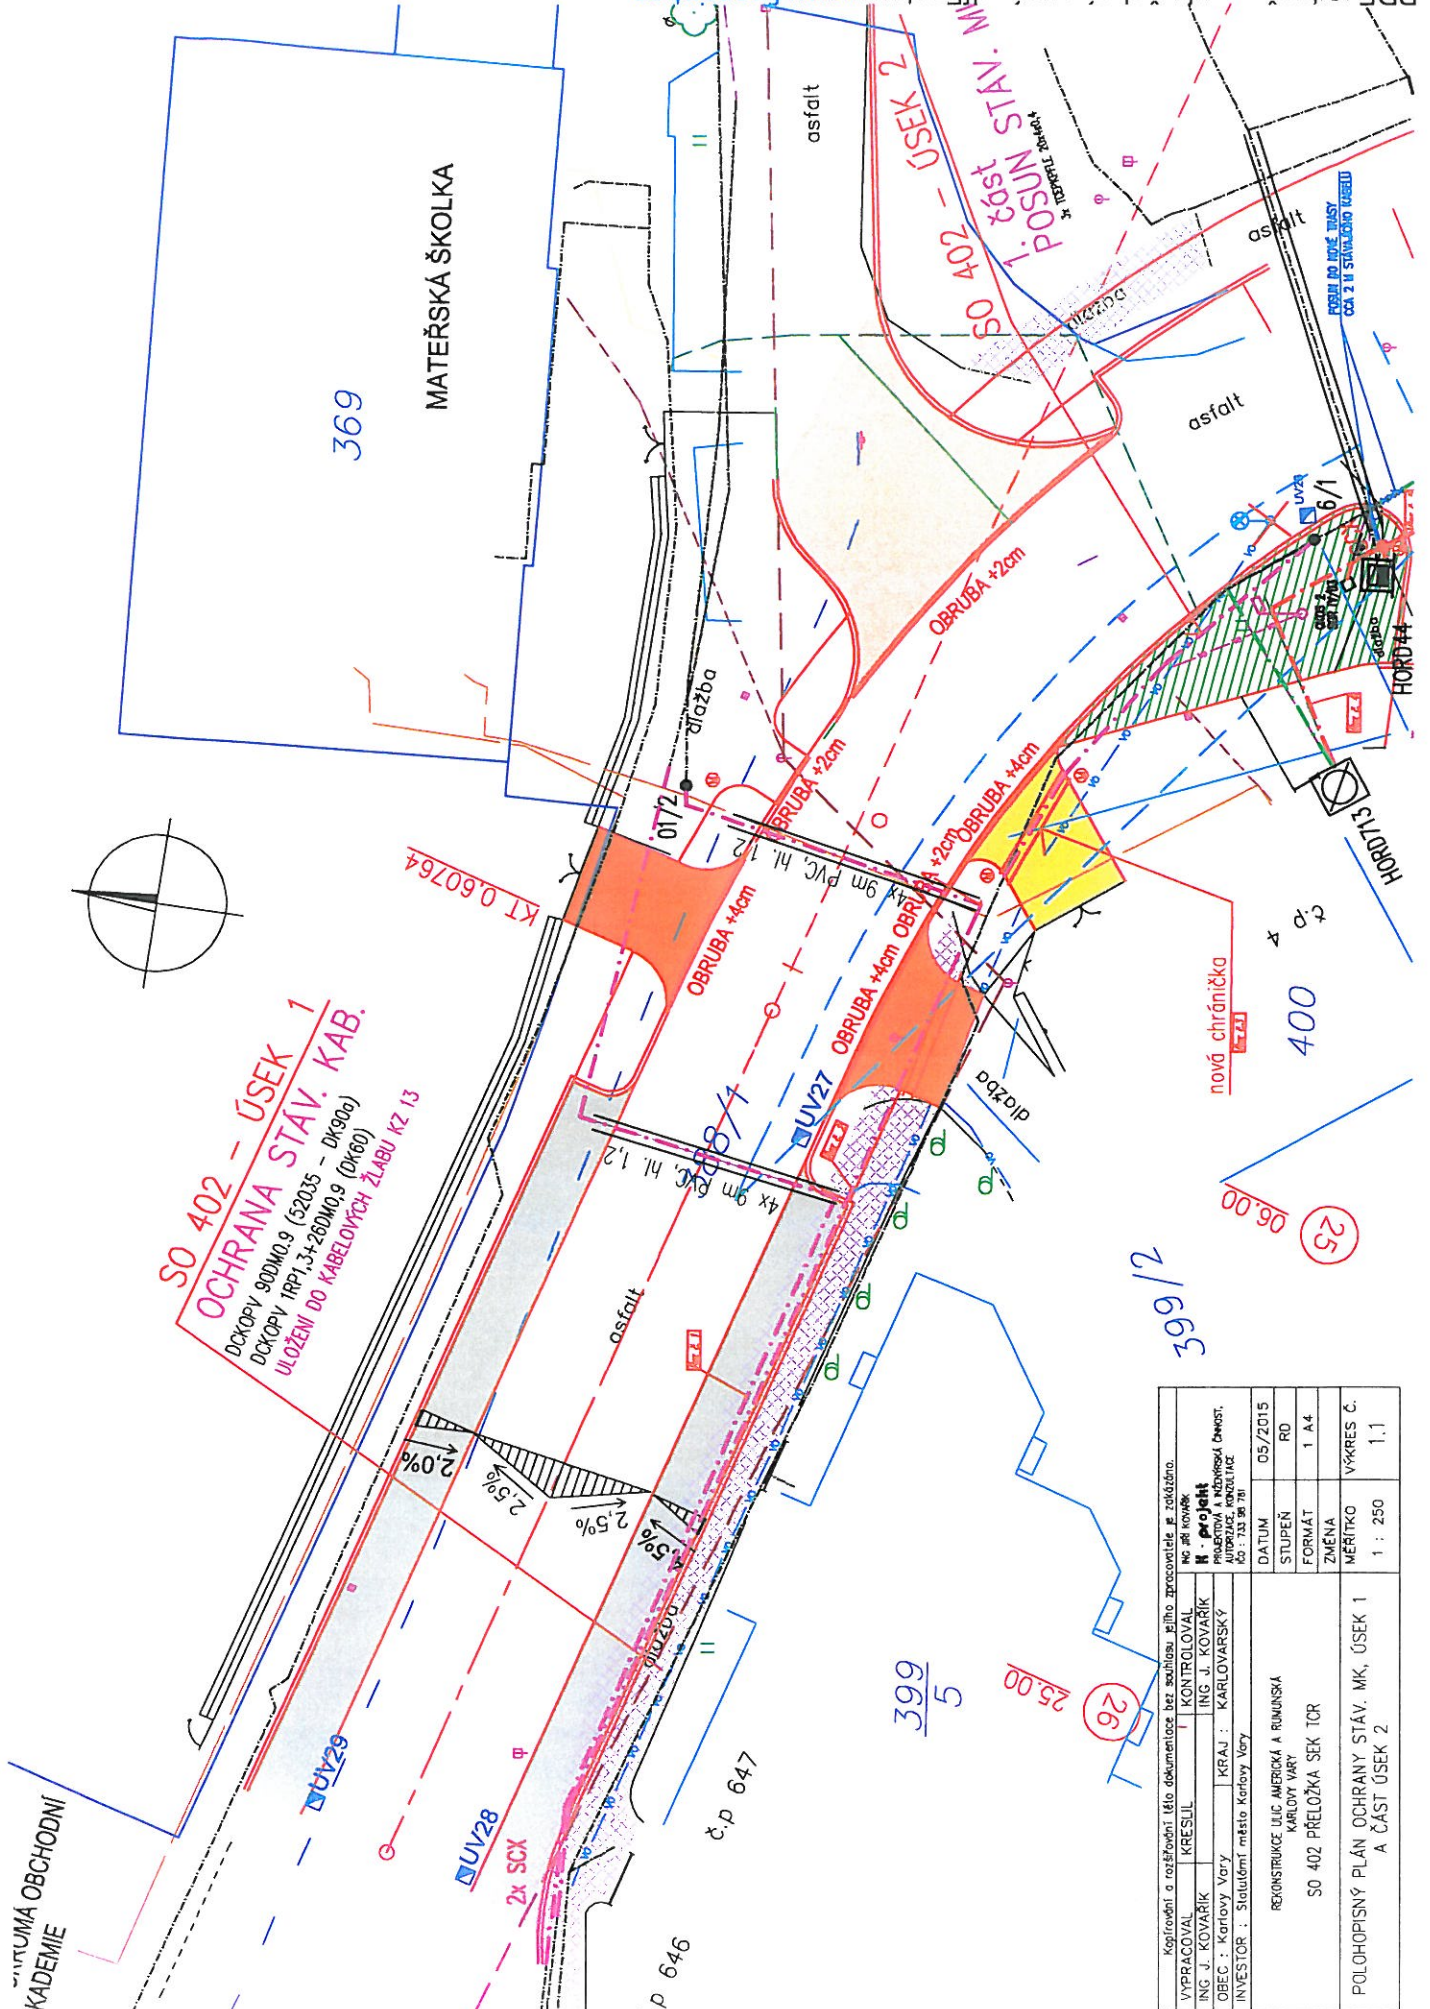


SO 402 - ÚSEK 1
OCHRANA STAV. KAB.
 DCKOPV 90DMO,9 (52035 - DK90a)
 DCKOPV 1RP1,3+260MO,9 (DK60)
 ULOŽENÍ DO KABELOVÝCH ŽLABU KZ 13

Kopírování a rozřezání této dokumentace bez souhlasu příjmu zpracovatele je zakázáno.	
VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. J. KOVÁŘIK	ING. J. KOVÁŘIK
OBEC : Karlovy Vary	KRAJ : KARLOVARSKÝ
INVESTOR : Státní ústřední úřad zeměměřičství a katastru	DATUM : 05/2015
REKONSTRUKCE ULICE AMERICKÁ A RUMUNSKÁ KARLOVY VARY	STUPEŇ : RD
SO 402 PŘELOŽKA SEK TOR	FORMÁT : 1 A4
POLOHOPIŠNÝ PLÁN OCHRANY STAV. MK, ÚSEK 1 A ČÁST ÚSEK 2	ZNĚMĚNÍ : 1
	MĚŘÍTKO : 1 : 250
	VÝKRES Č. : 1.1

AKADEMIE
 OBCHODNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

369



nová chránička

400

06.00

25

399/2/692

399/5

25.00


26

č.p. 646

č.p. 647

HODTIS

PROJEKT ZÁKLADNÍ
 Č. 111/2015
 ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD ZEMĚMĚŘIČSTVÍ A KATASTRU

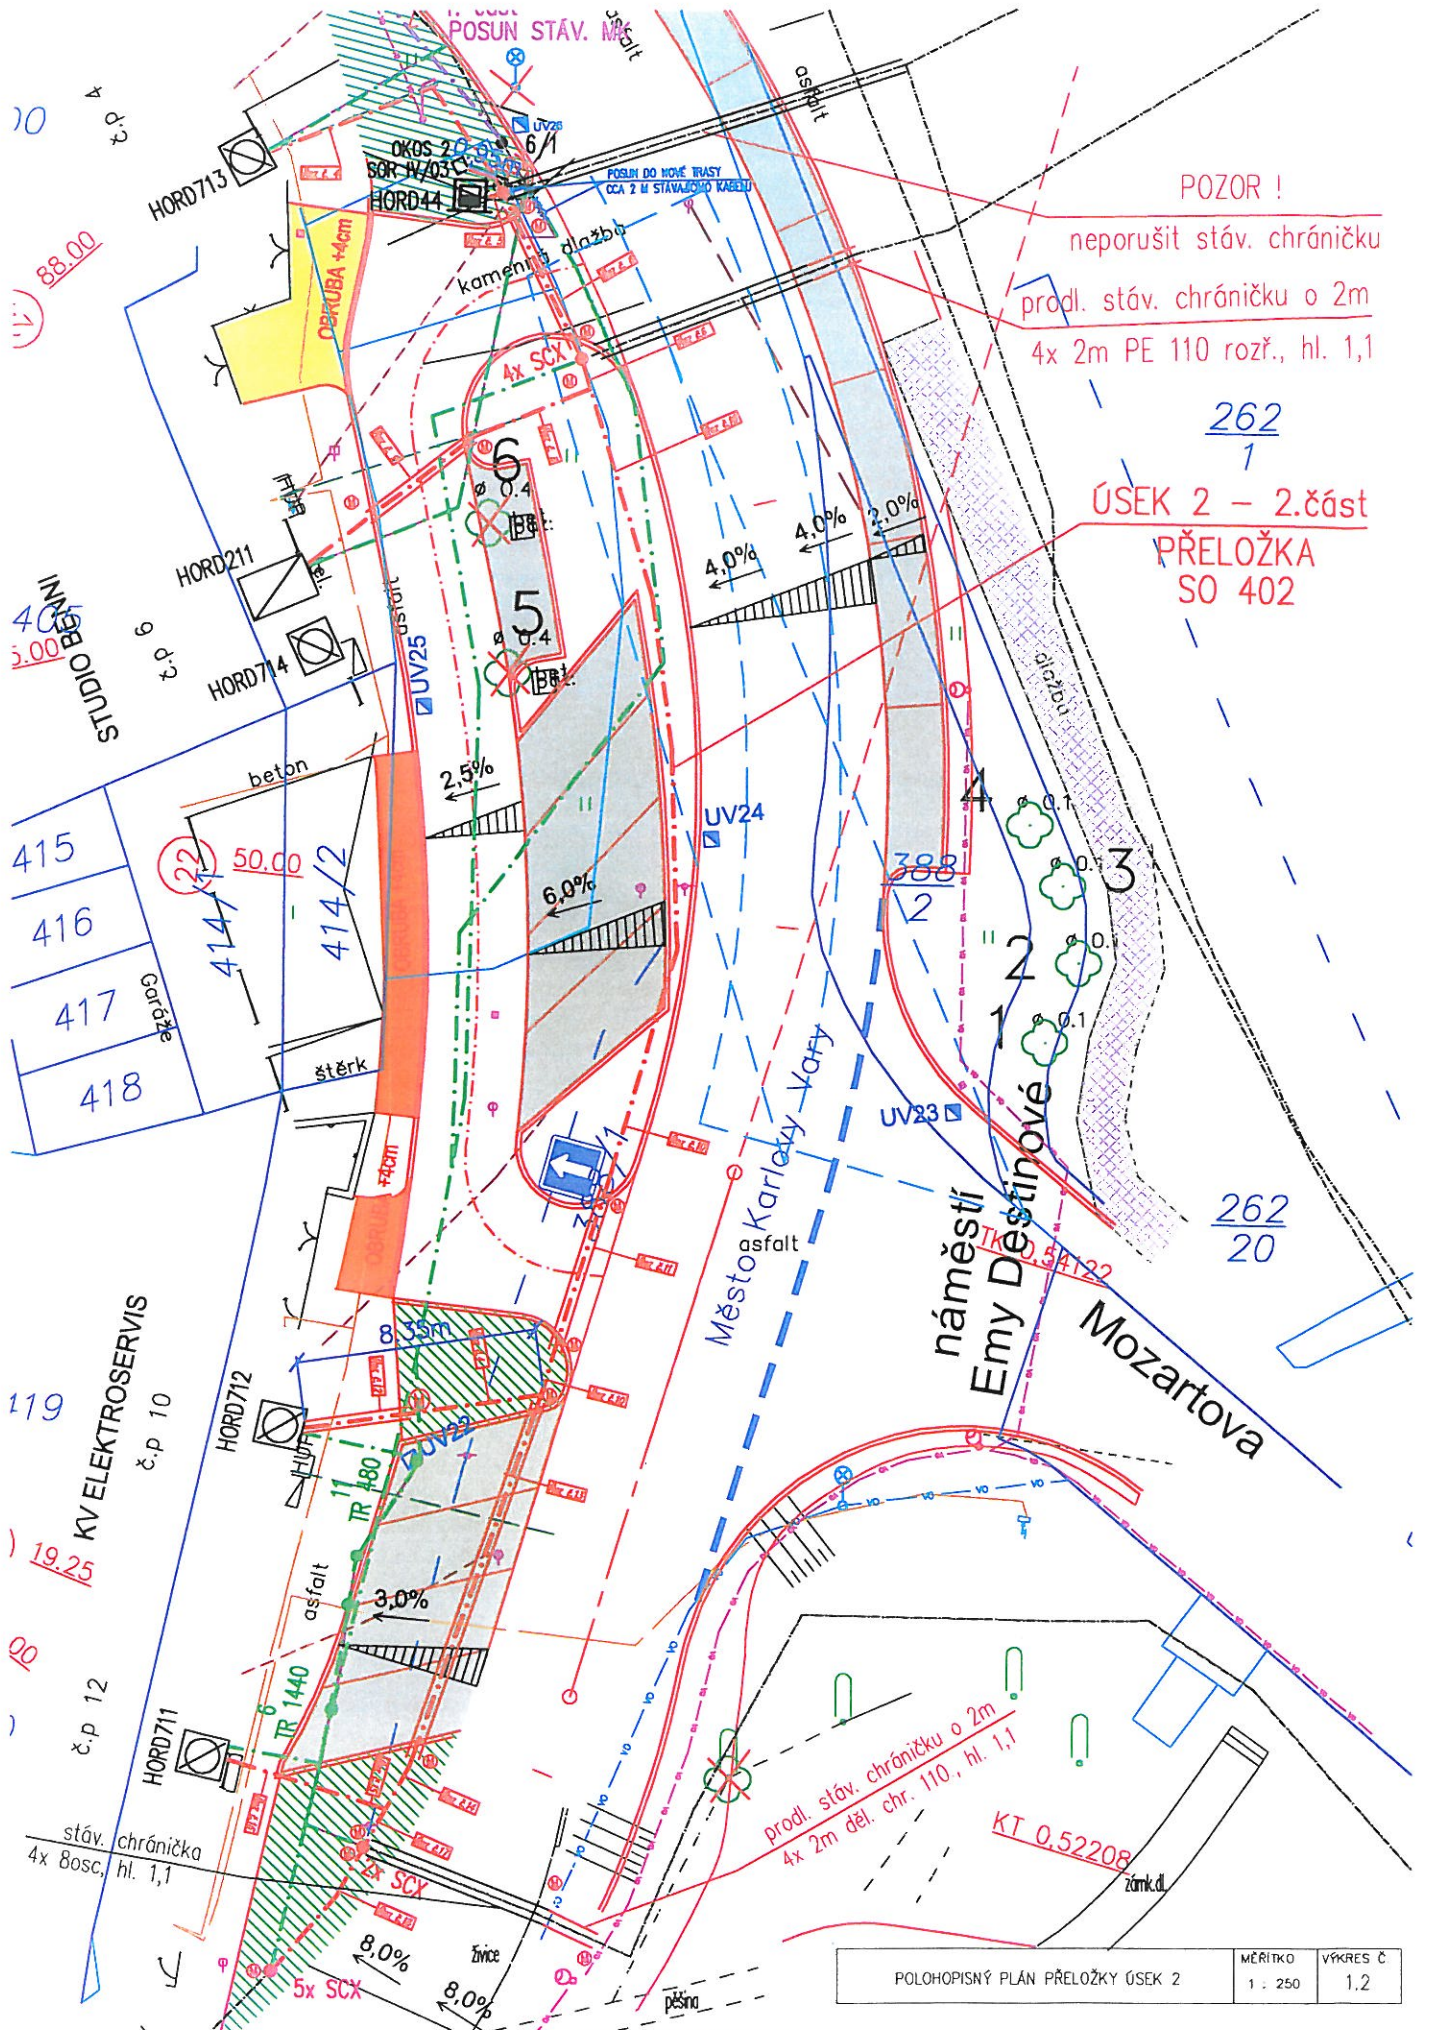


POZOR !
 neporušit stáv. chráničku
 prodl. stáv. chráničku o 2m
 4x 2m PE 110 rozř., hl. 1,1

262
 1
ÚSEK 2 - 2.část
PŘELOŽKA
SO 402

náměstí
 Emy Dášinové
 Mozartova

POLOHOPISNÝ PLÁN PŘELOŽKY ÚSEK 2	MĚŘÍTKO 1 : 250	VÝKRES Č. 1.2
----------------------------------	--------------------	------------------

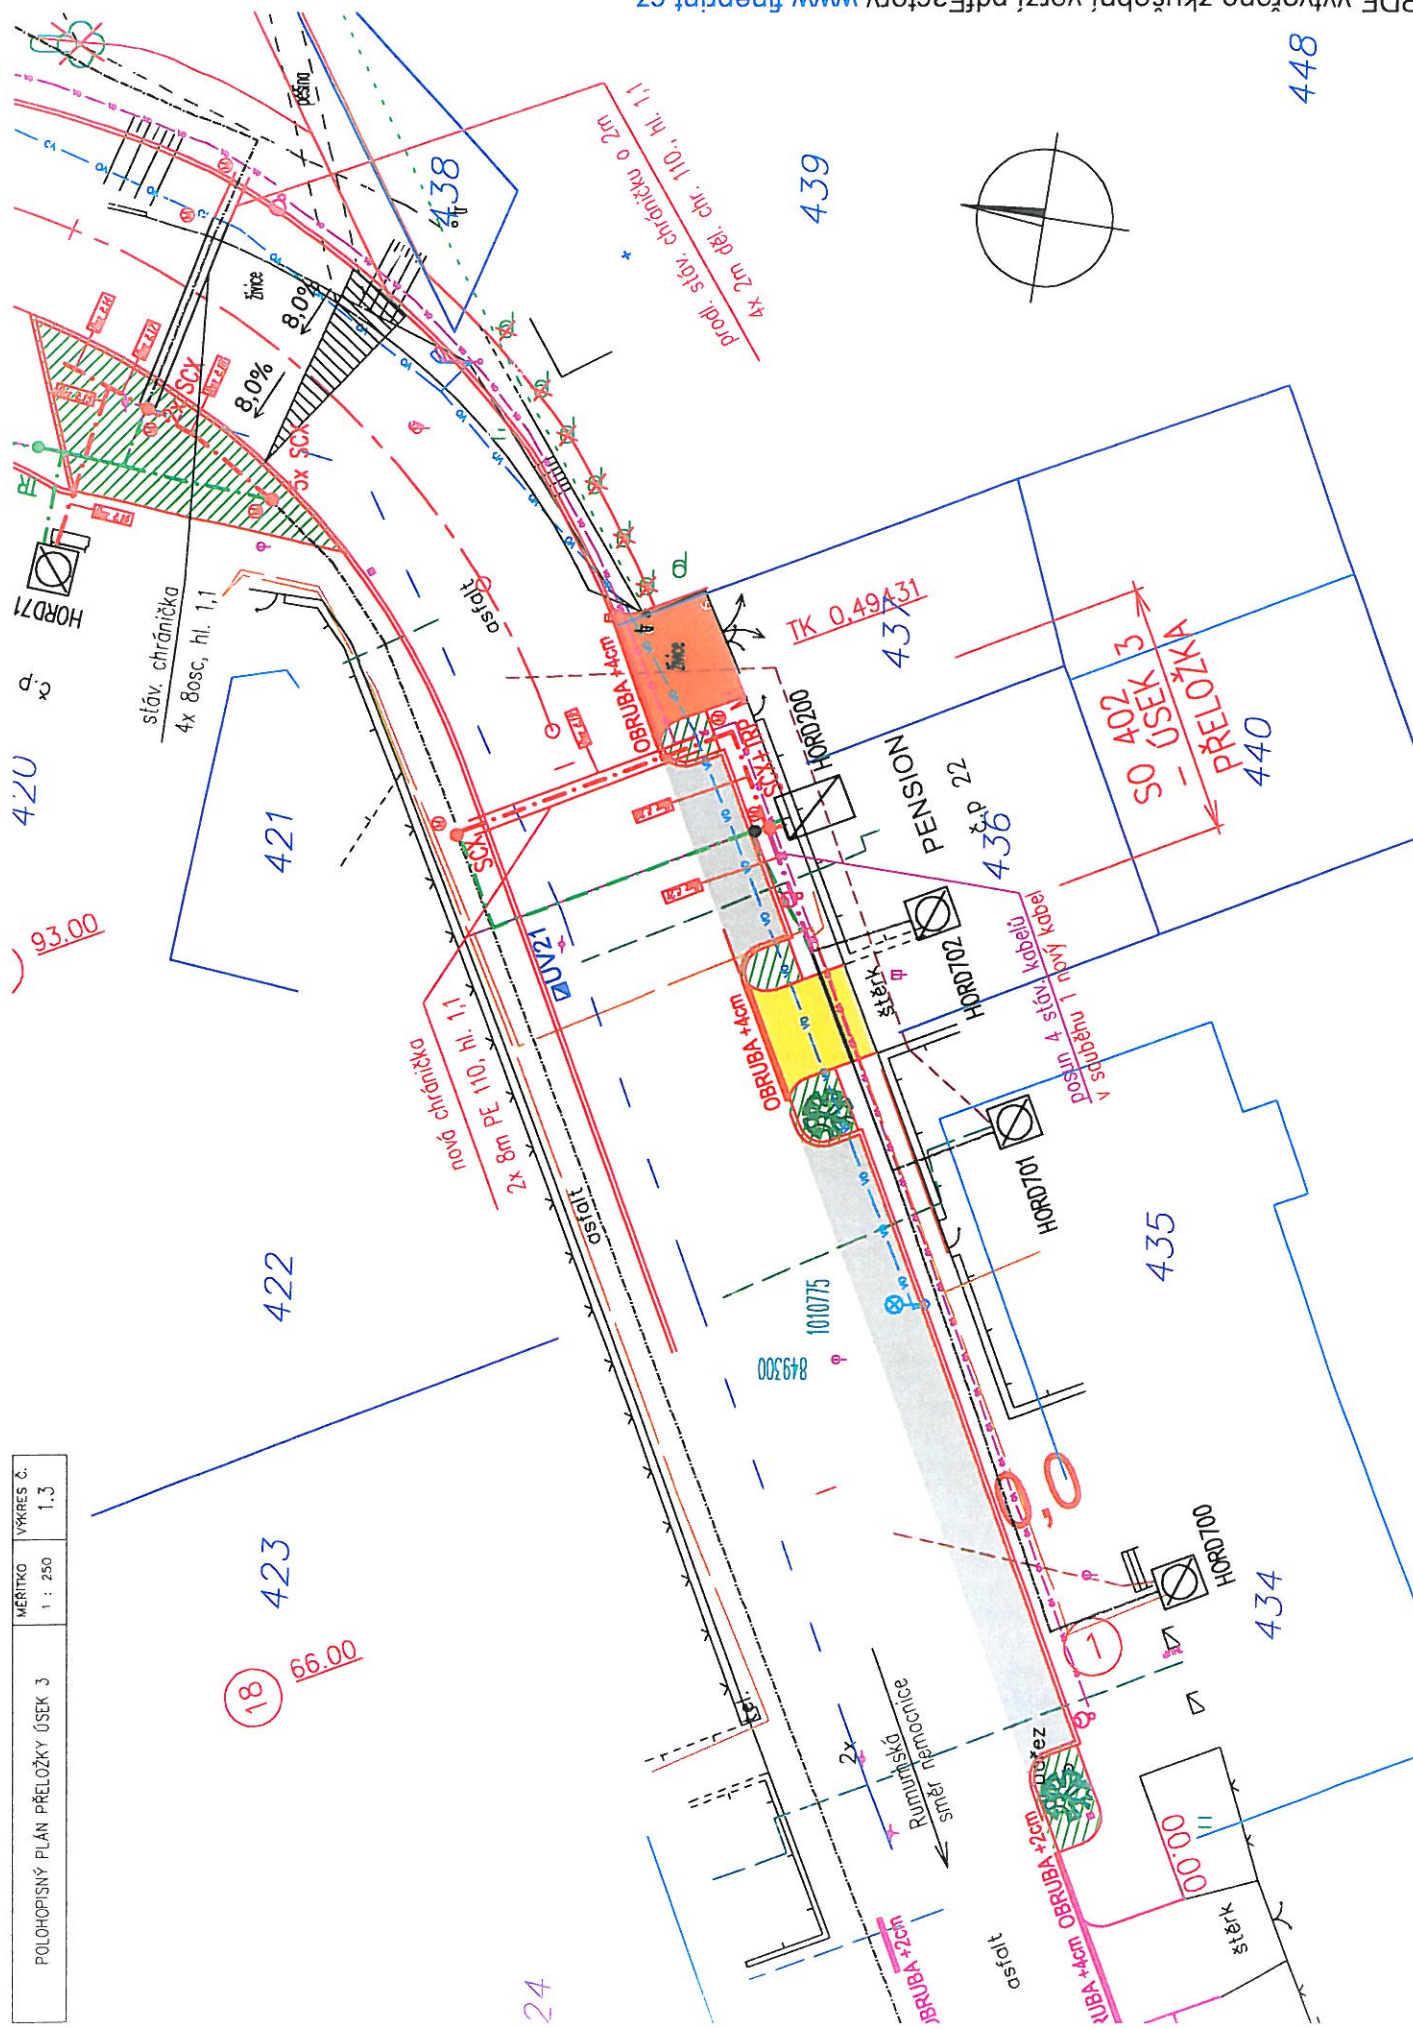

POLOHOPIŠNÝ PLÁN PŘELOŽKY ÚSEK 3	MĚŘÍTKO 1 : 250	VÝKRES Č. 1.3
----------------------------------	--------------------	------------------

420

93.00

421

422

423

18 66.00

24

439

TK 0,49431

43

435

434




SO ÚSEK 3
PŘELOŽKA A
440

435

434

POLOHOPIŠŤ PLAN OSAZENÍ KK U NEMOCNICE	MĚŘÍTKO 1 : 500	VÝKRES Č. 1.4
----------------------------------------	--------------------	------------------

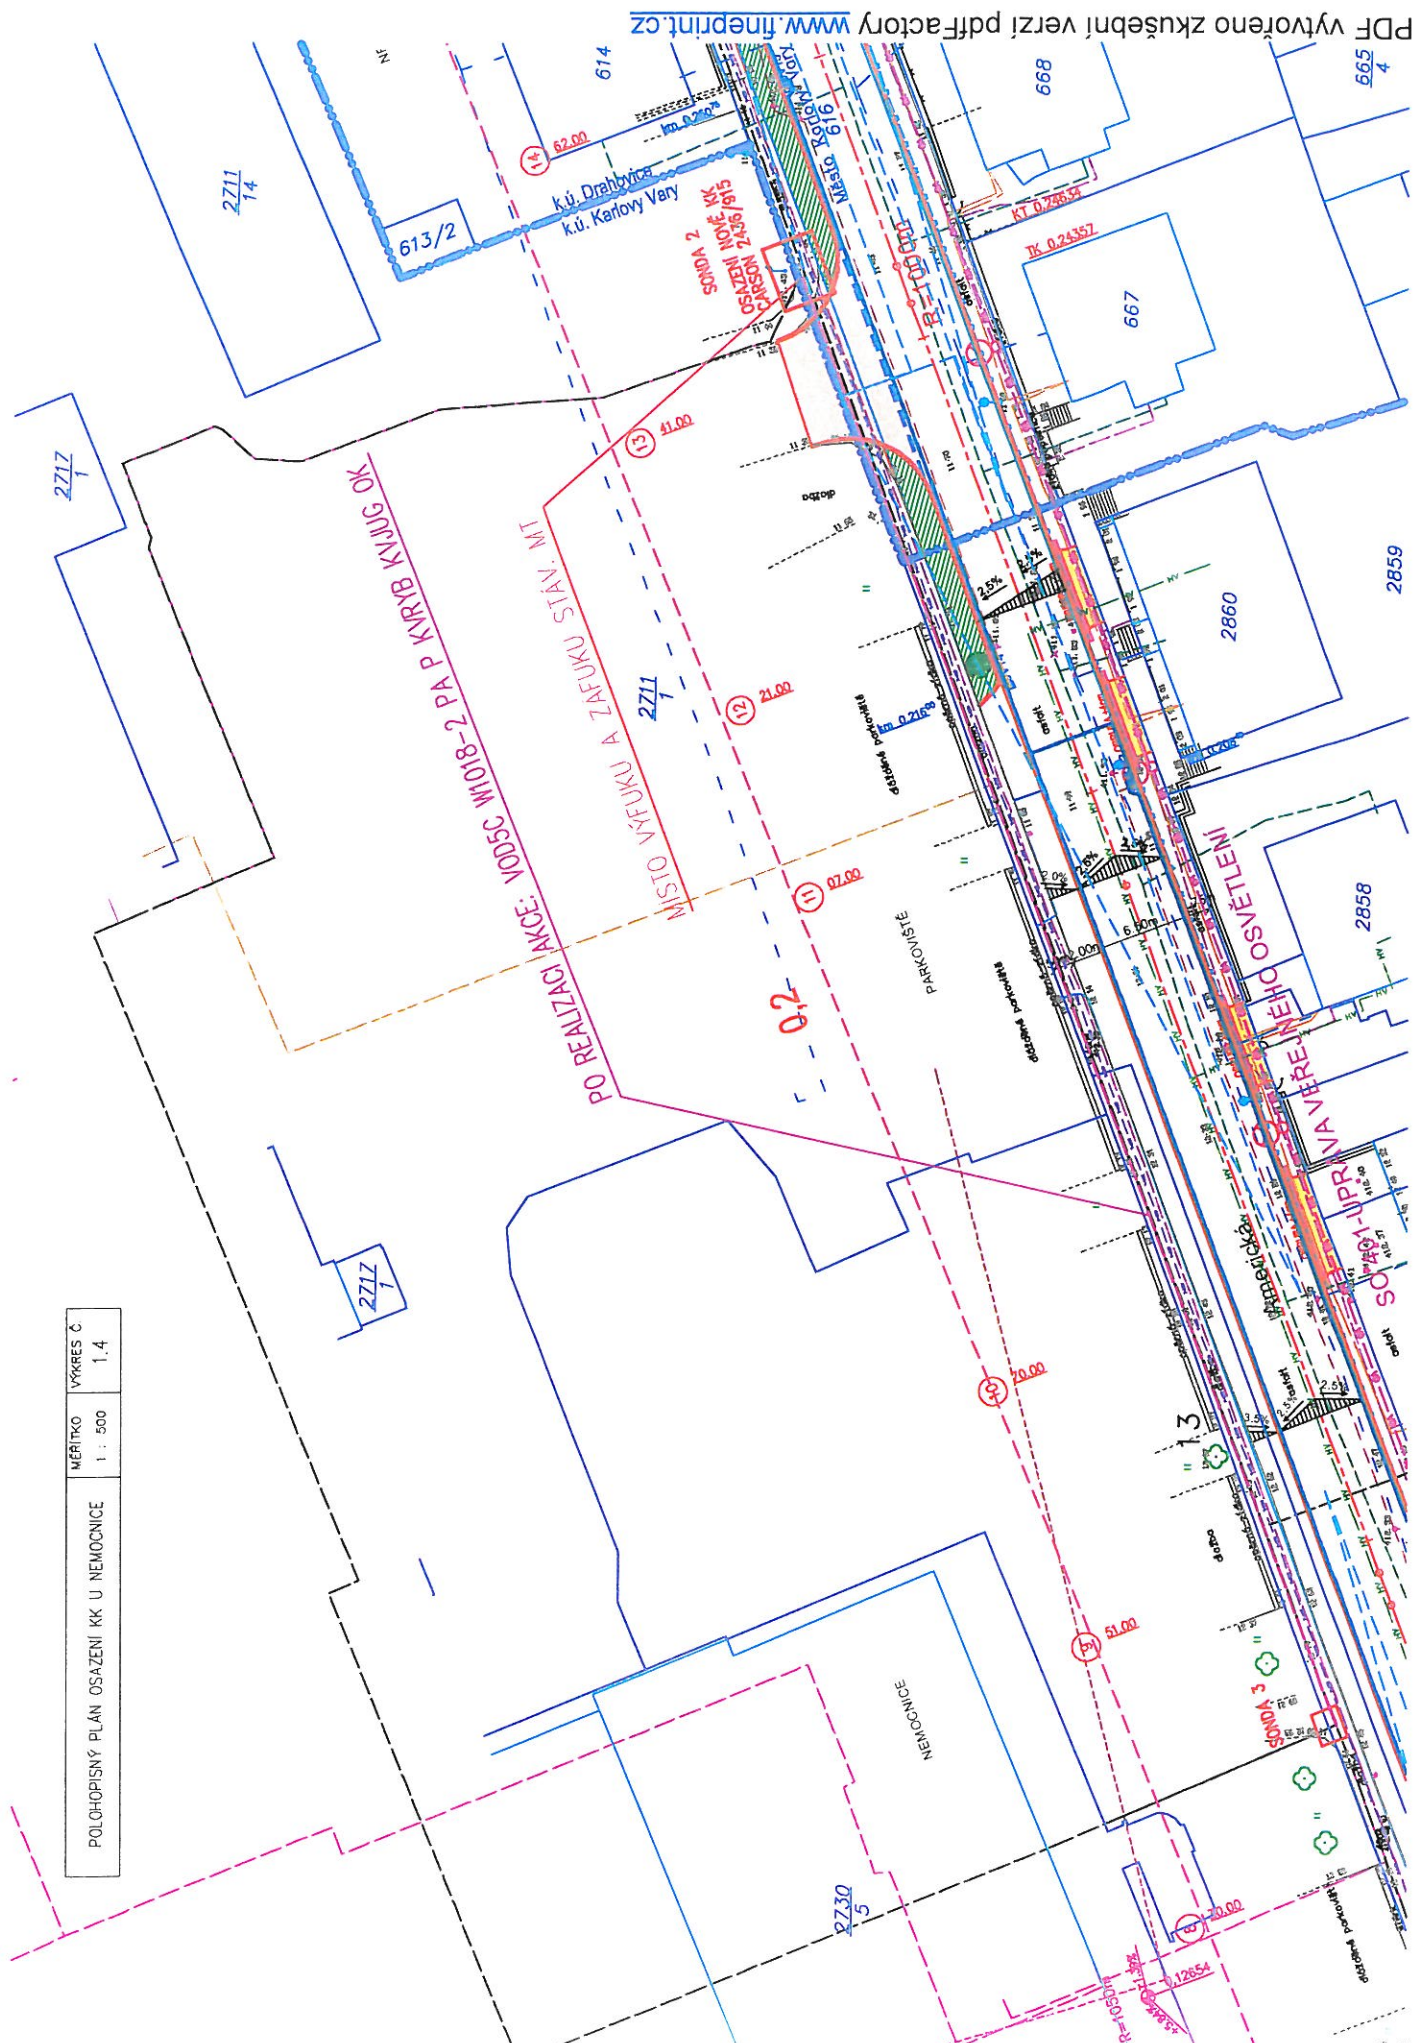

Název stavby: **VPI K.Vary, Rumunská, rek.komunikací - Rozpočet PD sloučený**
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: Ing Jiří Kovařík - K-projekt, Chomutovská 12, 360 10 Karlovy Vary
 KPO: Karlovarsko
 HOST: Karlovy Vary
 VUJ: K. Vary - Drahovice

Technické údaje:

KMVYK:	0.210	KMP:	97.428	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.049	KMMK:	0.805	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	recreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.210	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
--------------------	----------	------------------	----------	-----------	----------

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		
-------------------------	----------	---------------	----------	--	--

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA	10 530,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	134 800,35 Kč
MONTÁŽ	185 392,96 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	23 176,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 341,46 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. TCZ	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	6 843,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	300 816,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč
CELKEM:	664 900,93 Kč
STAVEB. ČINNOST	651 029,47 Kč
NESTAVEB. ČINNOST	13 871,46 Kč

.....
Zhotovil.....
Kontroloval
Vytisknuto: 28-05-2015 08:07:23

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	4.00 ks	8 678,48 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	2.00 ks	7 889,52 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	150.00 m	2 664,00 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	3 944,76 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 341,46 Kč



Evidenční číslo: PŘ/135/2015

POVĚŘENÍ

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623, tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Václava Rozhoně, MBA

os. č. 3241, bytem Lipenská 37, České Budějovice, PSČ 370 01, r.č. 640518/2256,

k tomu, aby za Společnost:

- jednal a činil úkony týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o pronájmu jiných prostor pro komunikační vedení a zařízení v majetku Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

s vystavením souhlasí: Petr Gazda, útvar Access Network

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití cizích podpěr v majetku ELTODO, ČEZ apod., pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit společnost CETIN nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se společnost CETIN zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2016. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 1.6.2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva

Běžné číslo ověřovací knihy O-X- 762 /2015

Ověřuji, že Ing. **PETR SLOVÁČEK**, datum narození 15. května 1959, bytem Řitka, K Potokům 205, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 1.6.2015

Gabriela Štefancová
notářská tajemnice
pověřená notářkou



Běžné číslo ověřovací knihy O-X- 762 /2015

Ověřuji, že pan **MICHAL FRANKL**, datum narození 13. prosince 1963, bytem Praha 9 - Vysočany, Na Břehu 260/1, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Praze dne 1.6.2015

Gabriela Štefancová
notářská tajemnice
pověřená notářkou

